



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Bestoand

1

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 - AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 - AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 - AV Wallonie : Tel.: 081 432 611
- Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <i>De Reys</i> BTW nr: <i>149 289 663</i> of identiteitskaartnr: Stroomleverancier: <i>netmanager</i> Meter nr: stand: Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: <i>P0113826331ges</i> Lid nr: Installatie: Naam: Adres: <i>Rodestraat 27</i> <i>1742 SK Lankeek</i> Datum onderzoek: <i>23/5/07</i> Eigenaar of aangestelde: Tel.: Naam, Voornaam: <i>Eden</i> Adres: Aanvrager:
--	---

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. *6* 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van *230* V, AC, Bescherming aansluiting: *deff* A Type: *40A, 300mA*

Omschrijving aansluiting: *Ondergrond* Kabeltype: *BXUB* Doorsnede: *4 x 1.9* mm²

Voeding hoofdbord: *2* x *10* mm² Aantal borden: *7* Aantal eindstroombanen: *20* *3elen*

Type aardelektrode: *lus* Spreidingsweerstand: *2,7* Ohms Algemeen isolatieniveau: *5* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
geen

nota: Verlichting, toestels nog te plaatsen

De hoofddifferentieel was - (werd) - (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *23/5/2007* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - ~~MAG~~ - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)



INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
.....
.....

De installatie moet vóór *23/5/2007* opnieuw gekeurd worden.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr, Handtekening

AB

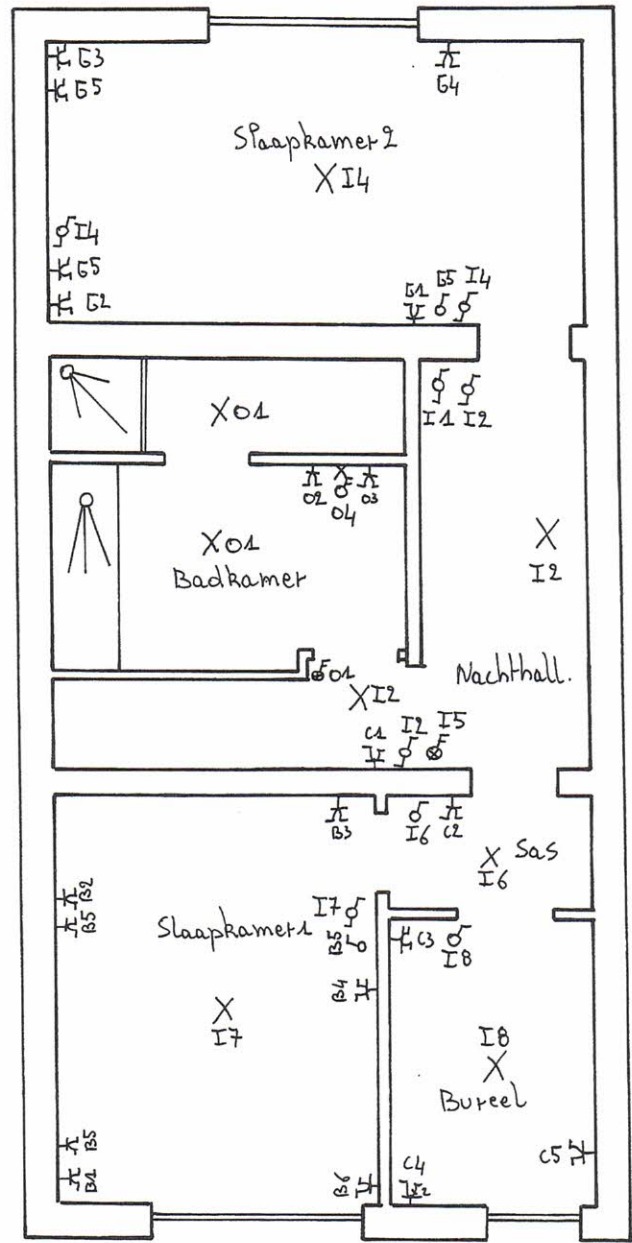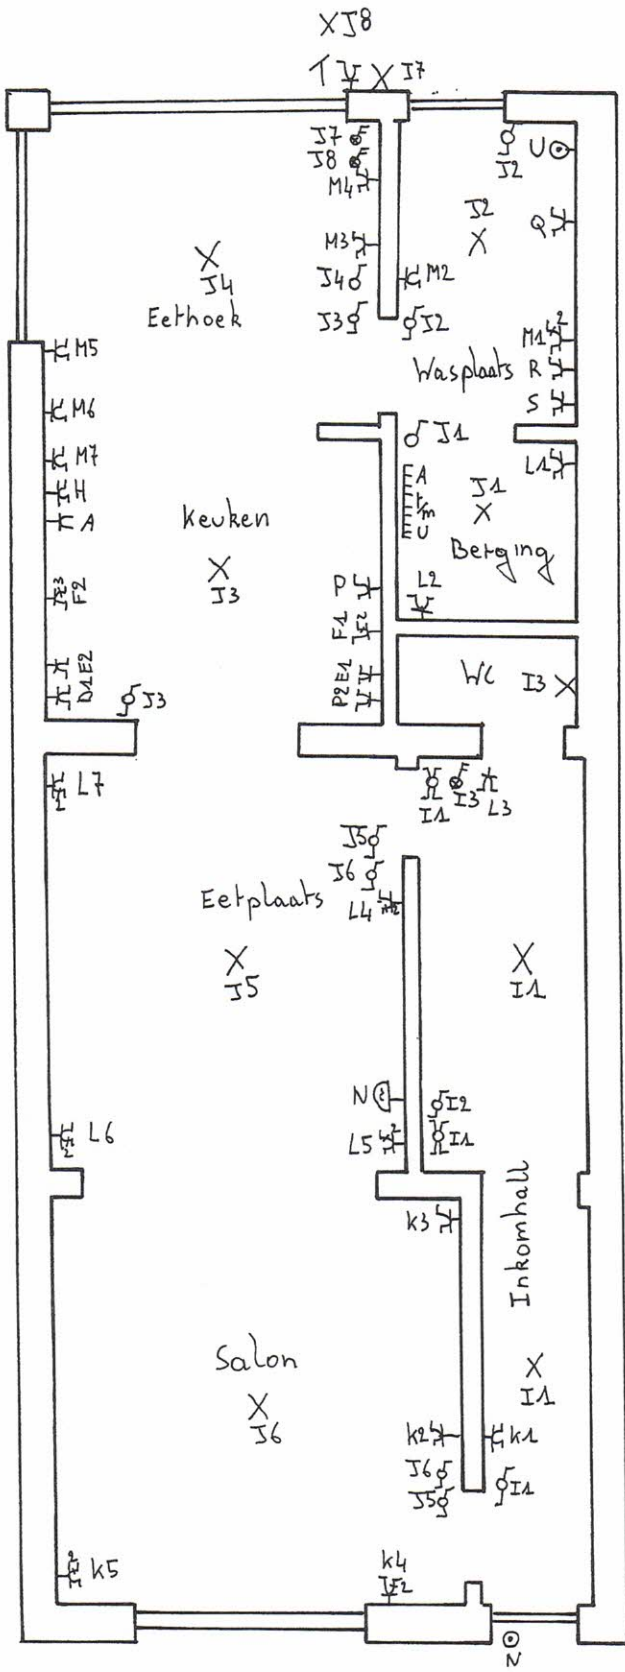

Adres der werken

ARLIM N.V
 Rodestraat 27
 1742 Ternat

Keuringsorganisme

Installateur

DE BEYS FRANK
 Algemene Electriciteitswerken
 Rezedalaan 10 - 1770 LIEDEKERKE
 tel. 053 68 05 22 - BTW 749 289 663

Handwritten signature and stamp.
