

Vereniging Bureau Veritas VZW
Mechelsesteenweg 128, 2018 ANTWERPEN
Tel.: 03/247 95 00 Fax 03/247 94 99
BTW: BE0407.573.313
IBAN: BE52 7215 2076 5709



VERSLAG NR: 61112.432/285
INSTALLATIE ADRES: Brugsestraat 22A
Willebroek 2820
EIGENAAR: J. M. S. S. S.
Adres: Brugsestraat 22A
OPDRACHTGEVER: R. B. A. V. S. T.
Adres: Brugsestraat 22A

DNB:
Meter nr:
Index: Dag: kWh ; **Nacht:** kWh
EAN code:

Proces-verbaal van gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Datum van onderzoek: 28/11/2011 ; **Type v/d lokalen:** ☒ Woning ☐ Appartement ☐
Aard installatie: ☒ nieuw ☐ uitbreiding ☐ tijdelijke ☐ werfkast ☐
Fundering gebouw vóór - na 1.10.1981
Elektrische installatie vóór - na 1.10.1981 ; **Met** - Zonder BA4/BA5 ; **AREI artikel/** ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐
Aansluiting: Spanning: 230 V ; **Bescherming v/d aansluiting:** 40 A ; **Type en In alg. schakelaar:** A2540 A
Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 6x0.75mm² ; **Aardverbindingssysteem:** TT -
Type aardelektrode: ☒ lus ☐ pen ☐ ; **Aardspreidingsweerstand:** 3 Ohm
Aantal borden: 1 ; **Aantal stroombanen:** 15 ; **Algemeen isolatieniveau:** 100 MOhm

Beschrijving: ☒ Zie schema's in bijlage.

Nom. waarde & gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: 40 A 300 mA ; **Natte ruimten:** 40 A 300 mA

Resultaat van de controle:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI artikel: ☒ 270 ☐
en de technische procedure T05-1. Volgende controles werden uitgevoerd:

OK NOK

- ☒ ☐ de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
☒ ☐ de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand.

Inbreuken: zie keerzijde voor verduidelijking.

Opmerkingen: zie keerzijde voor verduidelijking.

Raadgevingen voor de eigenaars, beheerders of uitbaters: Zie keerzijde.

Besluit.

De elektrische installatie voldoet -niet- aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting -werd-verzegeld.
De ééndraad- en situatieschema's werden voor gezien ondertekend.

☐ Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd vóór

☒ De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk 28/11/2016, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (art.271).

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Visum van DNB:

Datum:

DE AGENT-ONDERZOEKER

Naam + handtekening


VERENIGING
BUREAU VERITAS
ASSOCIATION
a.s.b.l.
ANTWERPEN - ANVERS



S. TACK
Vereniging Bureau Veritas VZW/ASBL

[illegible]

Plots: Bruggstrasse Plot 2, 9260, Wädlen.
M. 30 A.

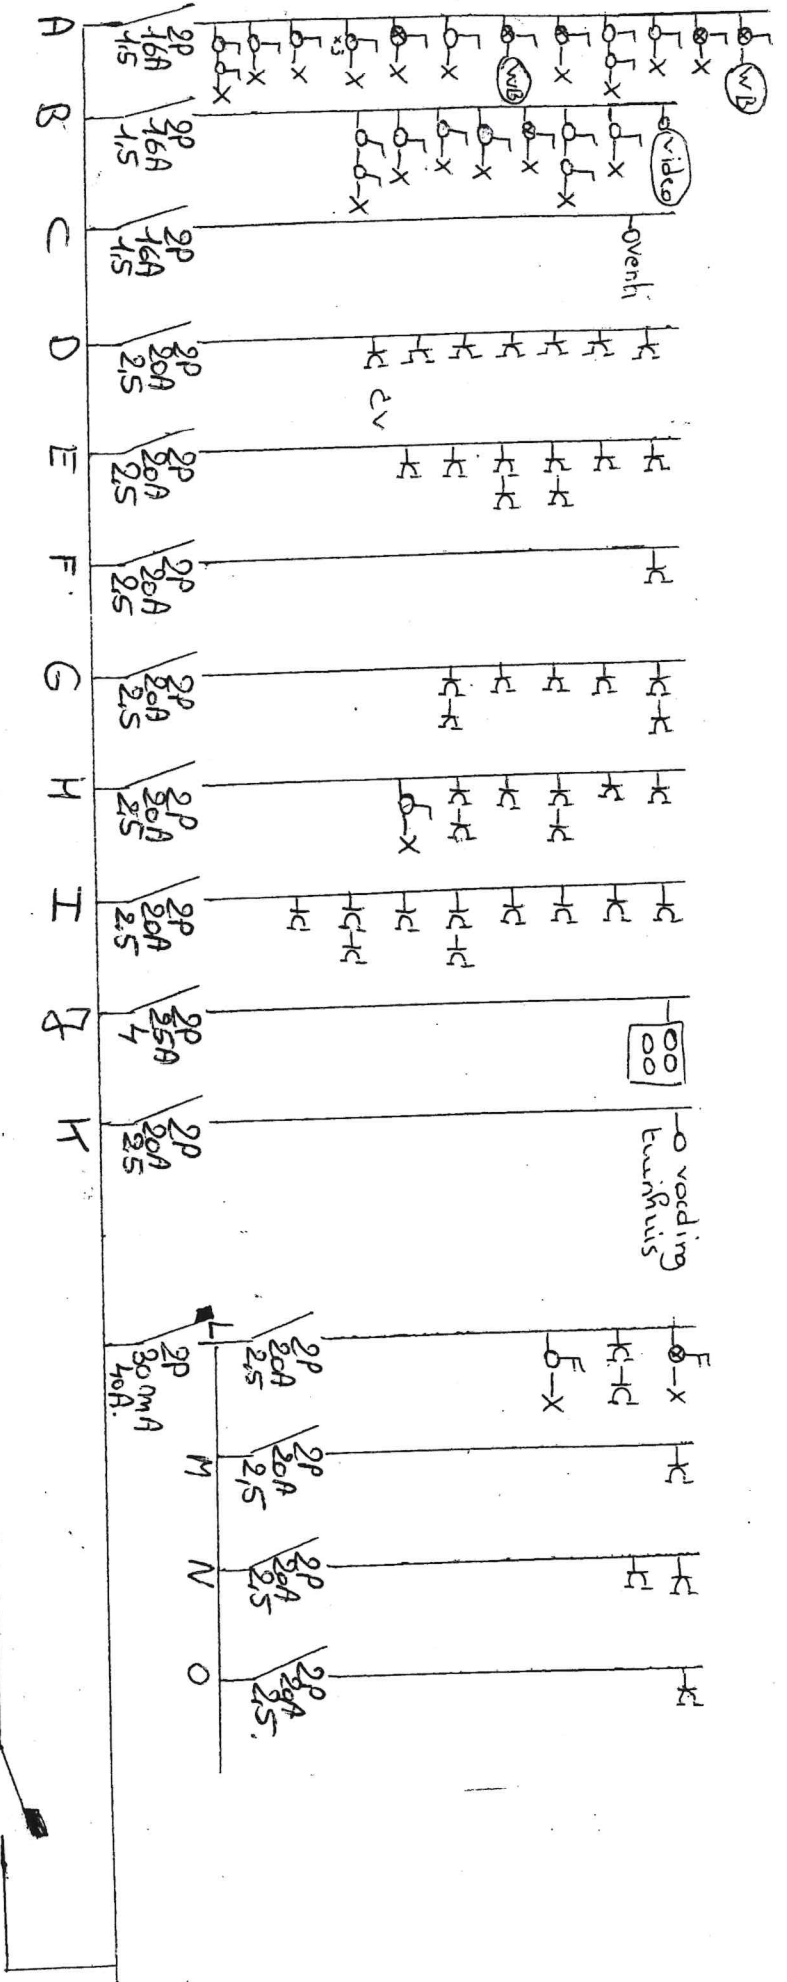

A: Verflechtung

binnen & buiten

L'ivers. en atoph. badde.

Tell me more about

290300mHof

13. new. boven, knap & videsjoon

2. Neutrophilic

IV: Drogen- & Rechtswissenschaft
0: Notizen

1. Stopk. kamens 283 & CV

E: stoph. poort, k1, zelden en nachthal

F: Micnogolf


G: stoph. genoot, hal, wasp, stoph. aan zch. hart

H. Steph. Reichen, vers. weinblod + domphrop.

II: Stroph. Paving + Lennas

y: krochpfaat

1: Nothing twinRius



o 7/11/2011

BVBA VOET ELECTRO
12 EGEMSTRAAT 10
9800 DEINZE
09.380.31.39
