

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 26/03/2019

Inspecteur: Koen De Lausnay

Mentor: -

Installateur: -

ID-label:

B.T.W. nr.:-

IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Serie Nr.: 1779012

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Pater Vergauwenstraat
Huisnummer 5
Postcode 9130
Gemeente Verrebroek
Type woning

Eigenaar:

Naam Atiq Baghban
Straatnaam Pater Vergauwenstraat
Huisnummer 5
Postcode 9130
Gemeente Verrebroek

EAN : -

Teller Nr.: : Nieuwe te plaatsen

Aard onderzoek:

Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI artikels 274, 278 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 12

Isolatie: 2,22 M Ω

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders: woning van voor 1981 RE: 28,6 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	-	22.5kA2s (3000A)	A	12	Ok	Ok
30	40	-	22.5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Directe aanraking	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Indirecte aanraking	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Aansluitingen	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Correcte schema's	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	<input type="checkbox"/>
Equipotentiale verbindingen	<input type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	<input checked="" type="radio"/> niet van toepassing <input type="radio"/> in afwachting			
Continuïteit	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Verlichting / toestellen	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK <input type="radio"/> NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota: equipotentiale aan cv-ketel in afwachting.

BESLUIT


- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 26/3/2044
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 6

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen De Lausnay



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 / 880.88.90


BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 26/3/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



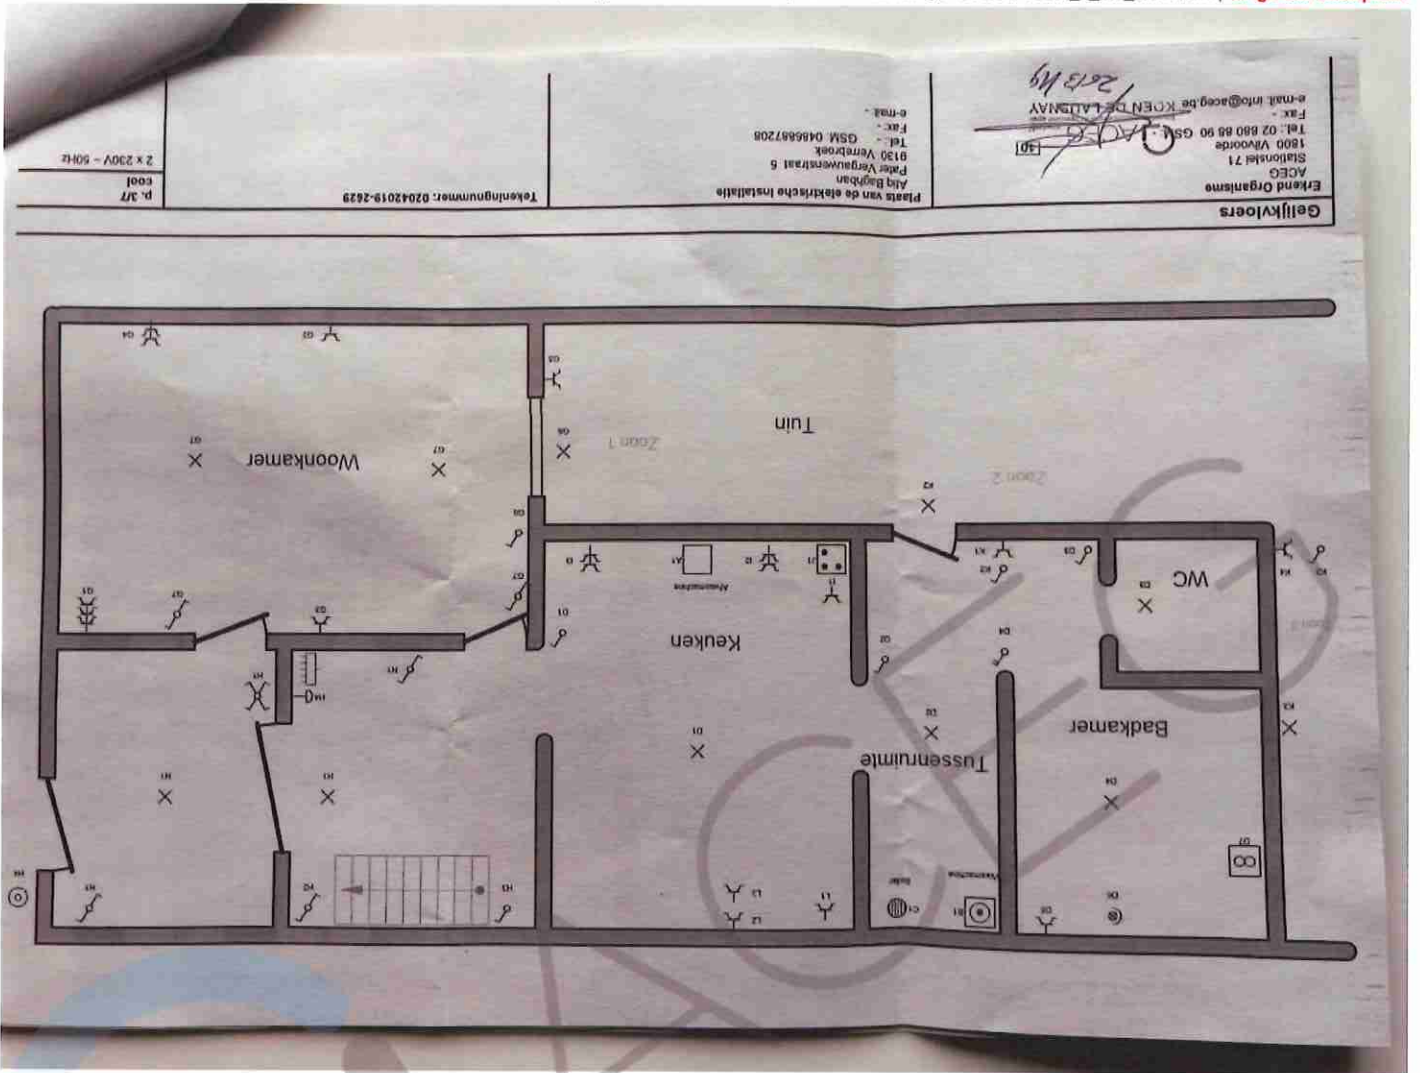

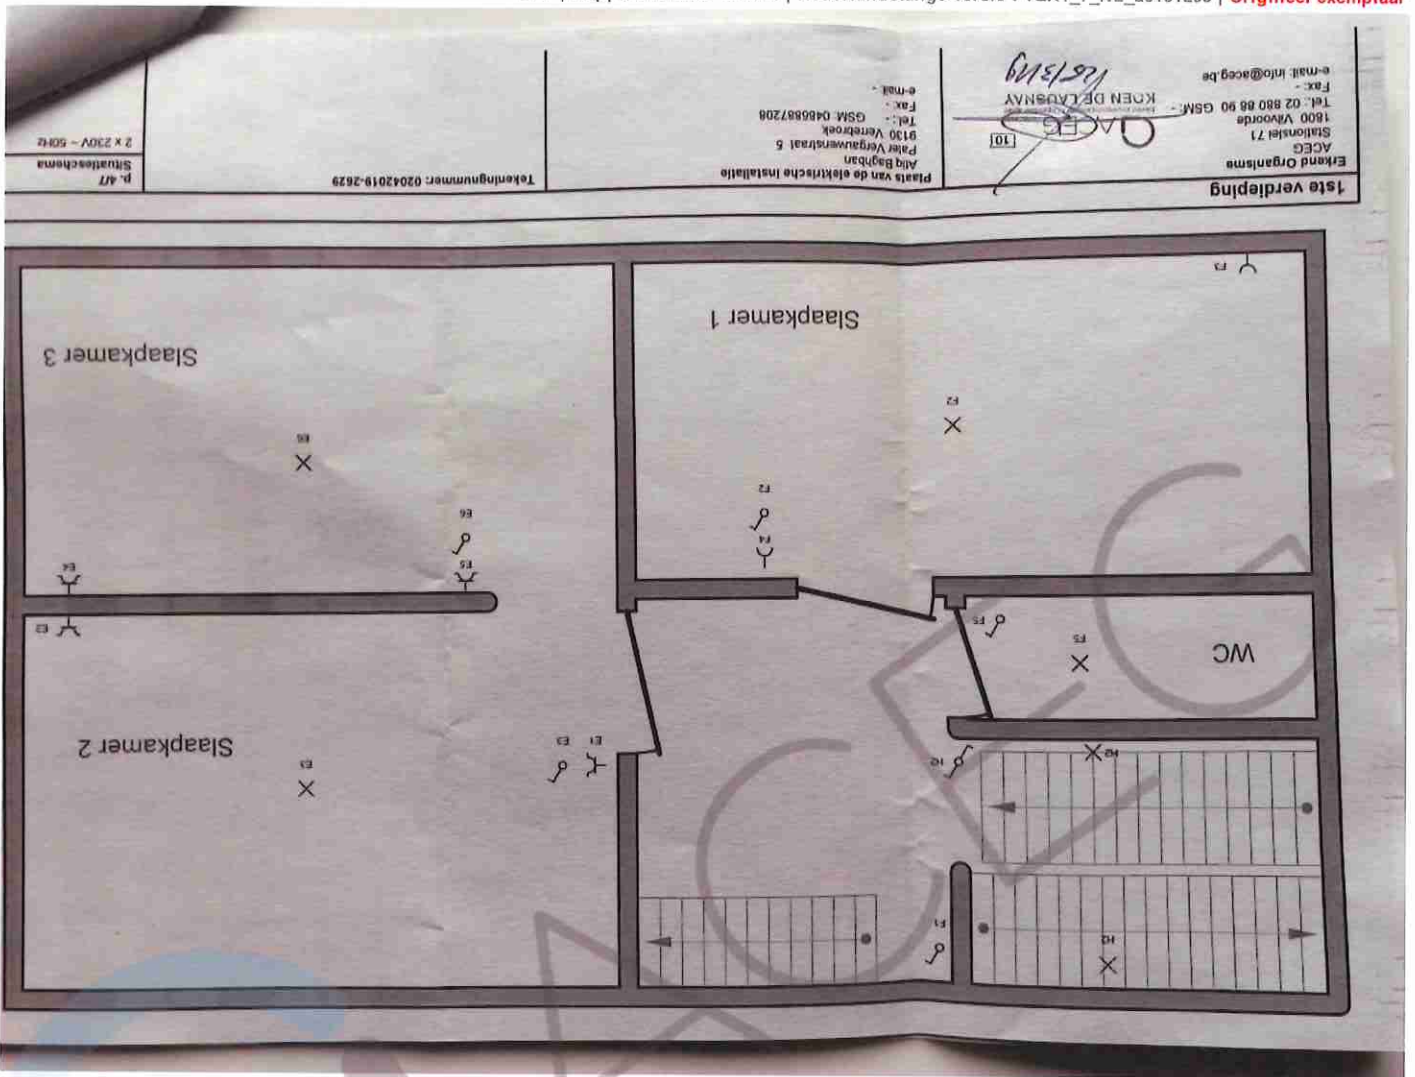



1ste verdieping
Erkend Organisme
ACEG
Stationsplein 71
1800 Wavoorde
Tel.: 02 880 88 90 GSM:
Fax: info@aceg.be
e-mail: info@aceg.be


Plaats van de elektrische installatie
Adig Baghban
Pater Veraghterstraat 5
9130 Verrebroek
Tel.: GSM: 046887208
Fax: GSM: 046887208
e-mail: info@aceg.be

Tekeningnummer: 02042019-2629

p. 4/7
Stuatschema
2 x 230V - 50Hz

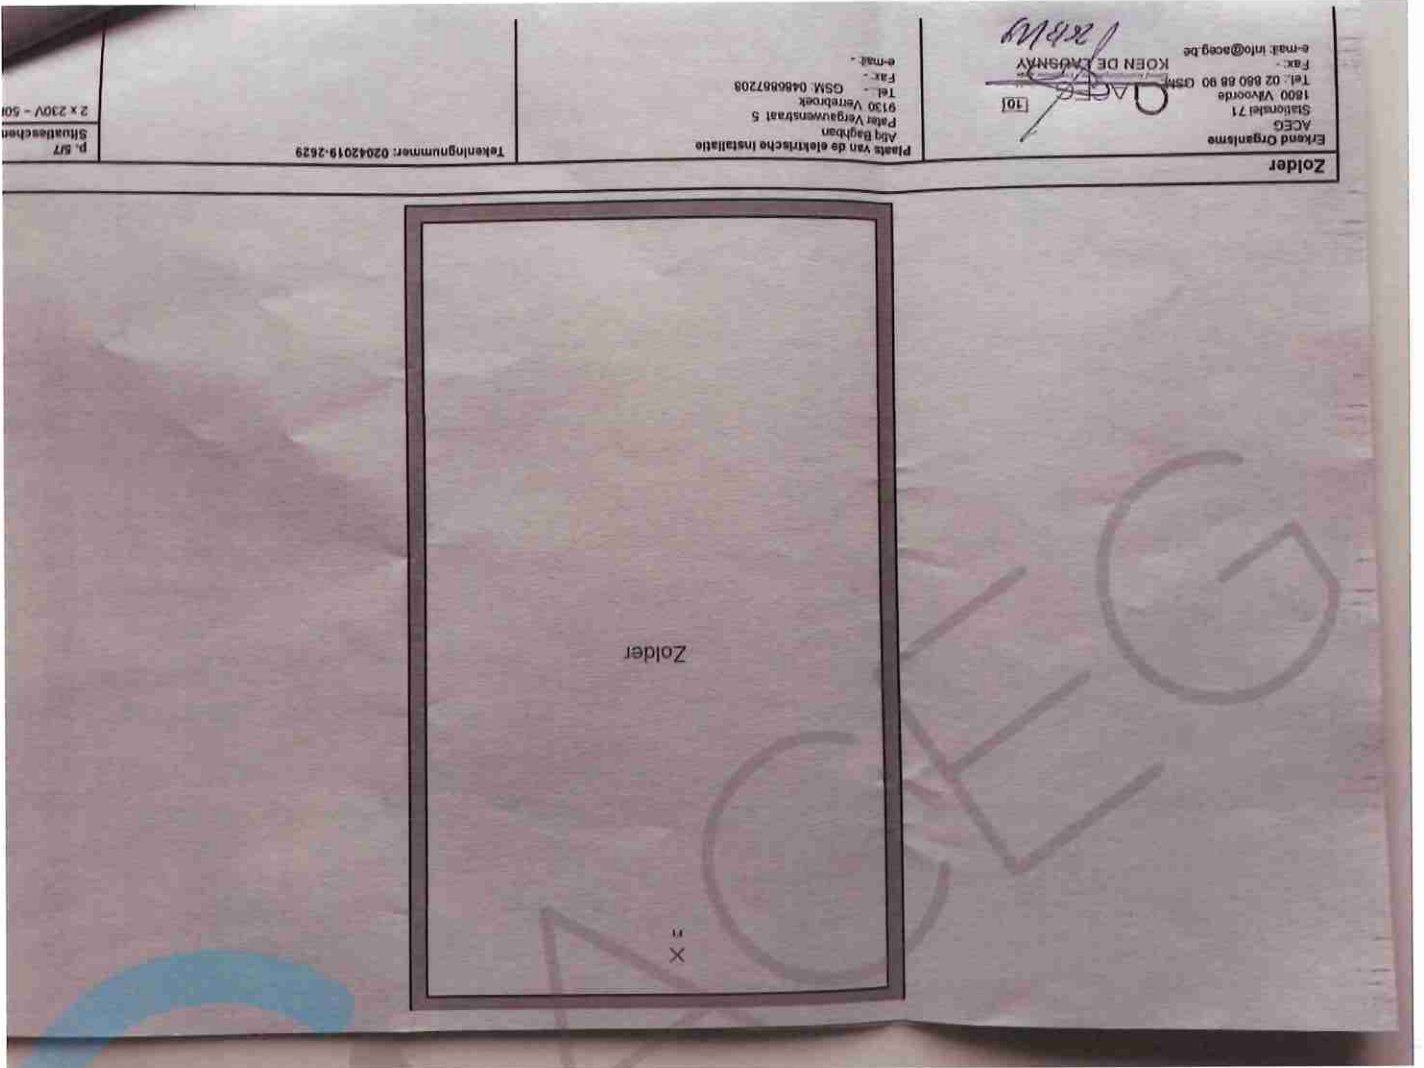

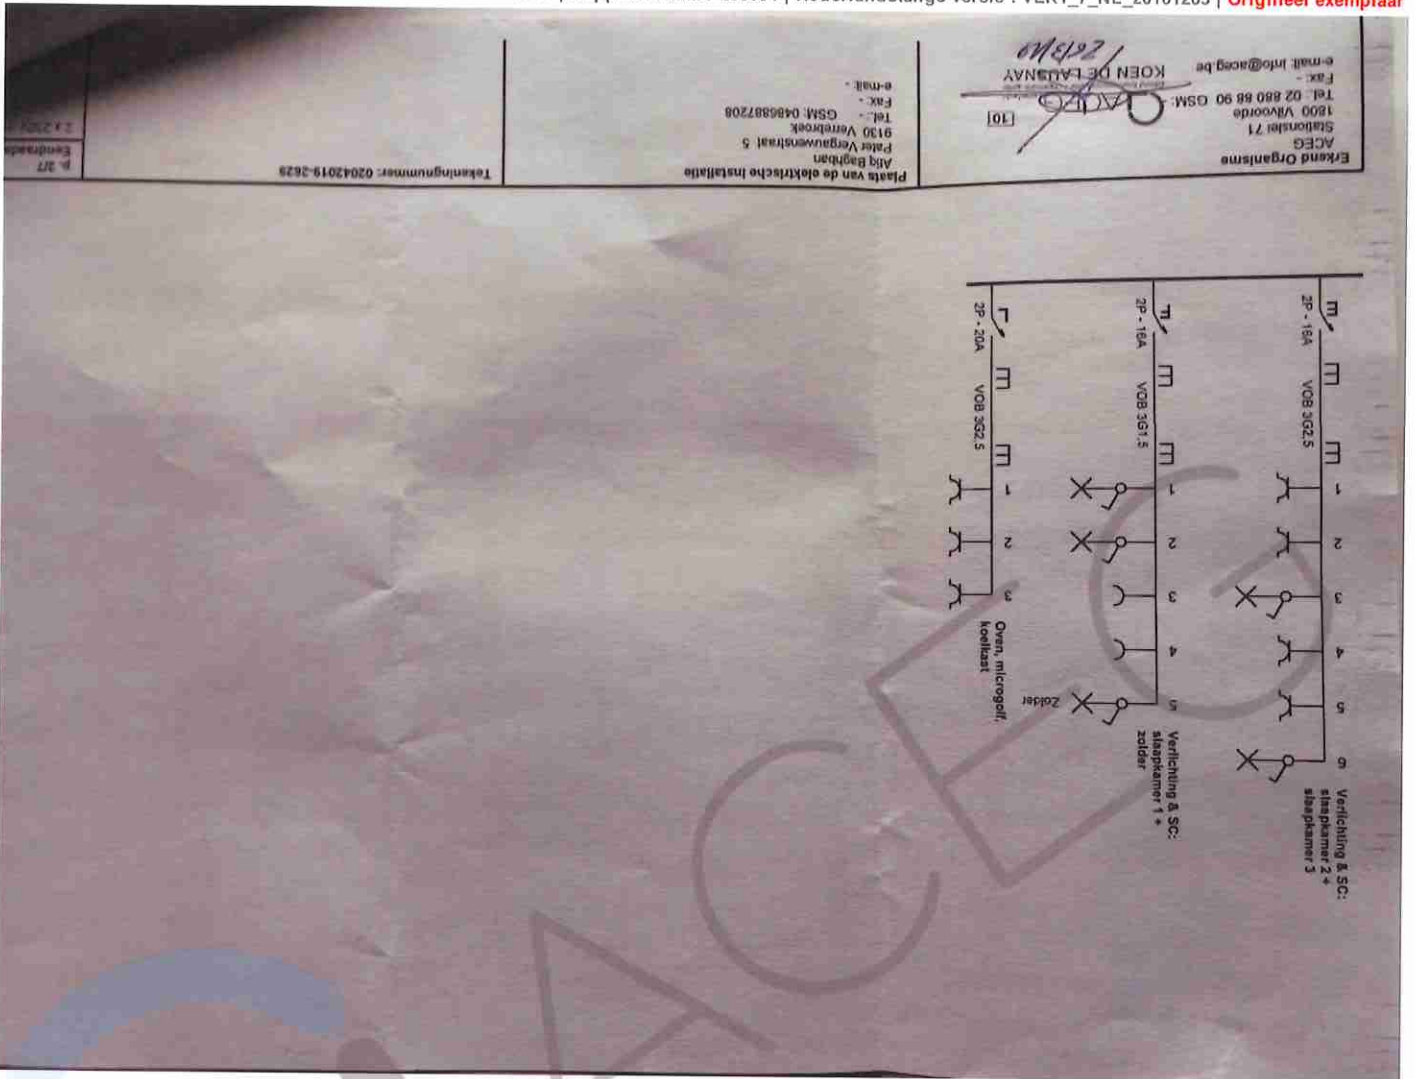

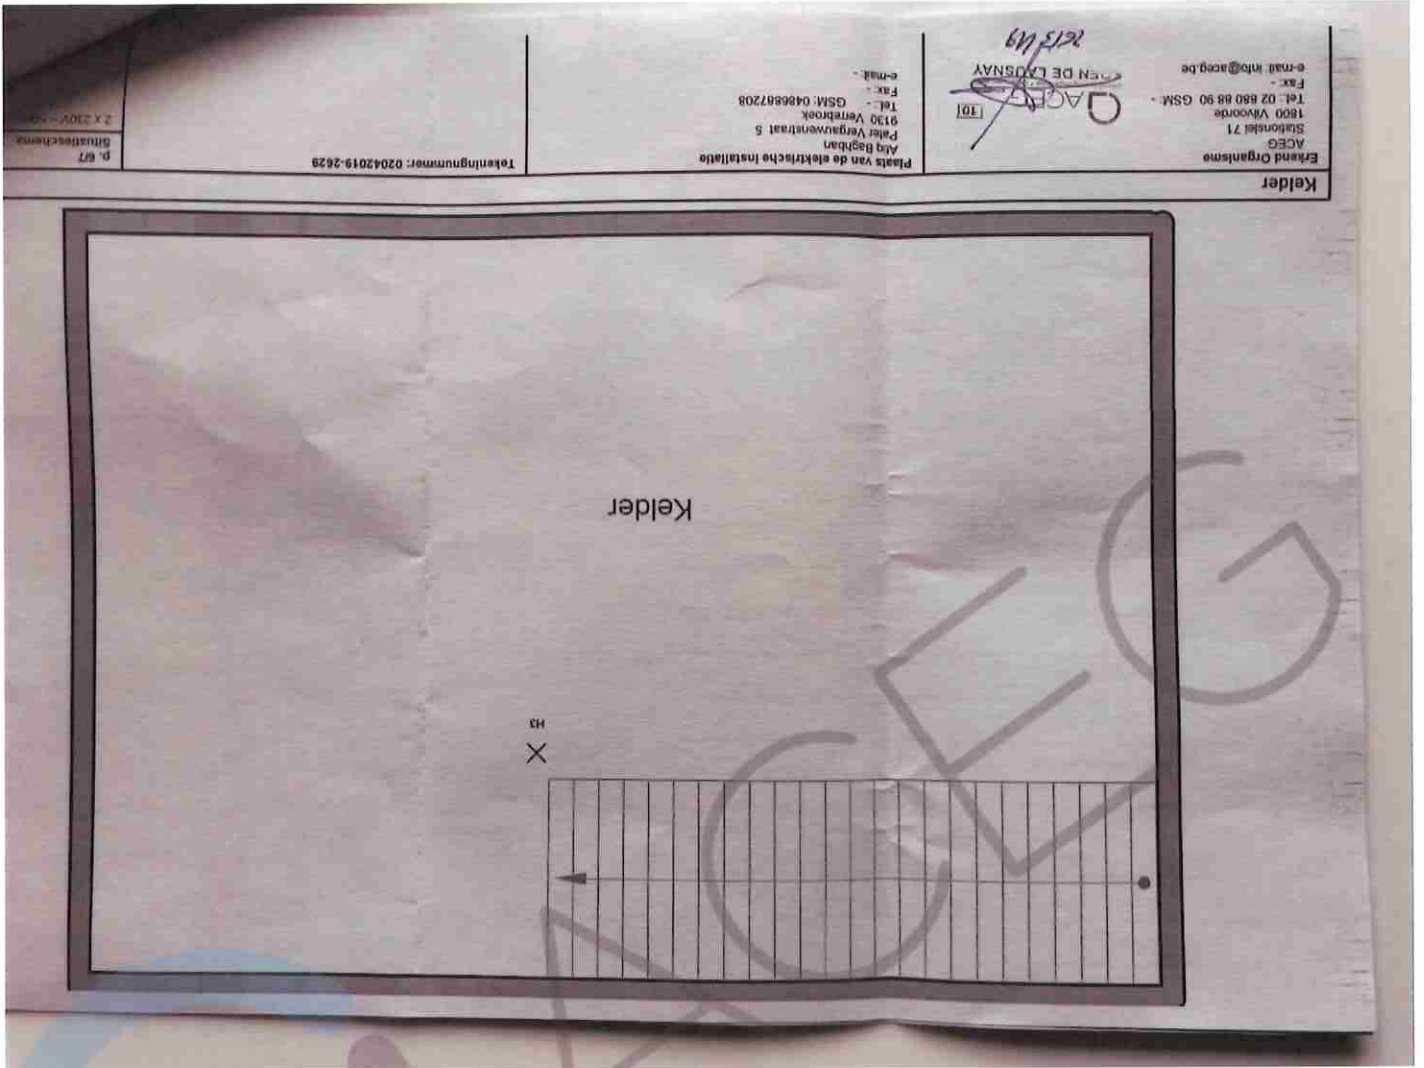



Het systeem is draaiend.

Aanvraag

KLIM id

b2bbc99f-bbba-4944-a3d0-bc278415b72c

Uw referentie

KM/2230052

Lokalisatie [gemeente, straten, huisnummers]

Pater Vergauwenstraat 5, 9130 Beveren, België

Type melding

Opvragen van erfdienstbaarheden

Aanvrager

Onderneming**Contactpersoon**

De Vil Charlotte

E-mailadres

notariskantoor@notaris-devil.be

Type gebruiker

notaris

Straat

Helmstraat

Huisnummer

107

Gemeente

Borgerhout

Postcode

2140

Land

Belgium

Telefoon

03/270.02.90

Fax

03/235.09.39

Data aanvraag

Type melding

Opvragen van erfdienstbaarheden

Type werk**Uitvoeringsmethode****Uw referentie**

KM/2230052

Omschrijving werken [of percelen – Notaris]**Datum aanvraag**

13-01-2023 - 10:18

Startdatum werken [of ontvangst info – Notaris]
