

Resp. client:  
N° commande.  
N° client: 6514  
Pers.cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: collignonelectricite@skynet.be



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: LS18  
N° rapport : 6516980  
N° rapp. prov.:  
Date: 04/07/2025

Client / Mandant :

COLLIGNON ROBERT  
RUE DE LA CHASSE 34  
6900 AYE

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 53 TRIBOLET JEAN-PAUL  
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: LAMBORAY LESUISSE Adresse: RUE DE LA CARRIERE 40 6900 WAHA  
Installat. / respons. travaux: Nom: COLLIGNON ROBERT Adresse: RUE DE LA CHASSE 34 6900 AYE T.V.A.:  
Adresse installation: LAMBORAY LESUISSE RUE DE LA CARRIERE 40 WAHA 6900 Cabine HT - privée: Kies een item.  
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:  
EAN nr.: / Gestionn. Rés.: ORES Compteur: / Compteur nuit :

**CONTROLE**

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.

Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4)

Kies een item.

Date installation:  < 01/10/1981  ≥ 01/10/1981 et < 01/06/2020  ≥ 01/06/2020 et < 01/06/2023  ≥ 01/06/2023  ≥ 01/03/2025

Dérogations: partie 8: Kies een item et sous-sect. 6.5.8.1, points: Kies een item. (1: extra Diff.; 2: prises de cour.; 3: douche/bain)

Date: 04/07/2025 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/07/2050

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

Présence tension: présente Raccordement: réseau souterrain Fourreau: placé Plaque d'isolat.: absente  
Tension nominal: 3N400V Protection max.: 63A Protection princip.: 32A Interr. princip.: aut. GRD  
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 35 mm<sup>2</sup>  
Câble de raccordement au réseau: type câble: / nombre conduct.: / section: / mm<sup>2</sup>  
Prise de terre genre: individuelle accessibilité: en ordre  
Électrode de terre: type: boucle section: 35 mm<sup>2</sup>  
Interrupteur Diff.: général: 4P63A300MA S supplémentaire: 4P63A30MA+4P63A300MA+5X4P40A30MA  
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe références:  
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre État du matériel fixe ou - à pose fixe: en ordre  
Installations spéciaux:  photovoltaïque  piscine  sauna  aliment. véhic. électrique  -  
Ne sont pas encore  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  
placés:  luminaires  principale -  supplémentaire liaison équipotentielle  
Nombre de tableaux: 3 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 38

**RESULTATS**

Résist. d'isolem. général: 10 MOhm Résistance de dispersion: 18 Ohm  
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre  
Protection contre la surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

1/2

---

N	Néant
---	-------

I	Néant
---	-------

---

**CONCLUSION**

■ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.  
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.  
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,




Le

contrôleur

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)

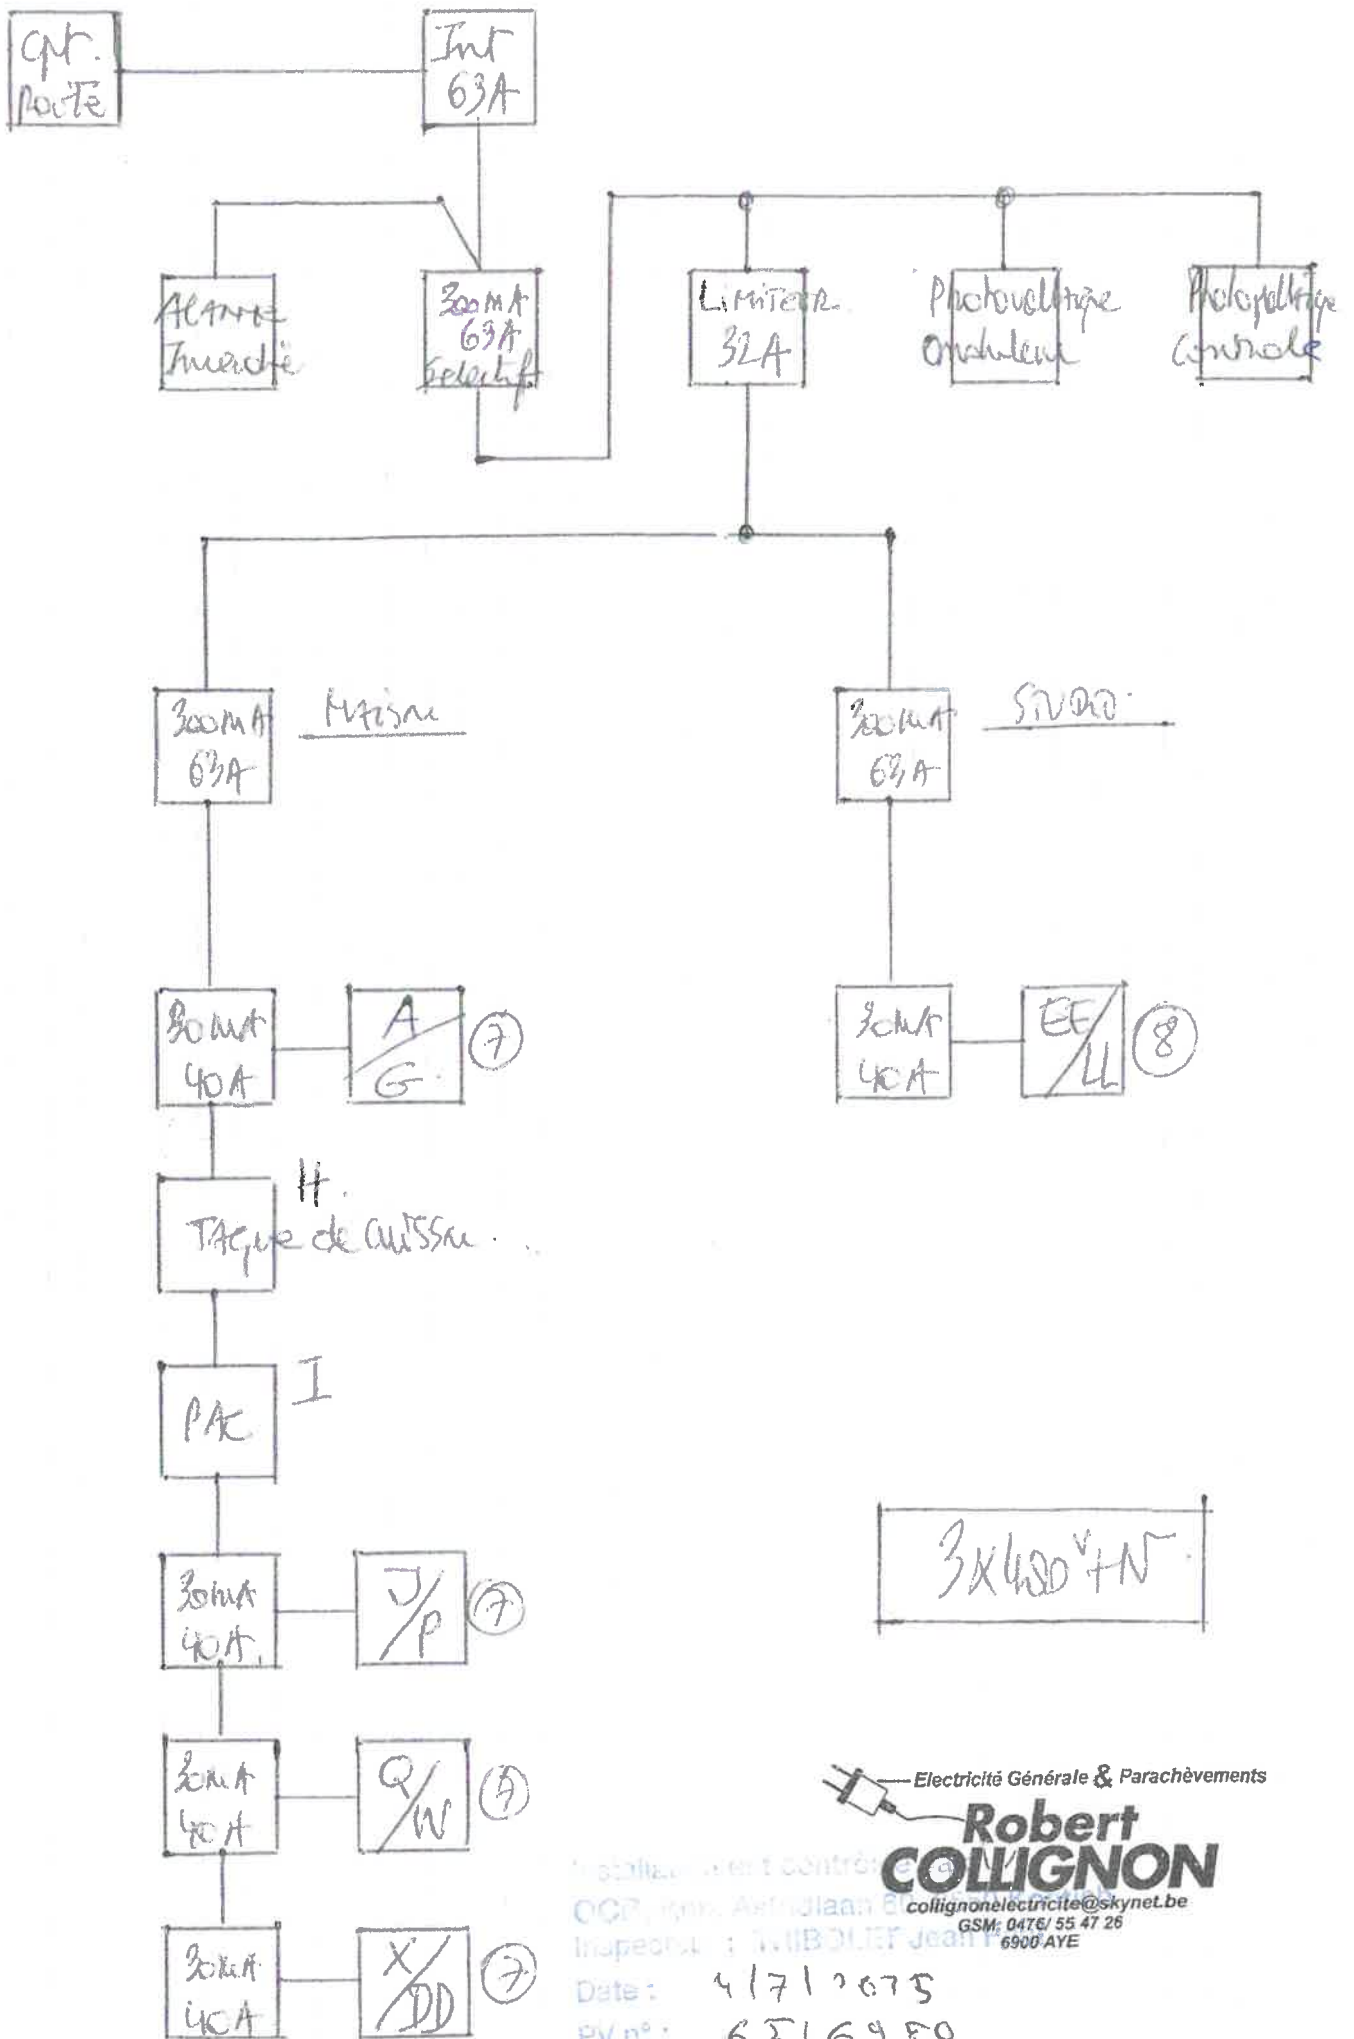

Electricité Générale & Parachèvements

**Robert COLLIGNON**

Installation, Révision & Contrôle  
 OCP, Kmo, Afdeling 8  
 collignon@skynet.be  
 GSM: 0476/55 47 26  
 Inspecteur: WILBERT Jean 6900 AYE

Date: 4/7/2015  
 PV n°: 6516980  
 Signature:
