



Brabant : Oorlogskruiselaan 126 bus 12 - 1120 Brussel.  
Hainaut : Parc Initialis, Avenue Descartes 2 - 7000 Mons.  
Limburg :  
Liège : Rue Grand-Vinàve 61 - 4101 Jemeppe.

Tel. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78  
Tel. 065/32.15.51 - Fax. 065/32.15.77  
Tel. 011/50.44.20 - Fax. 011/50.44.19  
Tel. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80  
B.T.W. BE 406.671.312

Erkend Controle-Organisme

Bankrekening : 340-0298168-28

VERTROUWELIJK

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag nr : 06.1003.0709111  
Datum van onderzoek : 08/07/2003  
Eigenaar : Dhr/Mevr. M.V. HANON  
Adres : Oudezon

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk :  
Naam - Voornaam : EYA  
BTW/L.K.nr : 453.535.876  
Adres installatie : VERKULSTRAAT 92A  
SINT-LAURENCE WOLLEV  
APP 15 overleg 3

Soort controle :

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.
- B) Controletoets van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor verzwaring van het aangesloten verbruik op het openbaar distributienet - IEB van 01.07.1992.

Soort installatie :

(Wooneenheid) (Huishoudelijke werktenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Werk aansluiting) App 13 Art 30 of 27  
Voedingsspanning - TN 400 V/230 V/3 x 400 V/3 N 400 V. Beveiliging aansluiting 27A  
Voedingskabel hoofdbord = 4c. X. 16 mm<sup>2</sup>. Aantal borden = 1. Aantal eindstroombanen = 13  
Algemene lastschakelaar Df 100 A.

Metingen

Ri = ... S ... Megohm Ra = ... Ohm (pijpen/lus). Aardingscontinuïteit =  in orde  niet in orde

Differentiëlen :

I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>d</sub> (A)	Beveiligde kringen	I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>d</sub> (A)	Beveiligde kringen	I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>d</sub> (A)	Beveiligde kringen
3	0,3	0,3	100	3	0,3	0,3	F-M				

Beschrijving :

Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties
A, B	D, B, C, D, S, M, W	10	M	D, B, A, C, P, M, A	4						
C - F	D, B, C, D, S, M, W	10	F - M	D, B, A, C, P, M, A	4						
G	D, B, A, C, P, M, A	4									

INBREUKEN : (zie codes op keerzijde)

geen

OPMERKINGEN : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.

Hoofdepotentiële verbindingen : niet geïnstalleerd - niet verbonden

Supplementaire equipotentiële verbindingen : niet zichtbaar - bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - niet geïnstalleerd - niet verbonden.

De hoofddifferentieel werd verzegeld Het 1-draads- en situatieplan werd voor gezien ondertekend.

BESLUIT A) : De installatie is conform met de wettelijke voorschriften.

BESLUIT B) : De installatie is conform met de wettelijke voorschriften.

De installatie van vóór 01/10/81 is conform met de wettelijke voorschriften.

De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.

VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VOÓR 08.07.2003

Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een kopie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verstuurd worden.

Inspecteur (naam + handtekening)

Klant (naam + handtekening)


B.I.C. VLAANDEREN

Wim De Laer  
Elek. Yverghem  
Tel. : 0477/51.70.83

W - DF CABT

J. m. a. f. s.



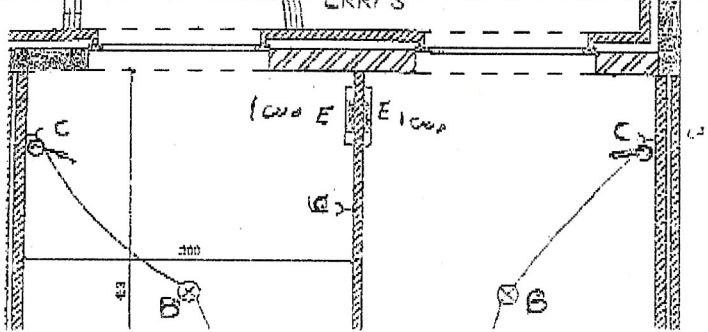

APPARTEMENT F5

Verdiept: 23

Dhr. en Mevr. ~~Gladde Hevens~~

Schaal: 1/50

27/03/02

