



Romeinsesteenweg 524  
1853 Strombeek-Bever  
tel. 02 880 8890  
info@aceg.be  
www.aceg.be



### Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 23/09/2015

Inspecteur: Jarno Van Gansen

Installateur: -

Datum verslag: 23/09/2015

B.T.W. nr.:-

IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Serie Nr.: 1775063

Toestel mag gebruikt worden tot: 16/01/2016

#### Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Eekhout  
Huisnummer 26  
Postcode 1840  
Gemeente Londerzeel  
Type woning

#### Eigenaar:

Naam Dhr. Nieuwdorp  
Straatnaam Eekhout  
Huisnummer 26  
Postcode 1840  
Gemeente Londerzeel

EAN : 54

Teller Nr. : 04368337

**Aard onderzoek:** Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI artikels 274, 278 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup> Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 12 Aardelektrode: Pen pen weerstand: 12 Ω Isolatie: 1.7 MΩ

#### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	I <sub>t</sub>	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	12	Ok	Ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok
mA	A					

#### BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming			Sectie	Aantal kringen	Bescherming			Sectie
	Curve	IN	P			Curve	IN	P	
Zie Schema's				mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>
				mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>
				mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>
				mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>

**Visueel nazicht (algemeen)**  OK  NOK **Directe aanraking**  OK  NOK **Indirecte aanraking**  OK  NOK  
**Aansluitingen**  OK  NOK **Correcte schema's**  OK  NOK **schema in bijlage door Aceg vzw**   
**Equipotentiale verbindingen**  OK  NOK  niet van toepassing  in afwachting  
**Continuïteit**  OK  NOK **Verlichting / toestellen**  OK  NOK  NVT

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

**CONCLUSIE**

- ☑ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 23/09/2040
- ☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☑ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT**


Jarno Van Gansen


**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, ~~rechtsreeks~~ of ~~onrechtsreeks~~, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, ~~afdeling gas – elektriciteit~~

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

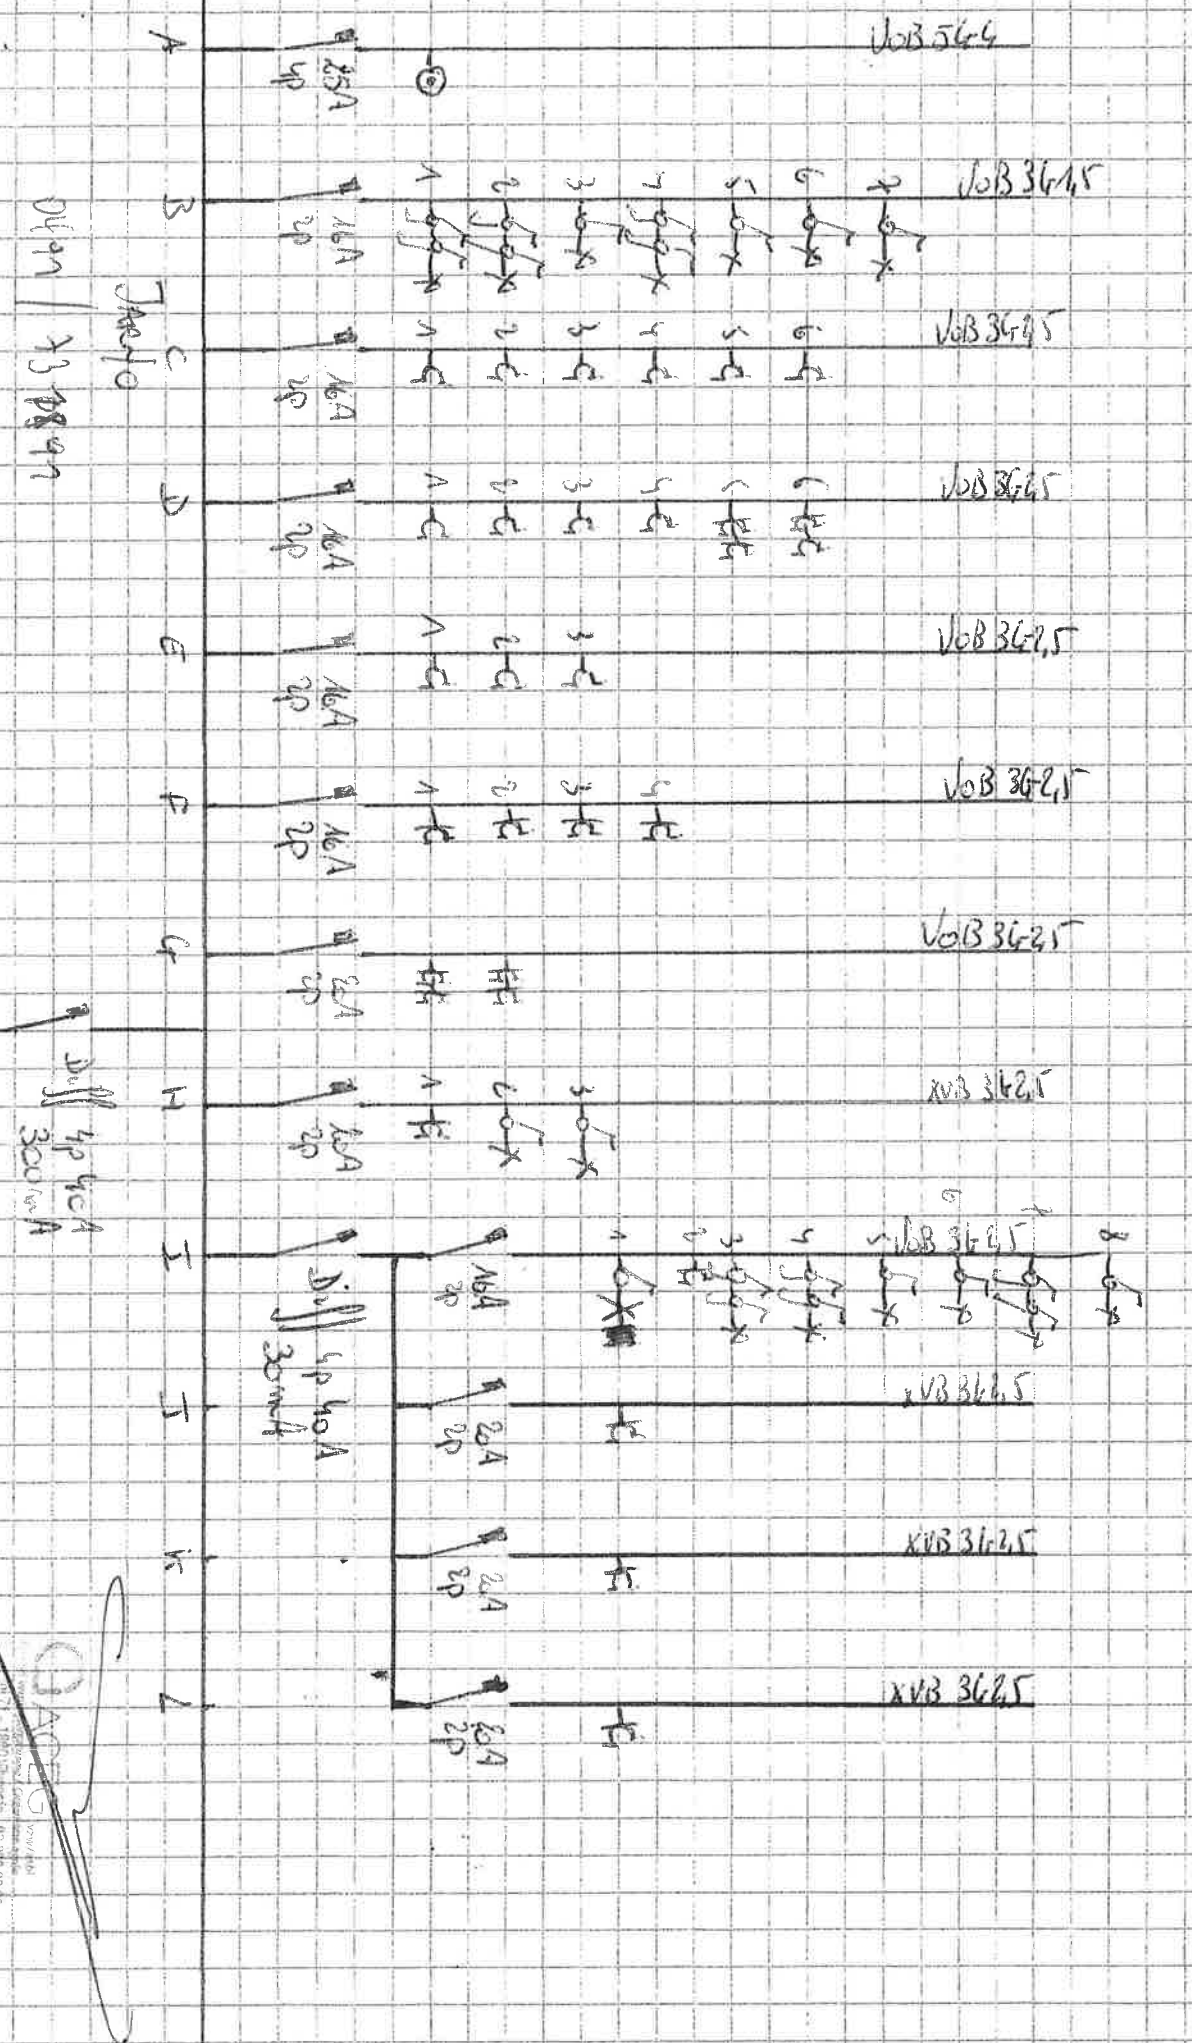


04.01 / 23.08.97

V0B 36-4,5

Diff 4P K6A 300minA

Diff 4P K6A 300minA



GADP  
 Gesellschaft für Arbeitswissenschaftliche Dienstleistungen  
 10775 Berlin, Tel. 030 202040-0, Fax 030 202040-99





