

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR. M.P. 1 24 107 Mo.
ADRES INSTALLATIE: Overbosstraat 1 B3
2200 Mechelen
EIGENAAR: De Haerck
Adres: idem
OPDRACHTGEVER: Adelsteun BVBA
Adres: idem
INSTALLATEUR: Karlsbergen
Adres: idem
BTW of IK: Nr. 6252

DISTRIBUTIEBEHEERDER:
Meter nr.:
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 22/02/2014; Aanvulling van verslag nr.; Type der lokalen: Appartement
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken : Fundering vóór -/na 1.10.81 ; Installatie vóór -/na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. (86)-87
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: Alu 40 A ; Alg. schakelaar: type: NDS 40A 0,3A
Netaftakkabel (type & sectie): LVB 4x25 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus ; baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 16 ; Spreidingsweerstand : 2,5 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 210 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

NDS 40A 0,3A -> kringen A, B, H, F, M, K, L, G, Q, W, J, Z
NDS 40A 0,3A -> kringen X, E, I, R

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 - IV
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - nee
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Altyd in gebroeken: Kanten, Braadhamer, Bieten
slagcontacten, lichtvervalsing

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.


4. BESLUIT : De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/02/2014
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Nils VAN ASCH
agent-onderzoeker


stuyvenberg App B3 Gentse Steenweg 1 Mechelen
Eendraadschema

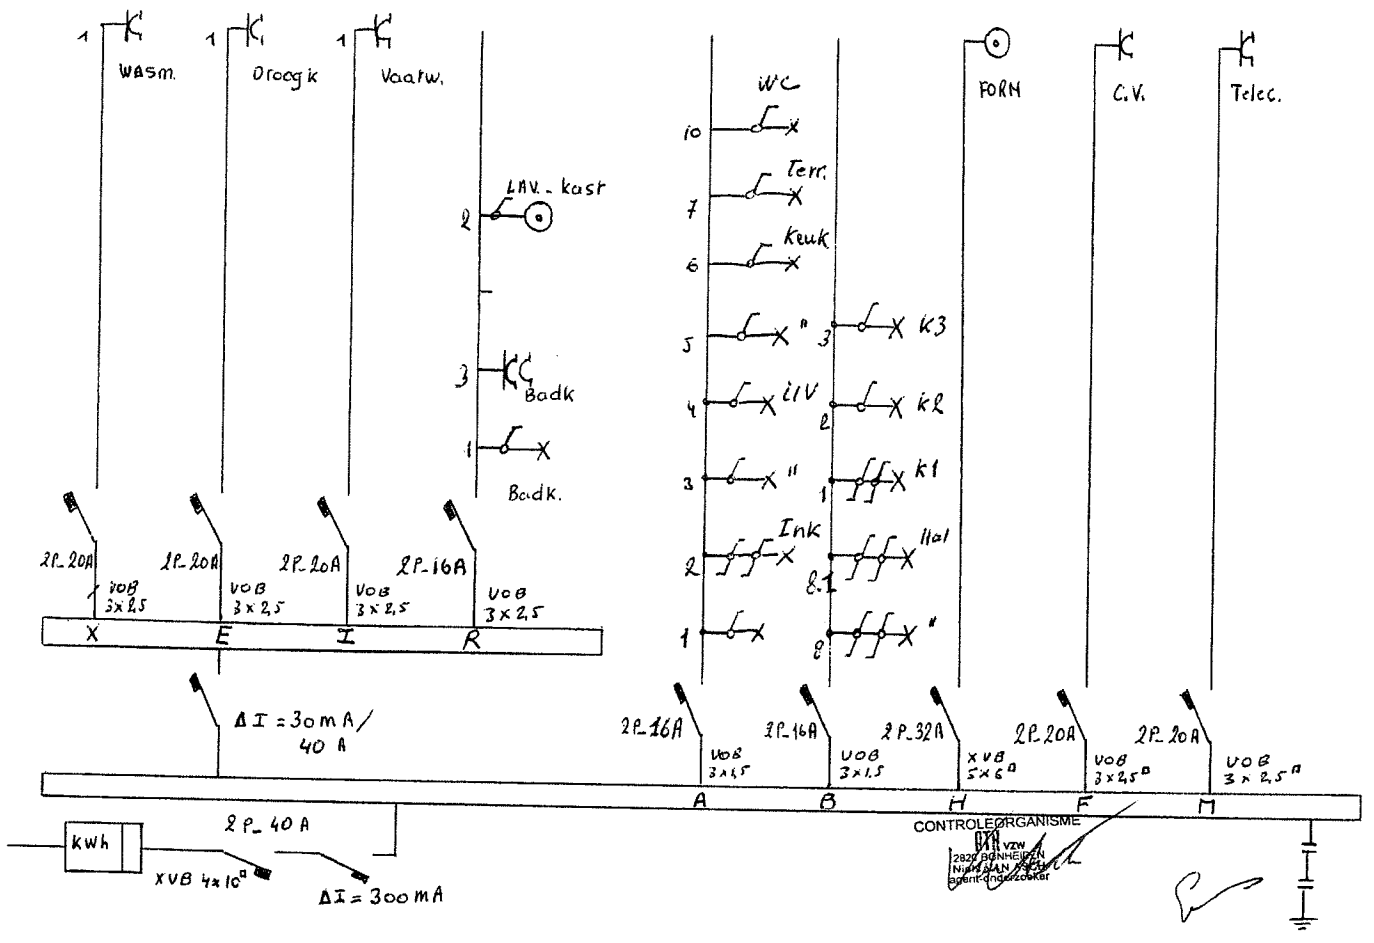

CONTROLEORGANISME
 BVN VZW
 2020 BONHEIDEN
 NIEUW-AN
 Belgisch Koninkrijk

[Handwritten signature]

Berijng zolden

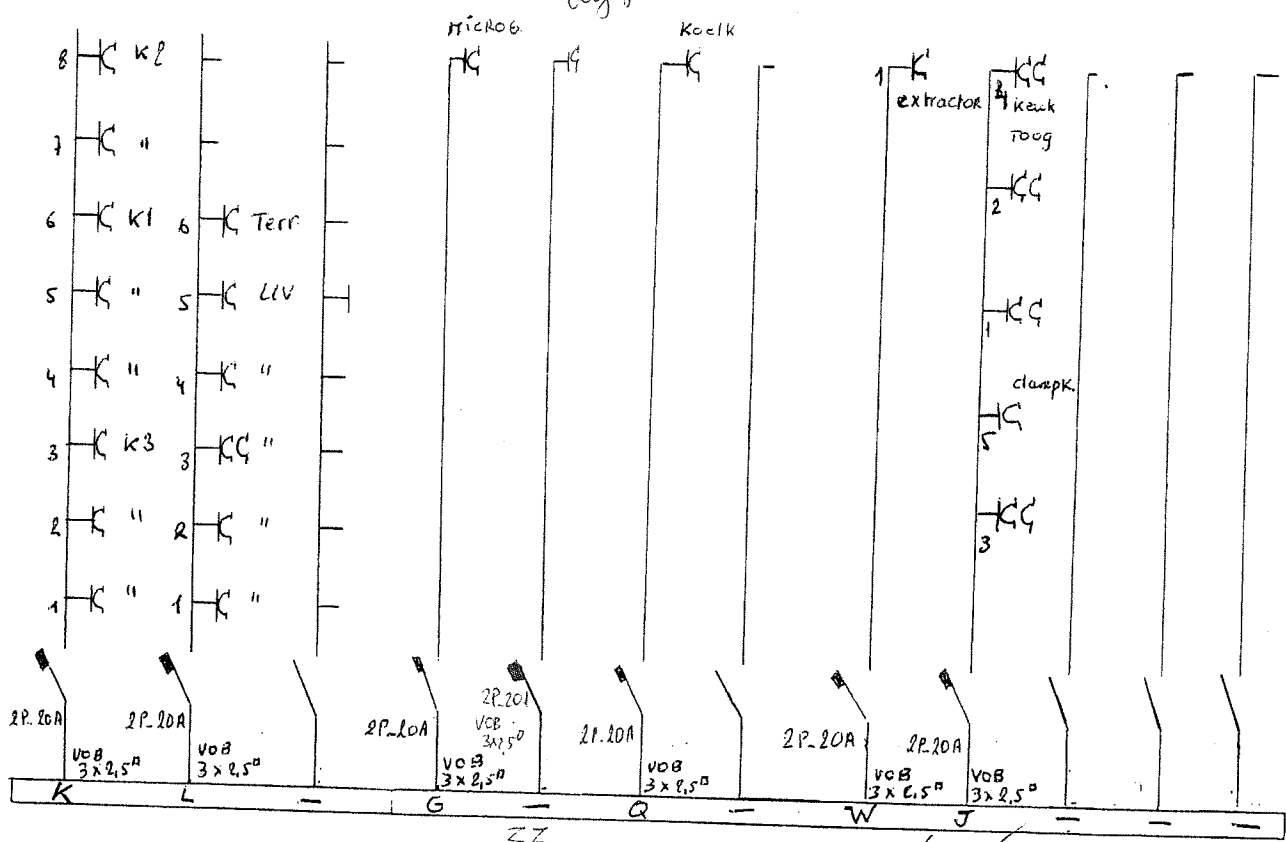

CONTROLEORGANISATIE
 NIEDE RIJLAND
 agent-onderzoeker
