

3255053

EAN nr

Teller nr.

Stand I

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controleonderzoek op basis van de interne procedure OPRO/ELE/001
volgens: AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 276bis / AREI art. 276bis
Aanvulling verslag nr. 13/08/17/107 VAN BTU - DATUM 17/11/2008
Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Verandering Bestaande / Verwijdering / Sollicitatie / Spanningswijziging / Overbrengen
Type der lokalen: APPARTEMENT
Plaats van onderzoek: 25 UD. MOLENVEGDEWEG 1131 bus 2 2880 BORNEM
Eigendom van: VAN DOORSLAER E. MOLENVEGDEWEG 1131 bus 2 2880 BORNEM
Opdrachtgever: VAN DE WINNEN kuba Scheldestraat 42 340 TENNE
Installateur: BTW: 424717858 ID-kaart: Uitgereikt te: Datum: 10/05/2010
Onderzoeker: GROOSSENS MARIE Datum van onderzoek: 10/05/2010

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1x 230V 3x 230V 3x 230V Max. Beveiliging: 3p40A Omschakelaar stand: 1
Hoofdbeveiliging: Zek: AUT. ONB. Schak: 1 DIFF 3p(4) 40A
Meter-bordverbinding: kabeltype: CAUB aantal geleiders: 3 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: BESTAANDE aantal geleiders: doorsnede: mm²
Bovengronds/bovengronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode: Type: lus/baten / pennen / horizontale geleiders Sectie: 16 mm² Spreidingswaarde: 10 Ω
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 6 Algemene isolatieweerstand: 7630 MΩ
Diff. schak.: algemene: 3(4)p. 40A 30mA bijkomende: 3(4)p. 40A 30mA
werking testknop: in orde - niet in orde controle foutlus: in orde - niet in orde
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: ja - nee Staat van het vast elektrisch materieel: in orde - niet in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking: in orde - niet in orde
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding: in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde - niet in orde
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen:

* BEDRIJFING VERVOLGEN VOLGENS ART. 270 VAN HET AREI EN ART. 178 VAN HET
BESTAANDE KABEL: VOB 4x4mm² + UITBREIDING OVEN: KABEL D.
- AANSLUITING MET BESTAANDE 16mm² KABEL NAAR KOUDEKLEI
VERDEELDOP

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - niet geplaatst.

H. INSTALLATIE VERVOLGEN VOLGENS ART. 270 EN ART. 178 VAN HET AREI

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/05/2015, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel in elke provincie

maatschappelijke zetel
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be


BTW BE 0404 312 034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwettigend v.z.w.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie,
energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUIJERS, EIGENAARS Krachten het AREI bent u verplicht
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektr.

03-0051409/09/15D

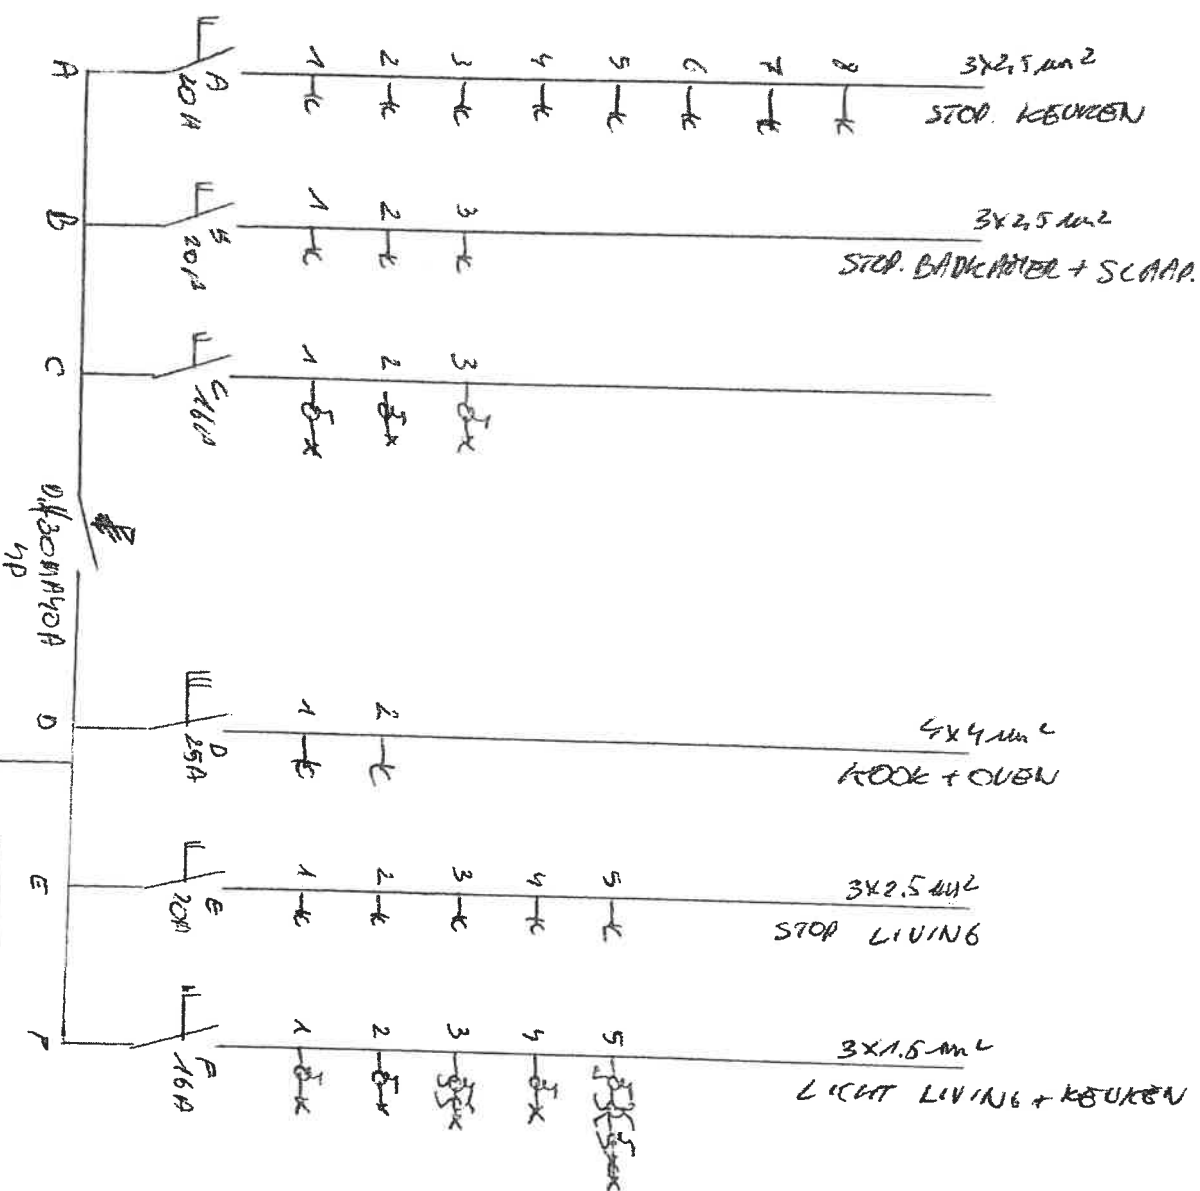

3x2.5m²
OFFICE UP
3000A

VAN DECKSELMEER BBAH
MOENUCBOLD WBSG 5462
2880 BBAWH

VAN DECKSELMEER BBAH
SIBELBESYMAAT 42
2880 BBAWH

Installatie is gecontroleerd door
O.C.B.
Kon. Astridlaan 60
Onderzoeker: **GOOSSENS MANU**
Datum: 10/10/10
P.V. nr.: 345053
Handtekening:

