



Verslag

VERSLAG NR

ANT/15/30808770/00/NL/000

Origineel



Uw klantnummer:



040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Heidedreef 8/b, 2243 Pulle



Uitgevoerd op:

01/07/2025 09:54 - 11:09



Uitgevoerd door: KEVIN VERBEECK (3076)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Eigenaar

Adres

-

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam

Patrick Vanderbeken

Adres

Heidedreef 8/b, 2243 Pulle

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID

100 370 866

Adres

Heidedreef 8/b, 2243 Pulle

EAN-code

541 448 820 046 654 371

Netbeheerder naam

Fluvius

Nr Teller

1SAG1100491046

Gecontroleerde
installatie

- Wooneenheid

Type installatie

Huishoudelijke installatie

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be

BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Uitgiftedatum: 08/07/2025

1 / 6

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.5. Controlebezoek
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020
Toegepaste afwijkingen	- Deel 8

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	40
Type van de algemene schakelaar	- Differentieelscheidingsschakelaar
Spanning (V)	- 230 V AC

BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: Bord 1


Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	23



(Elektrisch bord)

LS-bord: Bord 2

Plaats van opstelling	Garage
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	2

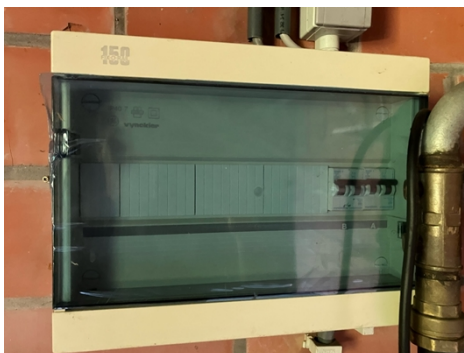

(Elektrisch bord)

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Beschermingsmaatregelen RA	OK
Beschermingsmaatregelen OA	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden	OK

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.

Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Aardingslus
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	12.1
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	2.7

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 1/7/2050.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.



Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.




Verslag

Origineel

VERSLAG NR
ANT/15/30808770/00/NL/000

Bijlagen

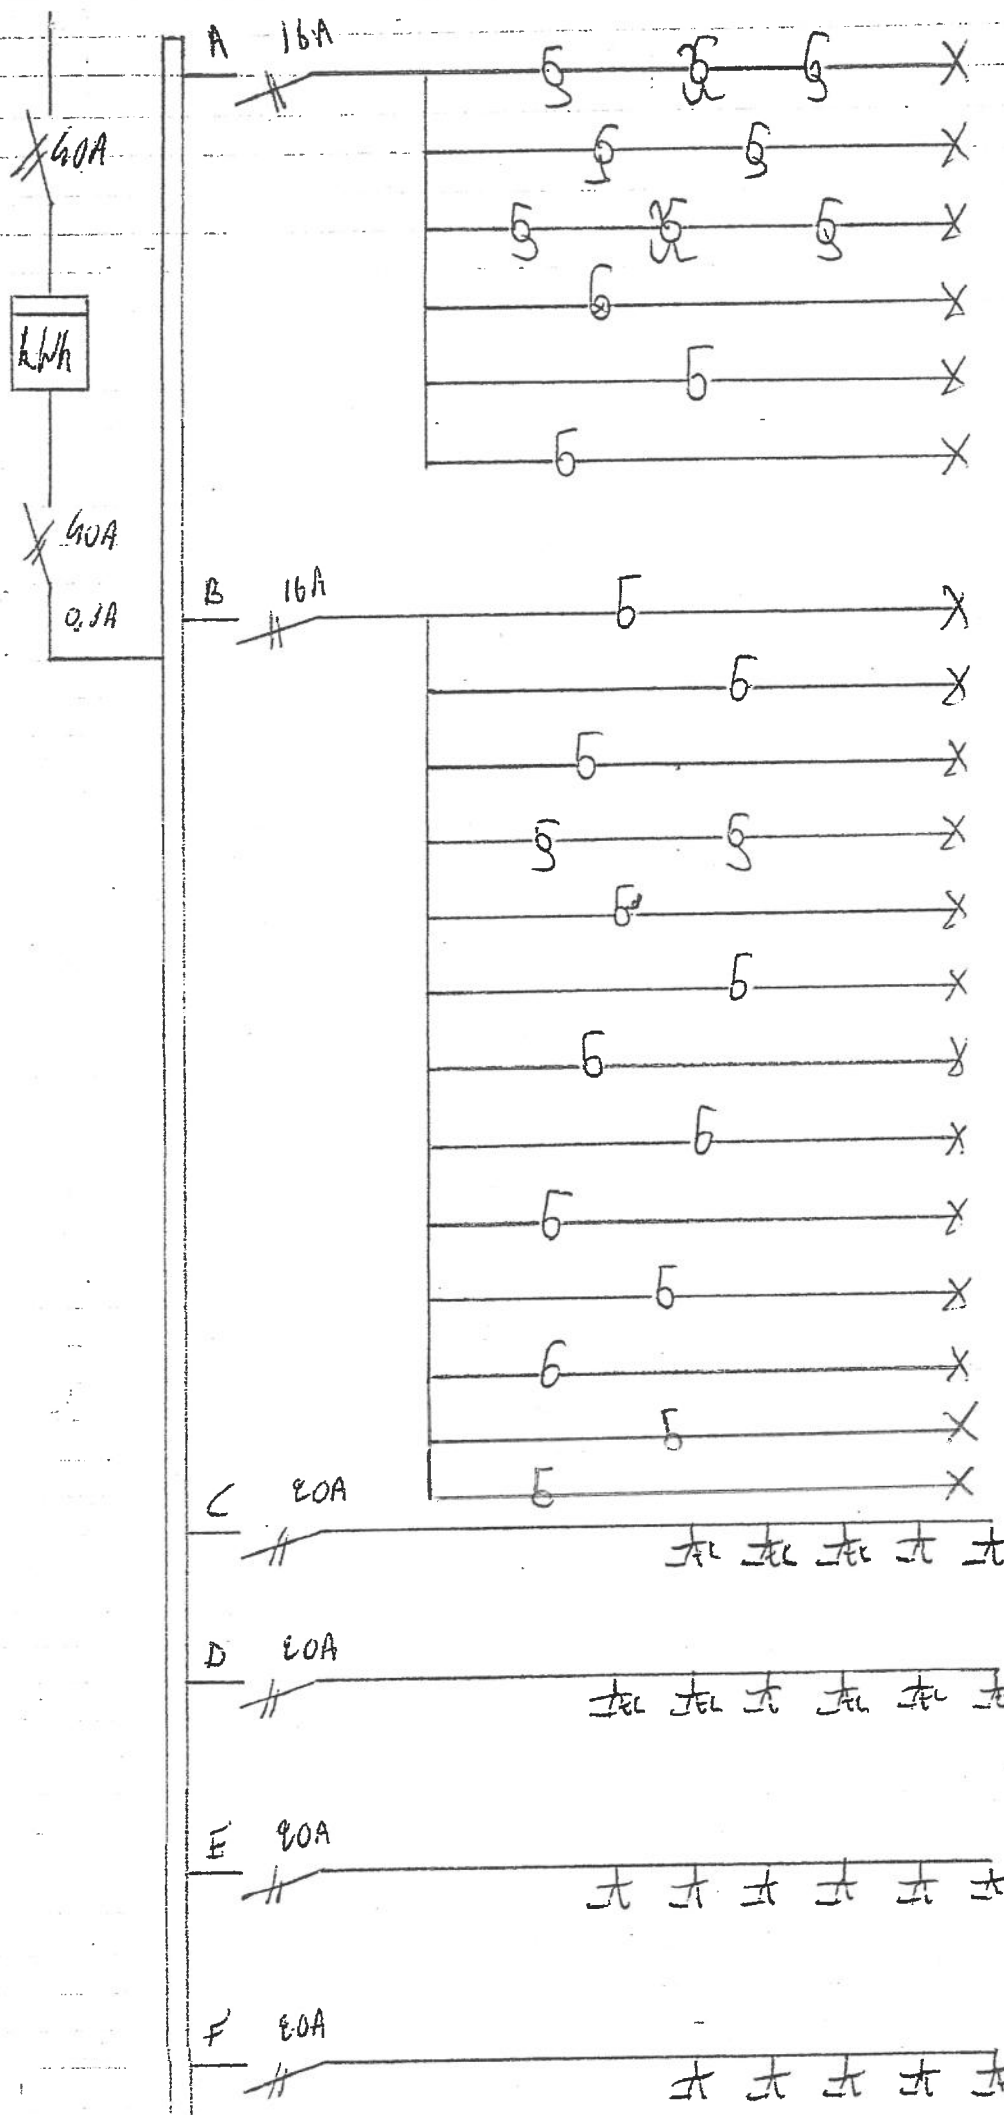

hal

overloop

overloop

kelder

keuken

buiten

Verbeeck Kevin
AV3026

8/07/2025

Wc

atelier

berging

Woonk

Woonk

buiten

slaaph

dressing

bureel

slaaph

buiten

Zolder A

Zolder B

Woonk

berging + Woonk

keuken

hal + atelier

6 20A

Slaaph 1

H 20A

buneel

I 20A

Slaaph 2
zolder

J 20A

over

K 20A

over

L 20A

kelder

M 20A

CV

N 32A

poortus

O 32A

garage

P 20A

tuin

Q 6A

elcom

WOA
H 003A

R R WOA

E

bad

± ±

E

douche

±

buiten

±

S WOA

warm

T WOA

draag

U WOA

raak

V WOA

boiler

W 16A

poort
verlichting

T


WONING- EN VILLABOUW
RIK DE KEYSER NV
industrieweg 3-5
2330 merksplas
tel 014/634676
fax 014/635003


De afgevaardigde v/h
erkende organisme
DR. VAN DYCK F.

R630

[Signature]

07110197

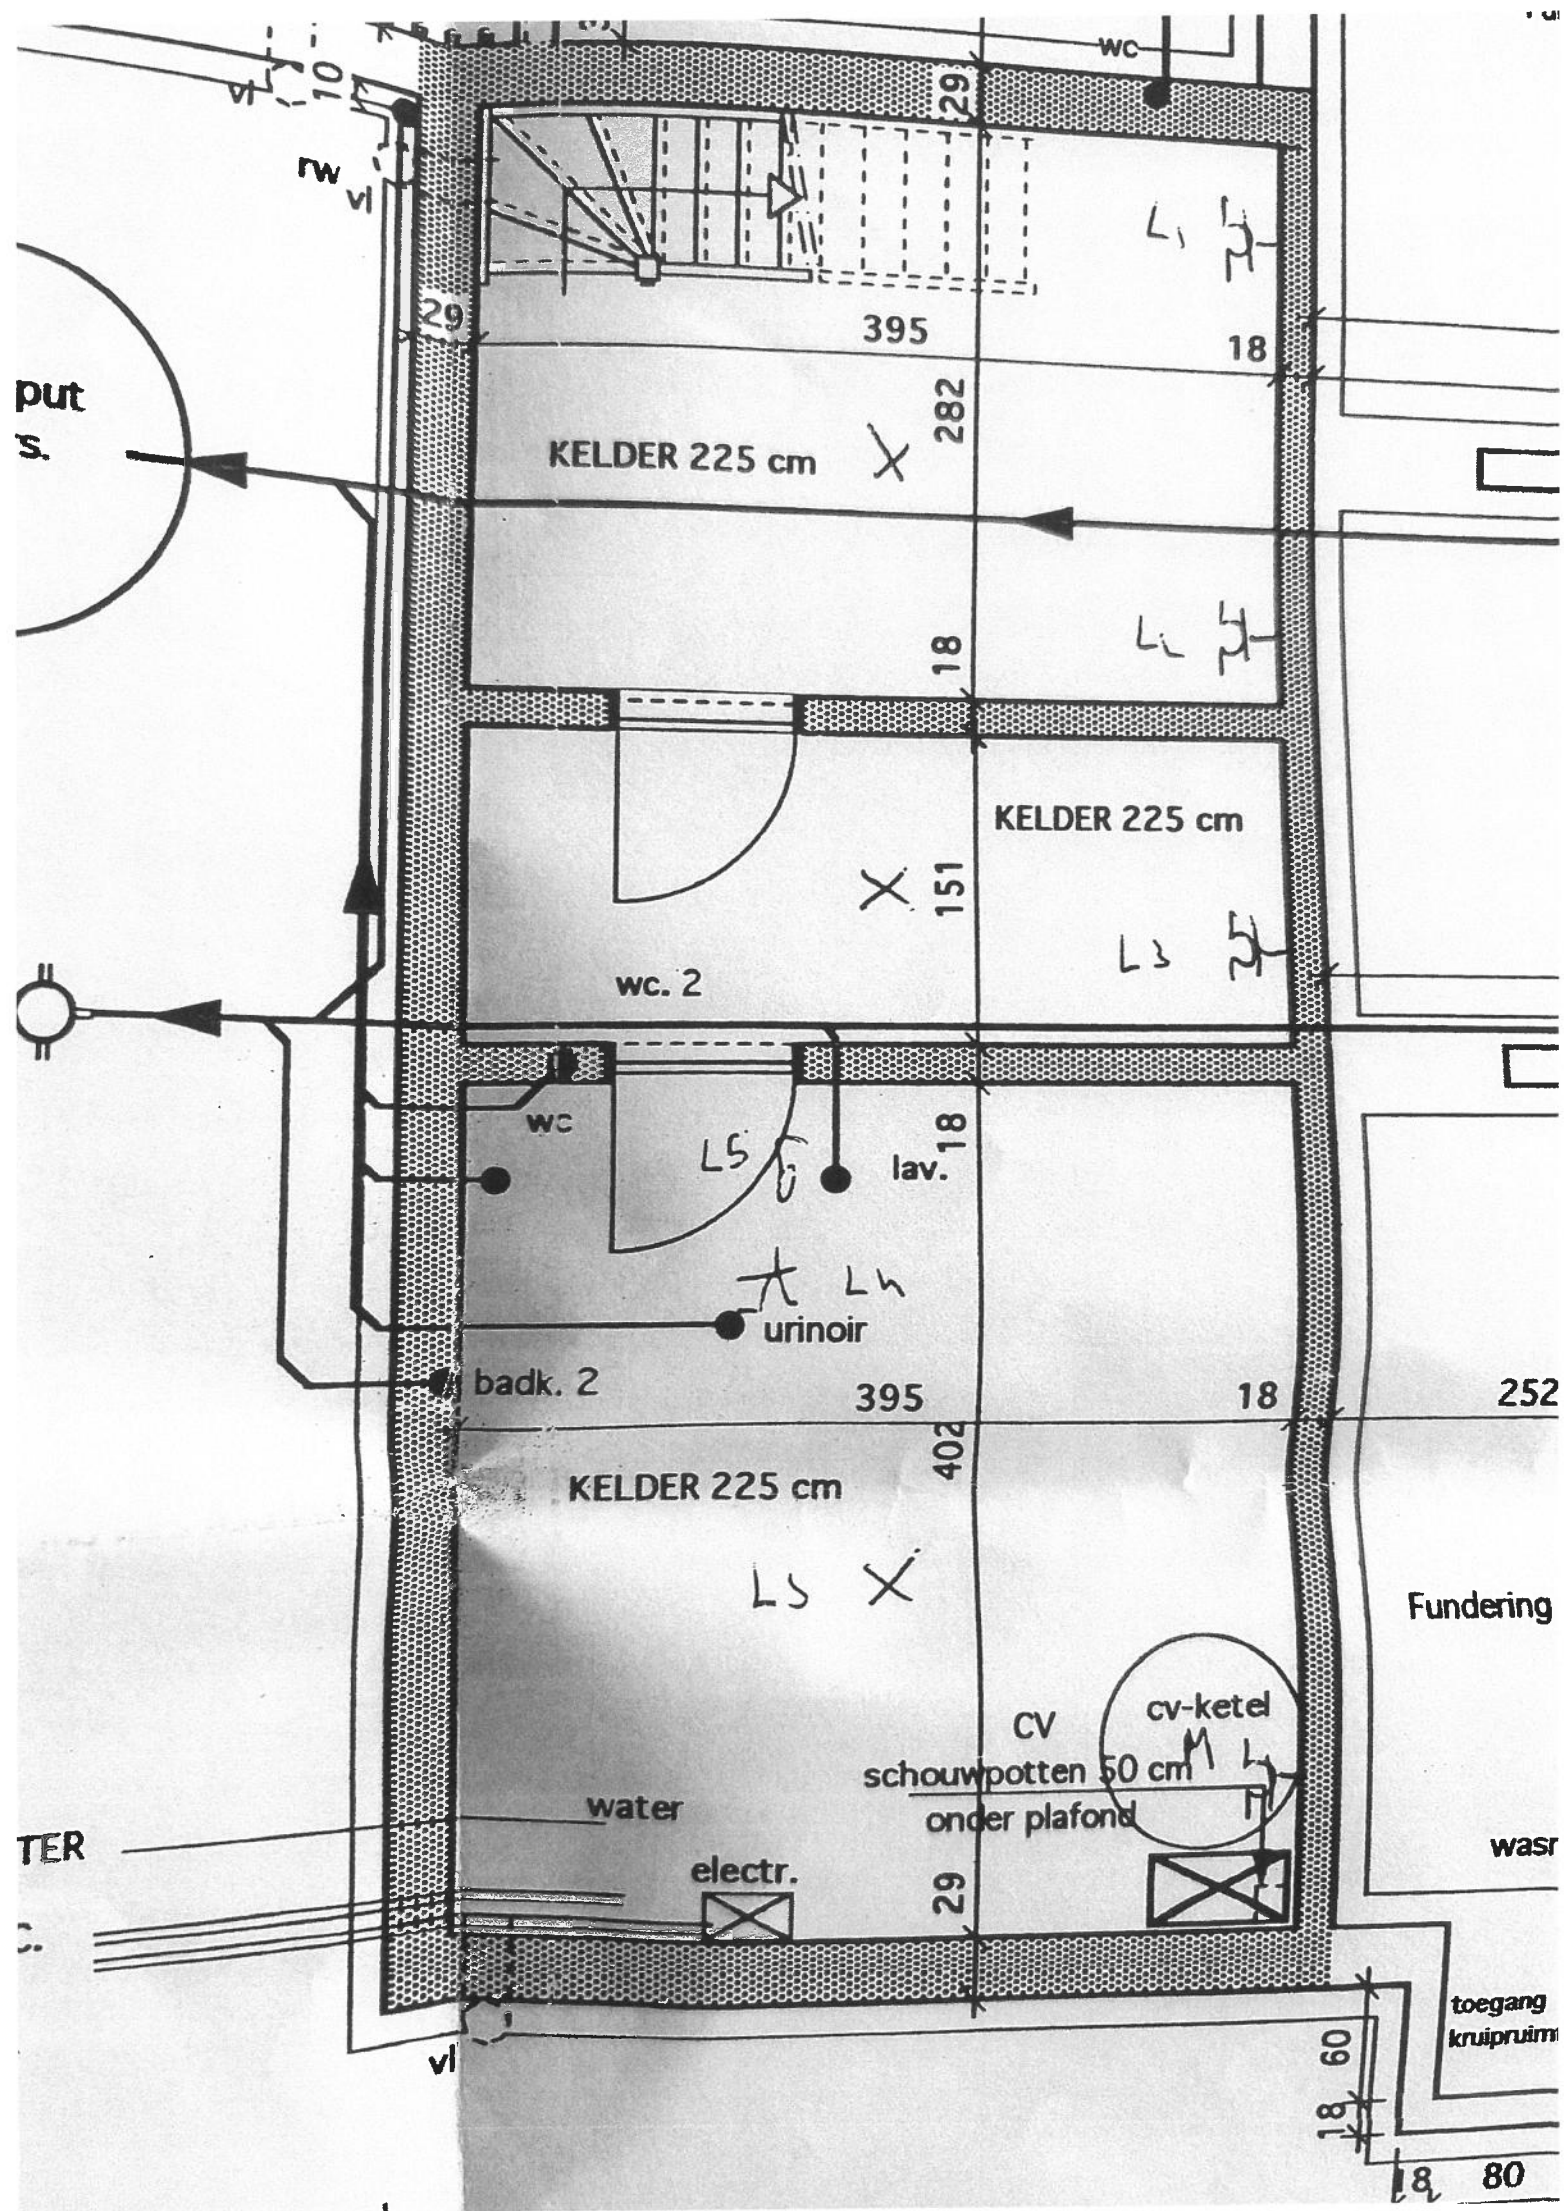



GRONDPLAN

PLAN NR 01/03



