



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

CONFORM

Datum: 28/05/2025

Inspecteur: Fabio Van Londersele

Mentor: -

Installateur: Aes

ID-label: Bruulstraat 8/ Pastoij

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251249

Datum verslag: 28/05/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Bruulstraat
Huisnummer 8
Busnummer
Postcode 9450
Gemeente Haaltert
Land België

Eigenaar

Naam Gemeente Haaltert
Straatnaam Hoogstraat
Huisnummer 41
Busnummer
Postcode 9450
Gemeente Haaltert
Land België

Installateur

Naam Aes
BTW nr. BE 0833 460 424
Telefoonnummer +32 497 26 95 65
E-mail aeskris@telenet.be

Type

Lichte industrie

Aard onderzoek

Controlebezoek van een bestaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5 en 4.2.4.4.

Gegevens van de installatie

Uitwendige invloeden: Zie uitwendige invloeden in bijlage verslag

NAZICHT VAN DE INSTALLATIE

Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie Ls installatie Pastoij

De controle omvat meerdere verdeelborden

Ja

Aanwezig netsysteem

TT via openbare teller
SN teller: 1Sag3105076535
Netbeheerder: FLUVIUS Spanning:
3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 40 A

Beschrijving aardingsinstallatie

Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Beoordeling elektrische schema's

Schema's in orde, zie schema's in bijlage van dit verslag.

Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op ALSB

10 Ka

Noodnet

Kortsluitvermogen normaal Max.

Gemeten waarde : 1.43 Ka

Kortsluitvermogen noodnet Max.

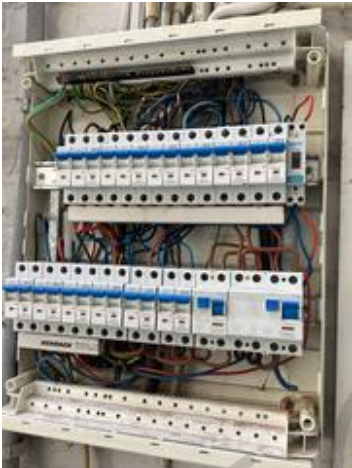
Voedingskabel type + sectie

Xvb 4x10

Filiatie

Nee

VERDEELBORDEN

1	Omschrijving: Alsb	
	Opmerkingen (Nederlands): Geen	Opmerkingen (Frans):
2	Omschrijving: Bord inkom	
	Opmerkingen (Nederlands): Geen	Opmerkingen (Frans):

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN

Spreadingsweerstand van aarding	22.8 Ω
Continuïteitsmeting	OK (< 1Ω)
Testen proefknoppen DSI	OK

Kortsluit en isolatiemetingen:

Verdeelbord/kring/stopcontact	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (MΩ)
Alsb	1.43	1.05	13.59

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Besluit

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.

- ☒ Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.
- ☒ AREI boek 1 (KB08/09/2019).
- ☒ Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 28/5/2030 AREI Boek 1 afdeling 6.5.2., alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding volgens Boek 1 van het AREI (KB 08/09/2019).

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Fabio Van Londersele



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





