



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Rapport d'inspection d'une installation intérieure en gaz naturel

Date inspection: 20/02/2026 **Inspecteur:** Daniel Malara **Mentor:**

Date rapport: 20/02/2026 **Étiquette d'identification:** **Référence client:**

Adresse de l'installation		Propriétaire	
Rue	Rue Colompré	Nom	
Numéro	84	Rue	
Boîte	011	Numéro	
Postcode	4020	Boîte	
Commune	LIÈGE	Postcode	
Pays	Belgique	Commune	
		Pays	
Client		Installateur	
Nom de contact		Nom	
Téléphone		N° TVA	-
Numéro Gsm (SMS)		Numéro de téléphone	
		E-mail	

TYPE

PARTIE CONTRÔLÉE

- ☒ 1ère mise en service
☐ Modification
☐ Contrôle périodique

- ☒ NBN D51-003
☐ NBN D51-004
☒ NBN/DTD B61-002

1. DONNÉES

☐ Le compteur n'a pas encore été placé

Gestionnaire réseau de distribution:	Resa	EAN:	
N° compteur:		Index:	
			☒ Non communiqué



G: 4 **Qmax:** 6 m³/h

Pmax:

0.2

Type de gaz:


Gaz naturel G20

Pression au compteur ou au réservoir:

21 mbar

Endroit d'installation:

Cave commune

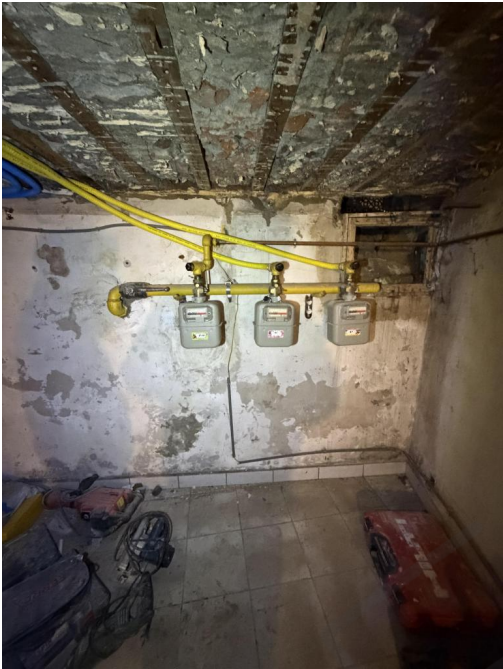

2. INSTALLATION

Numéro d'attestation de conformité numérique ElgaCert

S.O.

Art. 48 numéro(s)

S.O.

3. ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

Exécuté avec:

☒ Pression

150 mbar

☐ N° compteur

Marque:
Pression + temps d'essai d'étanchéité

☐ Debitmètre

Marque:
Type:
Précision:

☒ Produit moussant

☒ Nouvelle installation

☒ Pas de fuite: OK

☐ Installation existante

☐ Fuite constatée: POK

☐ 0,0000m3 (10 min)

☐ 0,000m3 (10 min)

☐ 0,00m3 (100 min)

☐ 0,0 m3 (utiliser autre compteur ou débitmètre)

☐ Pas de fuite: OK

☐ Fuite constatée: POK

☐ Pas de fuite: OK

☐ Fuite constatée: POK

4. APPAREILS RACCORDÉS

Marque:	Vaillant
Type:	Type C 13
Catégorie:	I2E(s)
Pn en kW:	28
N° série:	21260200100218493130334211N2
Année de construction:	26
Endroit d'installation:	SDB



1

Sortie de cheminée: Visible



Remarque	Détails supplémentaires
nota/note 1.1 Le ruban d'emballage auto-vulcanisant ou le manchon thermorétractable recommandé par le fabricant doit être appliqué sur tous les raccords PLT après le contrôle. Ceci est nécessaire pour empêcher la pénétration d'humidité entre la gaine le tuyau et pour empêcher le	Le ruban d'emballage auto-vulcanisant ou le manchon thermorétractable recommandé par le fabricant doit être appliqué sur tous les raccords PLT après le contrôle. Ceci est nécessaire pour empêcher la pénétration d'humidité entre la gaine le tuyau et pour empêcher le desserrage non

desserrage non autorisé du raccord. Si ce n'est pas le cas, il est possible que le gestionnaire du réseau de distribution ne mette pas le compteur de gaz en service.


autorisé du raccord. Si ce n'est pas le cas, il est possible que le gestionnaire du réseau de distribution ne mette pas le compteur de gaz en service.

6. CONCLUSION

☒ L'installation alimentée au gaz est conforme aux prescriptions ci-dessus.

Publication du rapport d'inspection

L'inspecteur Daniel Malara


452 - DANIEL MALARA





ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Teken volgende elementen van de **volledige installatie** (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C₃₃) en vermogen P_n).

Belangrijk: **duid op** het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd.

94 / 1

Dessinez les éléments suivants de l'**installation complète** (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Cuivre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C₃₃) et puissance P_n).

Important : **marquez** sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même.

