

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: 98817  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: ldr@telenet.be

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4779153  
Voort. verslagnr.:  
Datum: 25/01/2017



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:  
LDR  
INDUSTRIELAAN 5 BUS5  
2950 KAPELLEN (ANTW.)

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/install. ID: Aard installatie: gedeeltelijk vernieuwd Type lokalen: appartement  
Plaats onderzoek: RUSEVA THEODORA VAN EYCKLEI 39/3 ANTWERPEN 1 2018  
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/271bis/278  
Datum onderzoek: 25/01/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2042 Onderzoeker: VAN DAMME ERIK  
Eigendom van: Kies een item  
Installateur: LDR Elektriciteitswerken  
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: 25904316 Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A Schak.: alg. diff. schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: papier-lood aantal geleiders: 4 doorsnede: NZ mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 6 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 0,6 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: In orde bijkomende diff.: 4p 40A/30mA  
Werking testknop: In orde Controle foutlus: In orde Algemene isolatieweerstand: 14.51 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde Staat van het vast elektrisch materieel: In orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: In orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ☐ één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 8

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
3. Dit verslag vervangt voorgaand verslag van 25/08/2015

N

I Geen inbreuken.


**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker


1/1

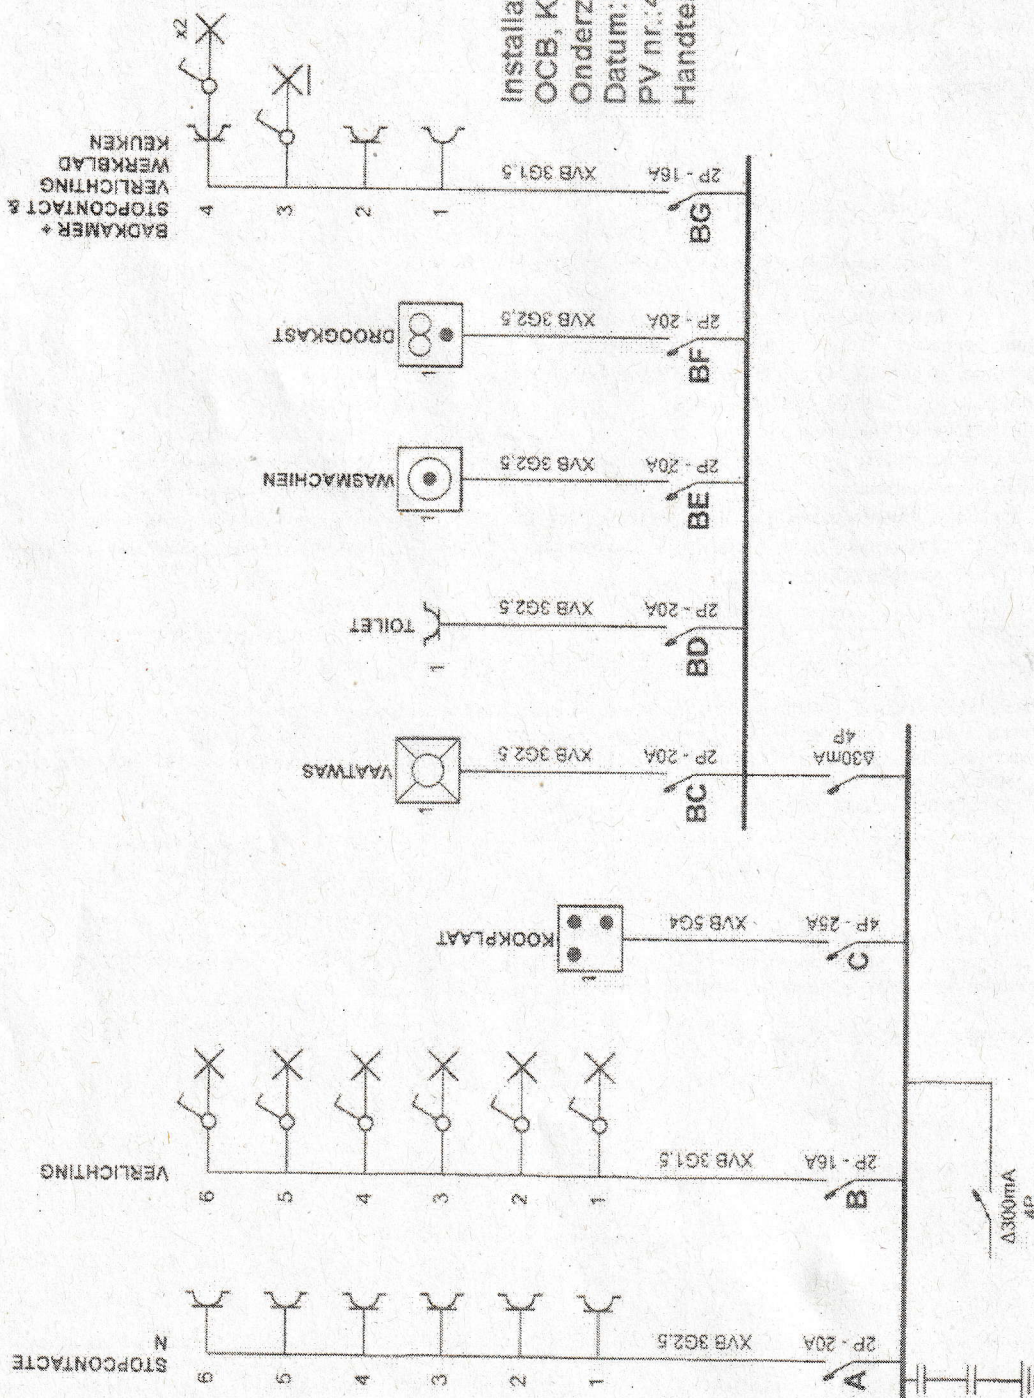

Installatie is gecontroleerd door:  
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich  
 Onderzoeker: VAN DAMME ERIK  
 Datum: 25/01/2017  
 PV nr.: 4779153  
 Handtekening:

Plaats van de elektrische installatie  
 Ruseva Theodora  
 Van Eycklei 39  
 2018 Aalst

Installateur  
 LDR Elektrische werken  
 Industrielaan 5 bus 5  
 2950 Kapellen  
 Tel.: 03 663 17 16 GSM: 0477 25 42 14  
 Fax: 03 295 38 50  
 e-mail: ldr@telenet.be  
 BTW BE 0472.498.876

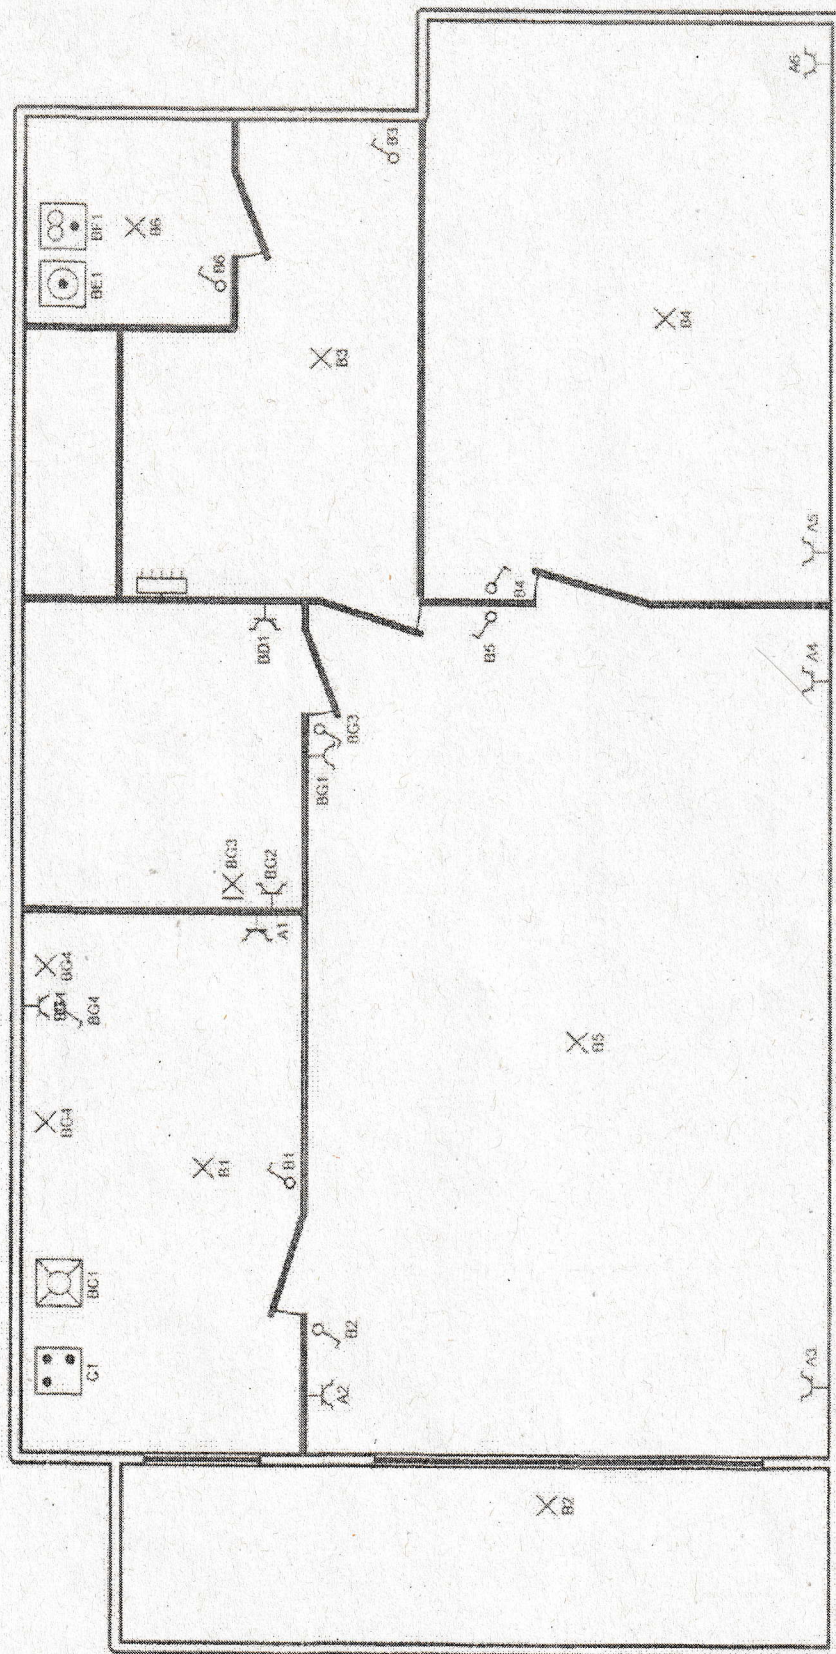

Installatie is gecontroleerd door:  
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich  
Onderzoeker: VAN DAMME ERIK

Datum: 25/01/2017  
PV nr.: 4779153  
Handtekening:

Plaats van de elektrische installatie  
Ruseva Theodora  
Van Eyckel 39  
2018 Antwerpen

Installateur  
LDR Elektricitetswerken  
Industrielaan 5 bus 5  
2950 Kapellen  
Tel.: 03 663 17 16 GSM: 0477 25 42 14  
Fax: 03 295 38 50  
e-mail: ldr@telenet.be  
BTW BE 0472 498 876

p. 2/3  
Situatieschema  
3 x 400V + N ~ 50Hz

**A** STOPCONTACTEN  
**B** VERLICHTING  
**C** KOOKPLAAT  
**BC** VAATWAS  
**BD** TOILET  
**BE** WASMACHIEN  
**BF** DROOGKAST  
**BG** BADKAMER + STOPCONTACT & VERLICHTING WERKBLAD KEUKEN

Installatie is gecontroleerd door:  
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich  
 Onderzoeker: VAN DAMME ERIK  
 Datum: 25/01/2017  
 PV nr.: 4779153  
 Handtekening: 

Plaats van de elektrische installatie  
 Ruseva Theodora  
 Van Eyckel 39  
 2018 Antwerpen

Installateur  
 LDR Elektrische werken  
 Industrielaan 5 bus 5  
 2950 Kapellen  
 Tel.: 03 663 17 16 GSM: 0477 25 42 14  
 Fax: 03 295 38 50  
 e-mail: ldr@telenet.be  
 BTW BE 0472 498 876

p. 3/3  
 Lijst Kringen  
 3 x 400V + N ~ 50Hz
