



Beter Zeker.

U. Ref.: _____

O. Ref.: _____

Verslagnr. 82/160411/02

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Stationstr 52 E
Westmeerbeek

EIGENAAR: /

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Dierckx D

Adres: Breunstr 4 Westmeerbeek

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: _____

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen
- ☐ BTV Brabant-Wallon
- ☐ BTV Brussel
- ☐ BTV Hainaut
- ☐ BTV Liège
- ☐ BTV Limburg
- ☐ BTV Namur / Luxembourg
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen
- ☐ BTV Vlaams-Brabant
- ☐ BTV West-Vlaanderen

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 11/4/2016 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - ~~aanbouwonderzoek~~ volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (KB 412-2012) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~; Type der lokalen: Woonruimte

Begin werken: Fundering voor na 10.81 - Elektrische installatie voor na 10.81 - ~~1983~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning: 230 V Bescherming van de aansluiting: max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type diff 40 A / 300 mA

pe van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~penden~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 1 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

Nota: bad douche badmeubel verlichting
cv pan water verlichting keukeneiland
is mogelijk plaatsen

**PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK**

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: _____

handtekening: _____

BESLUIT

☒ 1.

De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/4/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☐ 2.



De installatie is **niet conform**.

☐ 3.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

WONING 5



GELIJKVLOERS

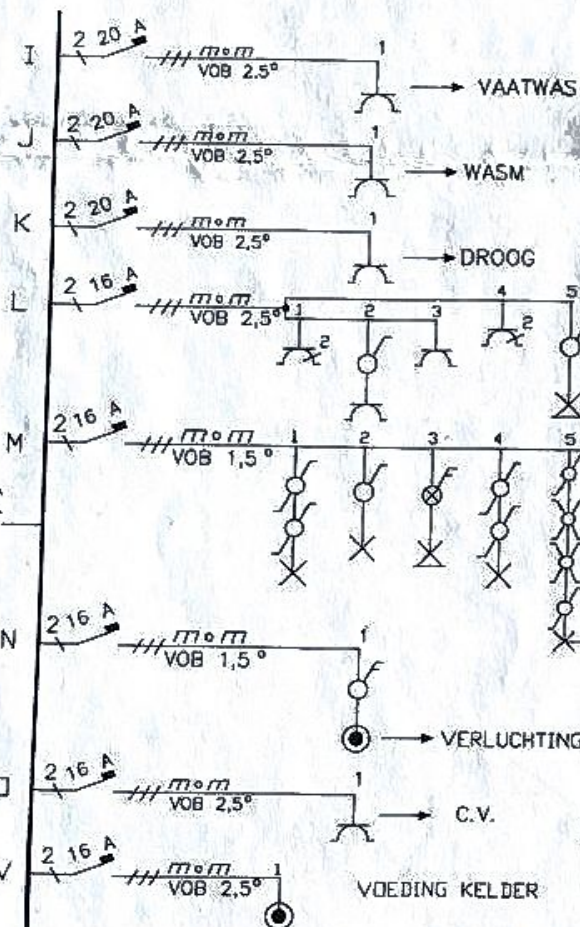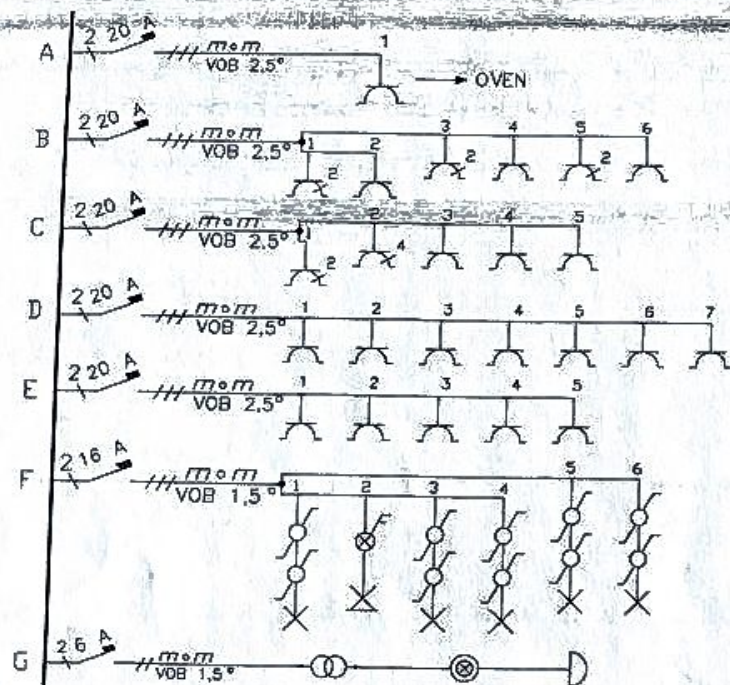

ELEK. DIERCKX DANNY
BREMSTRAAT 4
2235 WESTMEERBEEK
TEL. 016/699004
GSM 0477379088

b. dierckx

EERSTE VERDIEPING

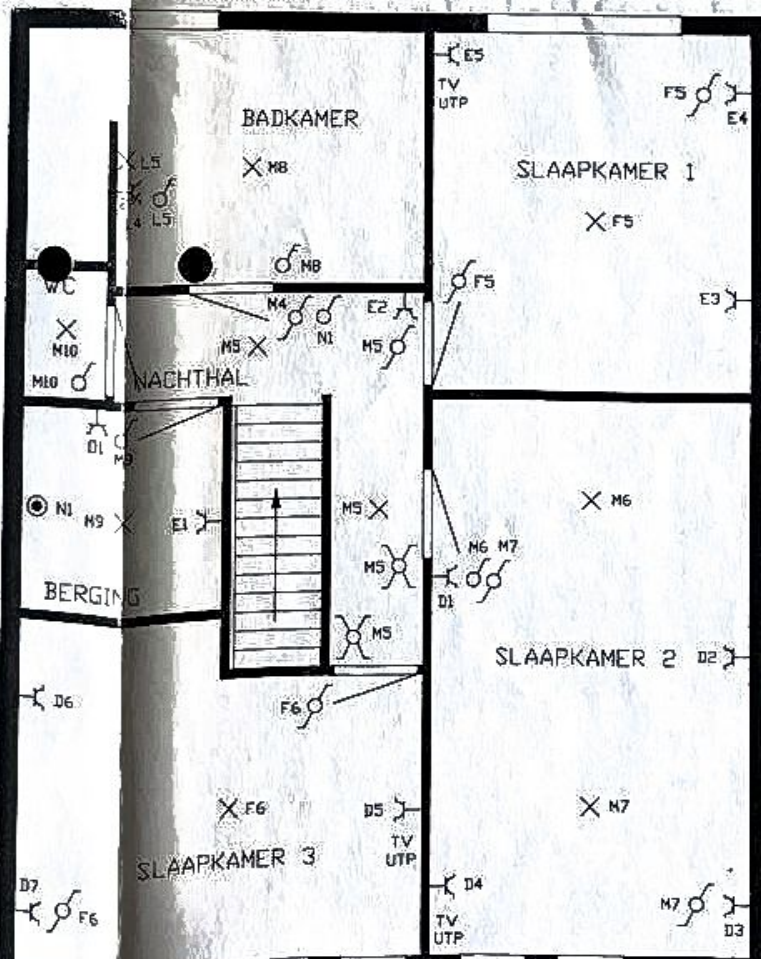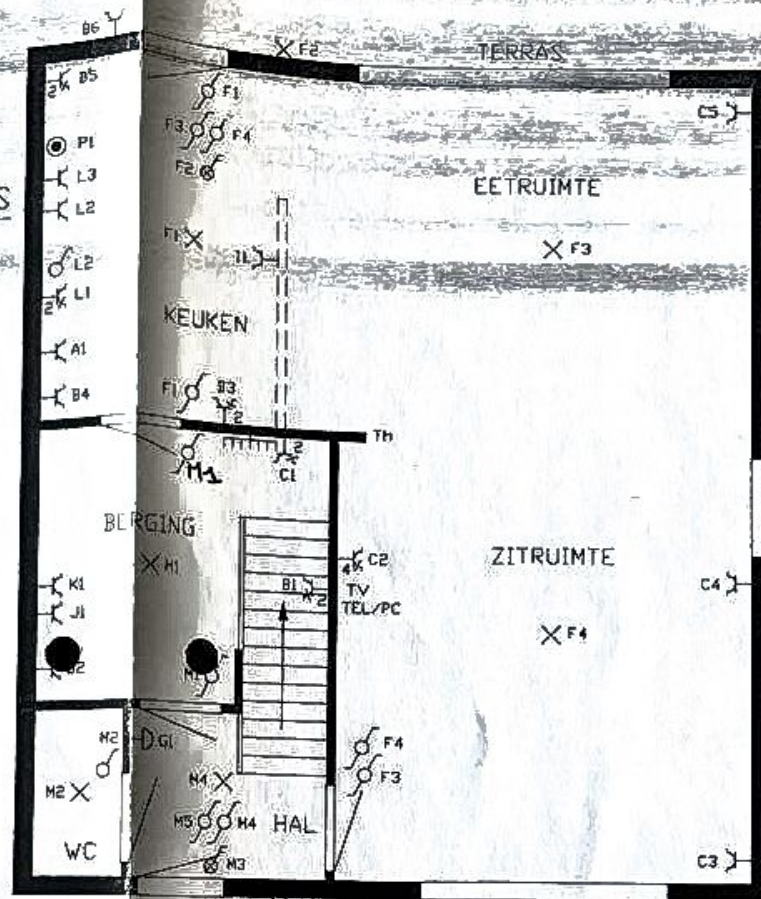

82372
11/4/2016
