



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61053303/00/NL/000



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Maanstraat 14 - 2340 Beerse



Uitgevoerd op: 05/01/2022



Uitgevoerd door: TOM CRITS (5900)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam	ANTHONISSEN Elektro
Adres	Stoffezandstraat 27 - 2990 Wuustwezel

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam	ANTHONISSEN Elektro
Adres	Stoffezandstraat 27 - 2990 Wuustwezel

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Niet van toepassing

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID	100 053 871
Adres	Maanstraat 14 - 2340 Beerse
EAN-code	541448820052897663
Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1SAG3100338037
Teller index dag	572
Teller index nacht	303
Type installatie	HUISHOUDELIJKE Inst.

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Controlebezoek (6.5.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd. - Aan de hand van de ter plaatse verzamelde informatie kunnen we de datum van voltooiing van de elektrische installatie niet met zekerheid vaststellen.
Afwijkingen	- Toepassing van deel 8

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE


Spanning (V)	400
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardingslus
Voedingsleiding - Type	VVB
Voedingsleiding - Doorsnede	10
Aantal eindstroombanen	48
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Aantal elektrische borden	2
Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	32
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	4

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Algemene Diff	63	300	A


Beschrijving van de elektrische installatie

Bord 2

Plaats	Kast overloop
Aantal elektrische borden	1
Aantal stroombanen	13

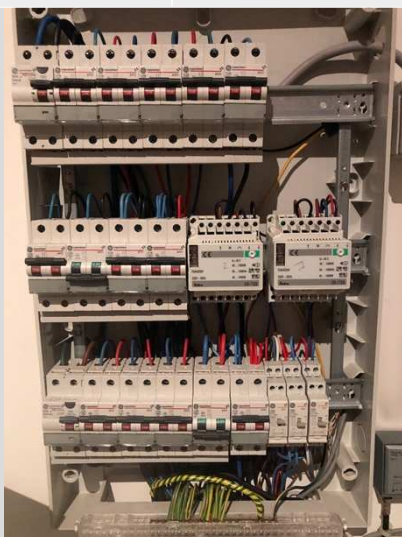


(Inwendige foto)

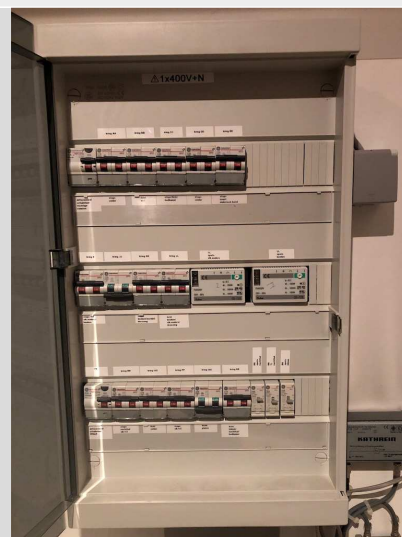

(Uitwendige foto)

Hoofdbord

Plaats	Technische ruimte
Aantal elektrische borden	1
Aantal stroombanen	35

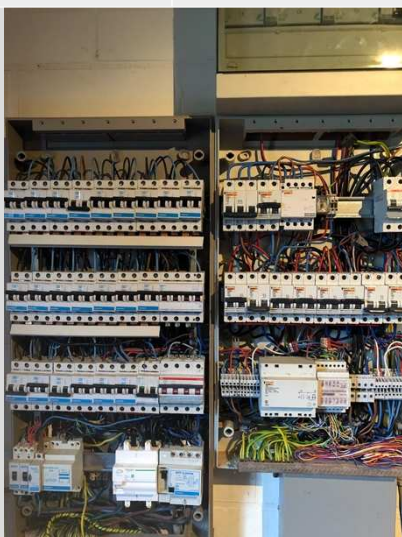

(Inwendige foto)



(Uitwendige foto)

Andere gegevens

Woonhuis

SCHEMA'S EN PLANNEN VAN DE INSTALLATIE

Situatieplan - referentie	Wuyts
Situatieplan - versie	0.2
Situatieplan - datum	13/12/2021
Situatieplan	Zie bijlagen
Eendraadsschema - referentie	Wuyts
Eendraadsschema - versie	0.2
Eendraadsschema - datum	13/12/2021
Eendraadsschema	Zie bijlagen

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	Ok
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Ok
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	P.A.

Metingen en beproevingen

Spreadingsweerstand van de aardverbinding (Ω)	5.1
Waarde van het algemeen isolatieniveau (M Ω)	4.09
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

Afronding van de controle

- Zwembad installatie is afgekoppeld voor deze controle

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 5/1/2047.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie was reeds verzegeld.



Ing. J. Windey

Directeur-generaal Vincotte

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Foto situatieplan (1/4)

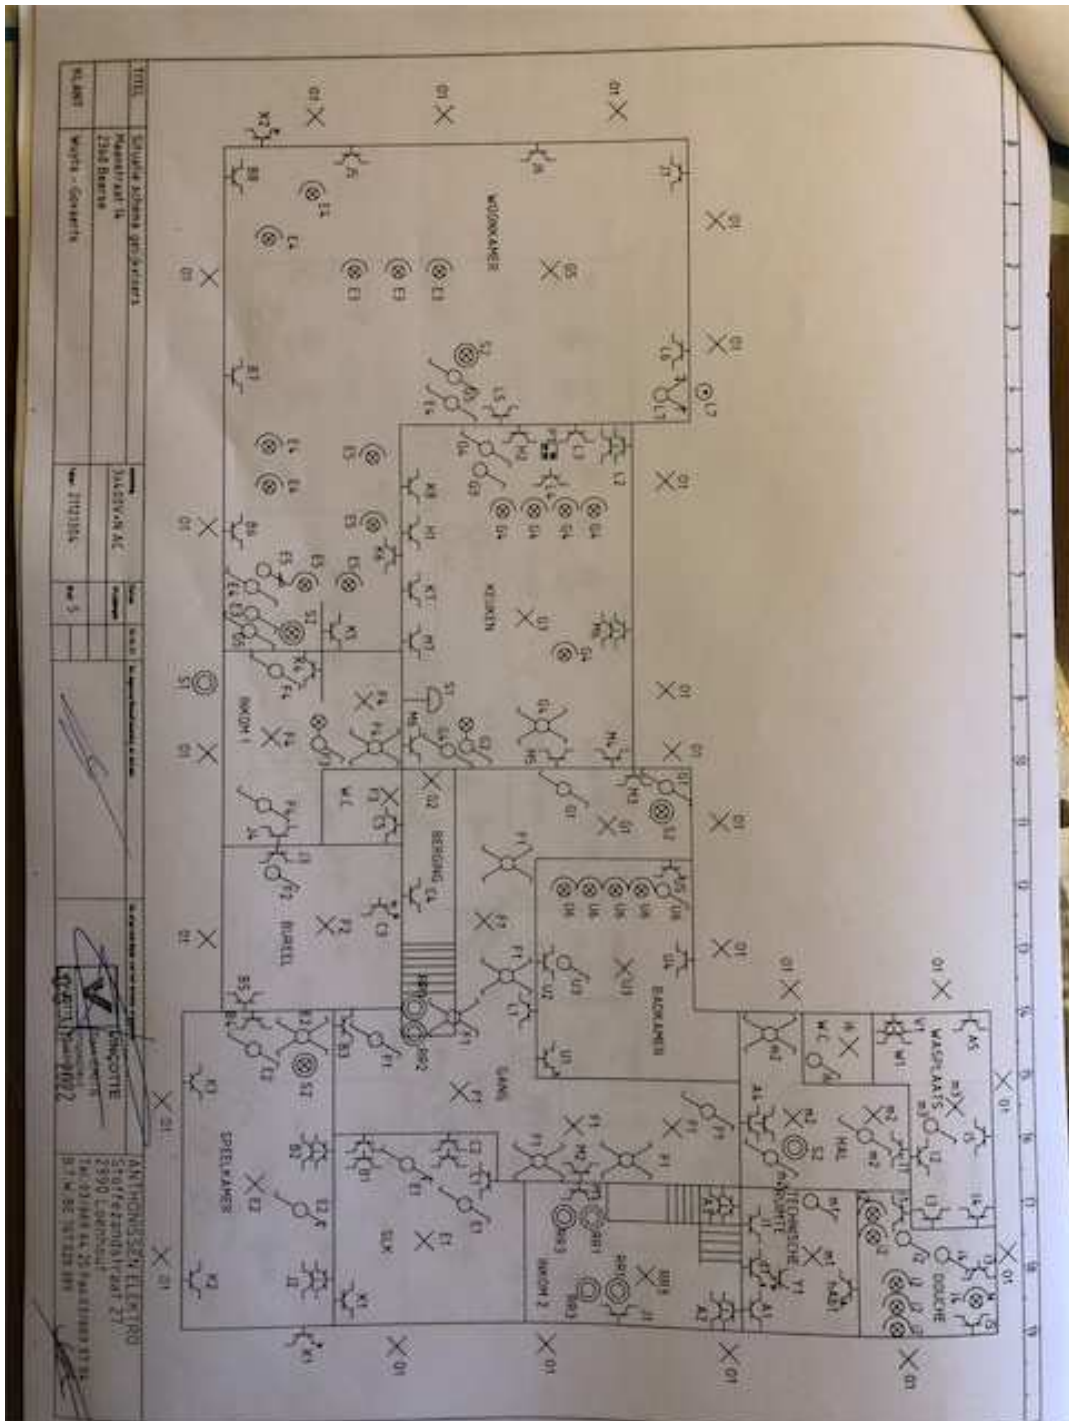
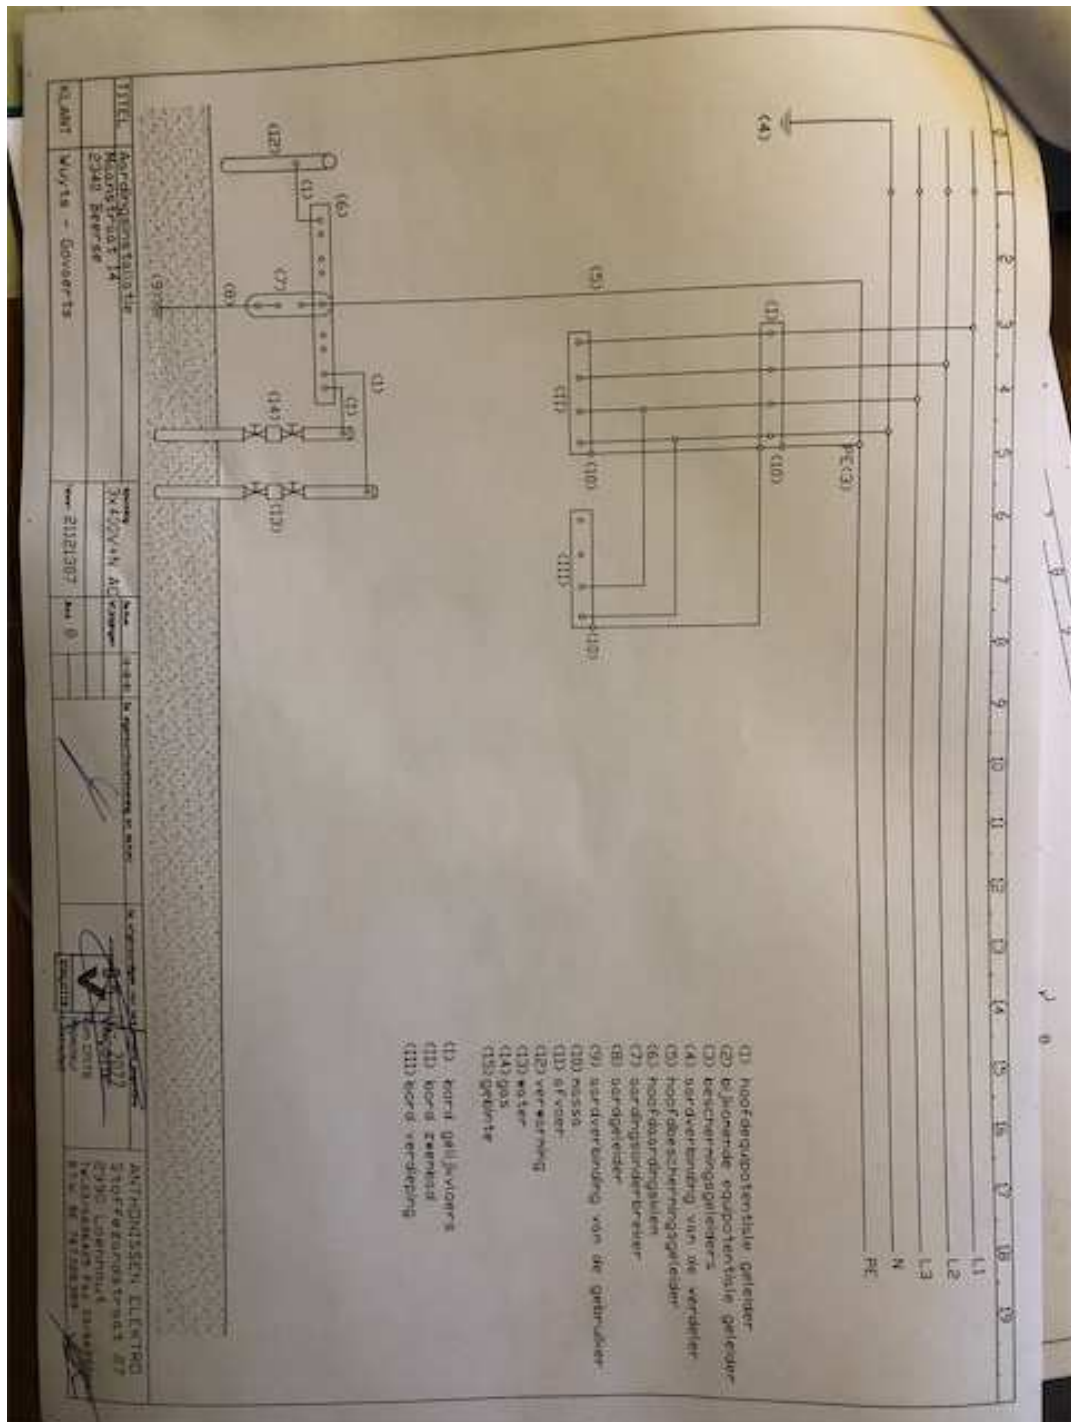


Foto situatieplan (2 / 4)



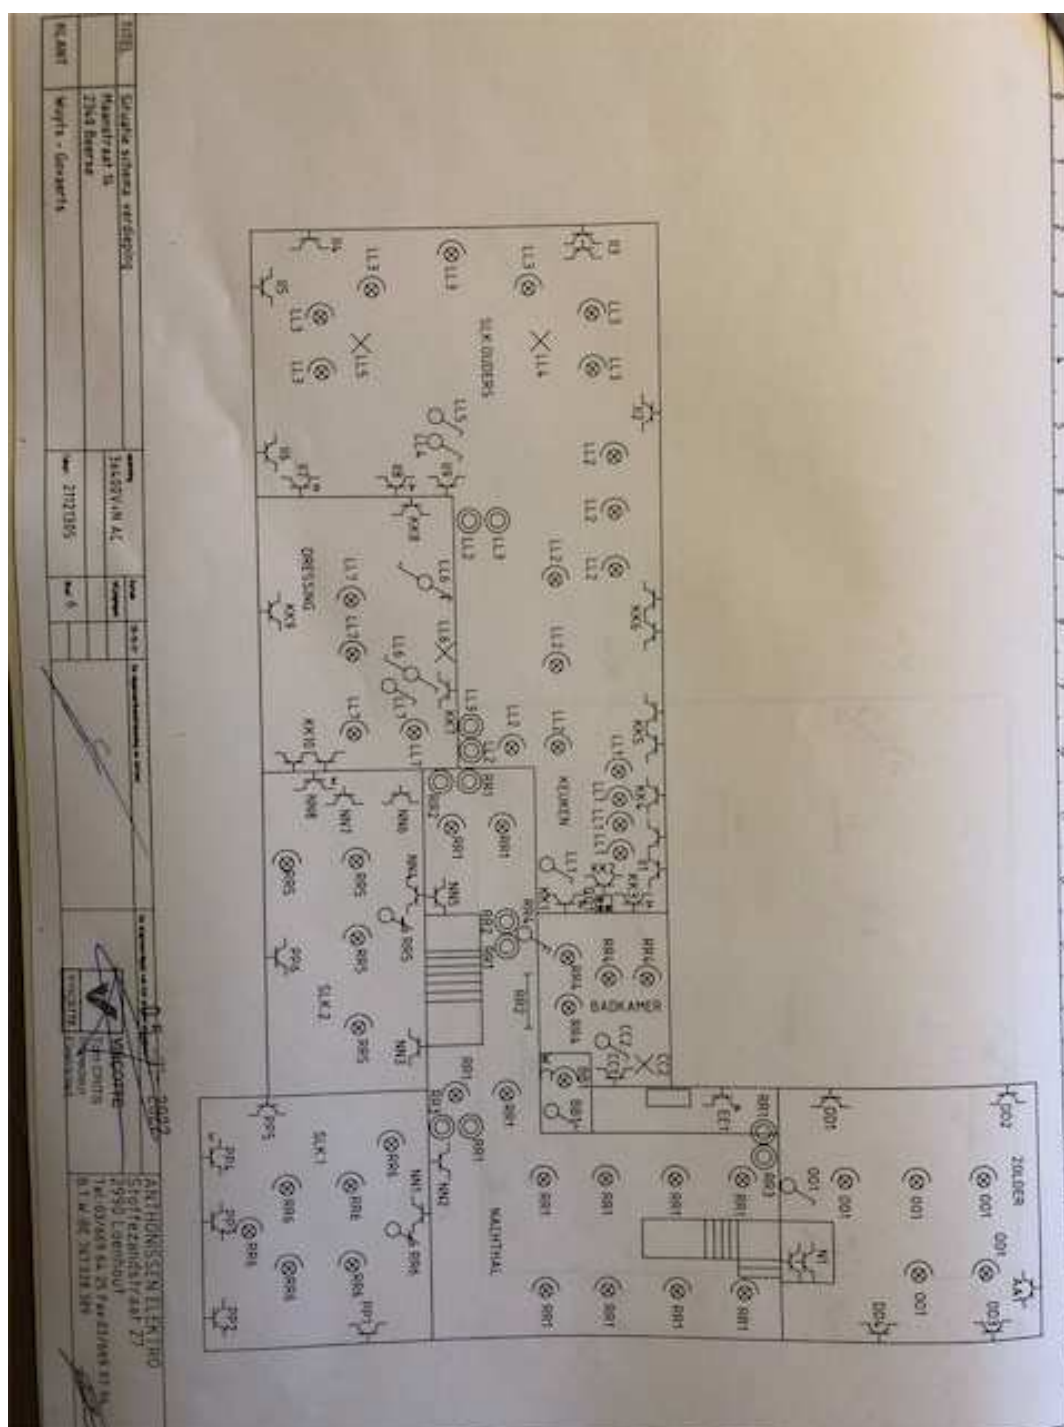


Foto situatieplan (4 / 4)

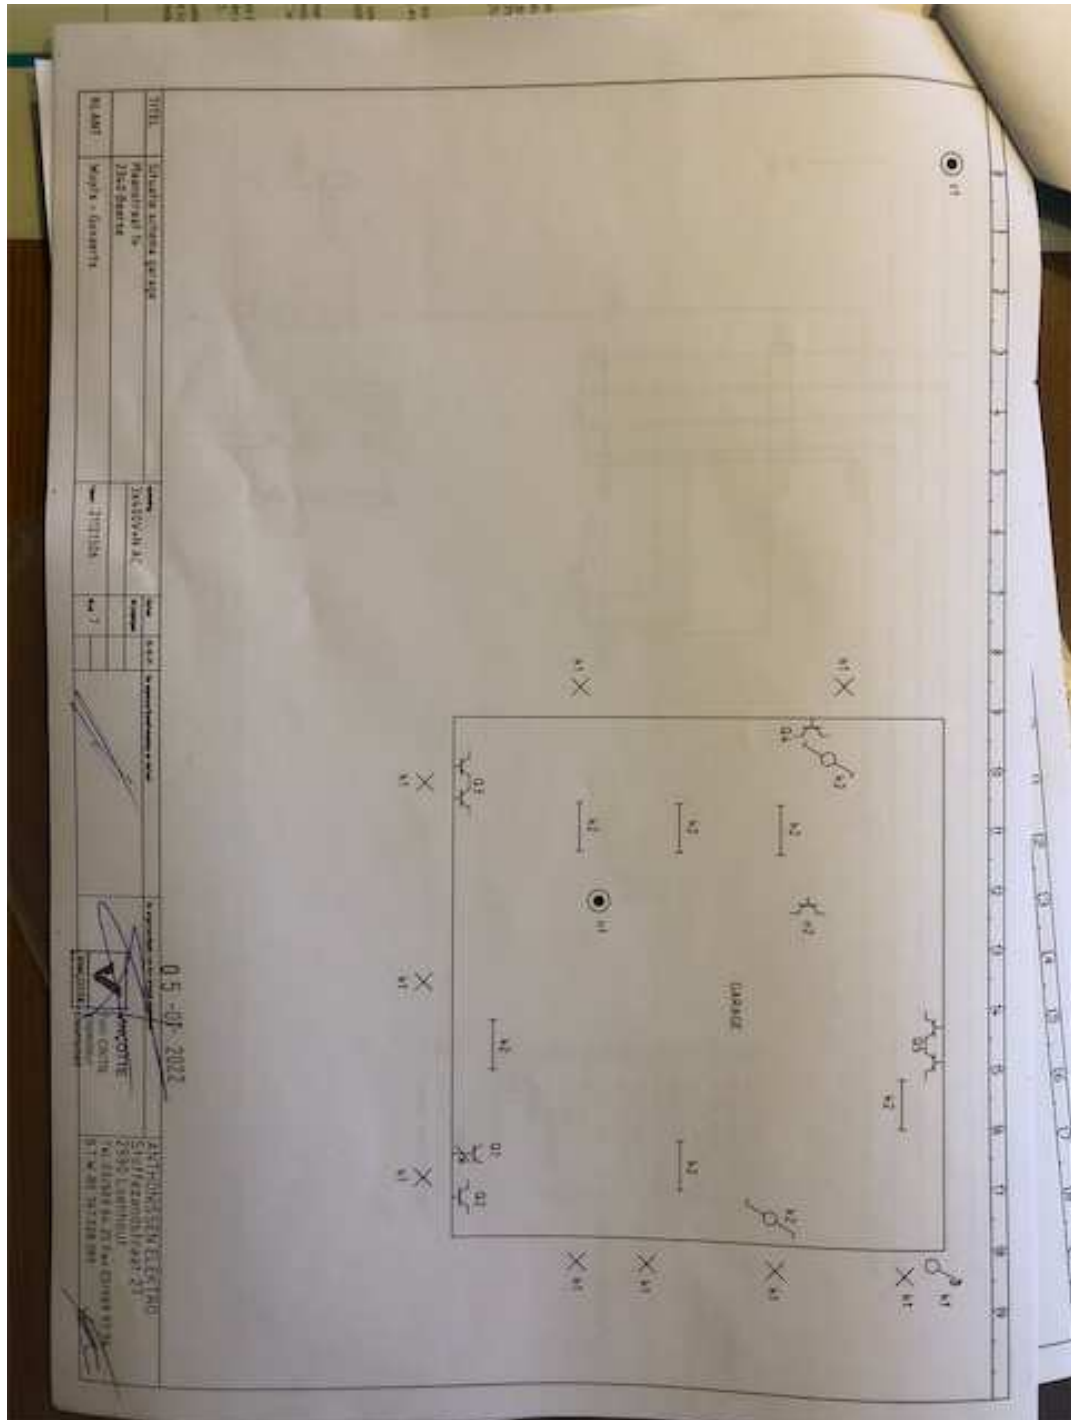


Foto van de eendraadschema's (1/4)

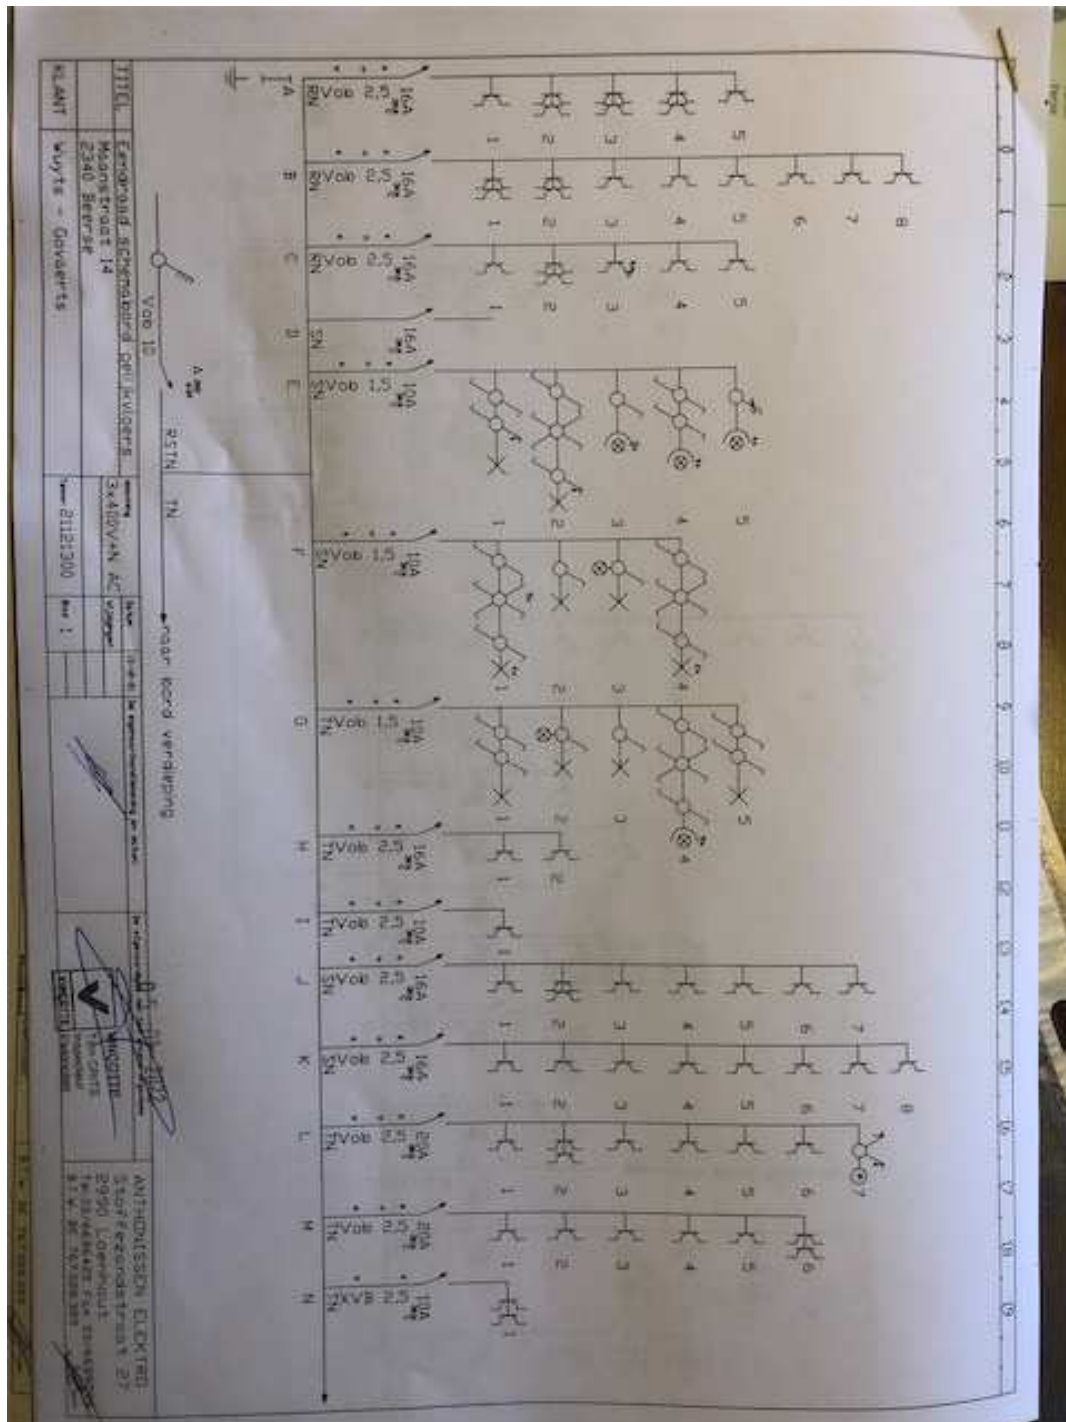


Foto van de eendraadschema's (2 / 4)

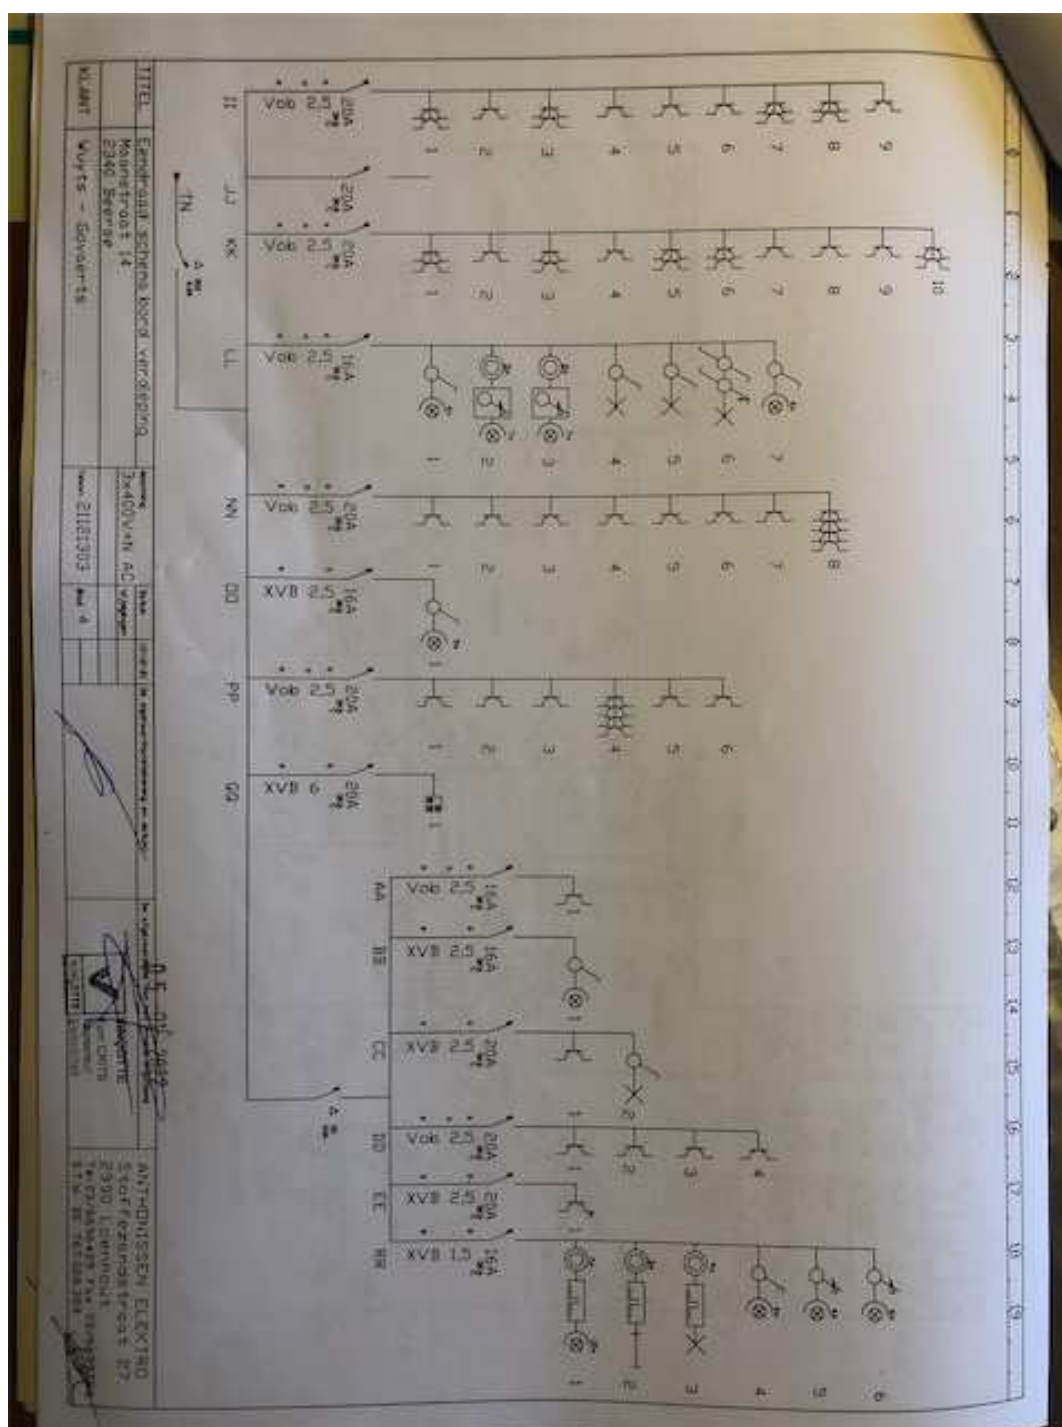


Foto van de eendraadschema's (3 / 4)

