

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 25/10/2023

Inspecteur: Christophe Sterckx

Mentor:

Installateur:

ID-label:

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251355

Datum verslag: 02/11/2023

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1314303

Plaats van het onderzoek

Straatnaam KABERG
Huisnummer 5
Busnummer
Postcode 3090
Gemeente OVERIJSE
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: -

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 23


Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 1,20 MΩ

RE: 12,56 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	25	Pv	2	4
1	C	40	Rem	4	6
1	C	25		4	6
14	C	20		2	2,5
1	C	20	Reserve	2	-
1	C	16		2	2,5
2	C	16		2	1,5
1	C	16	Reserve	2	-
1	C	6	Reserve	2	-

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 25/10/2048
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Christophe Sterckx

Christophe Sterckx
ACEG VZW - #260

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 25/10/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.






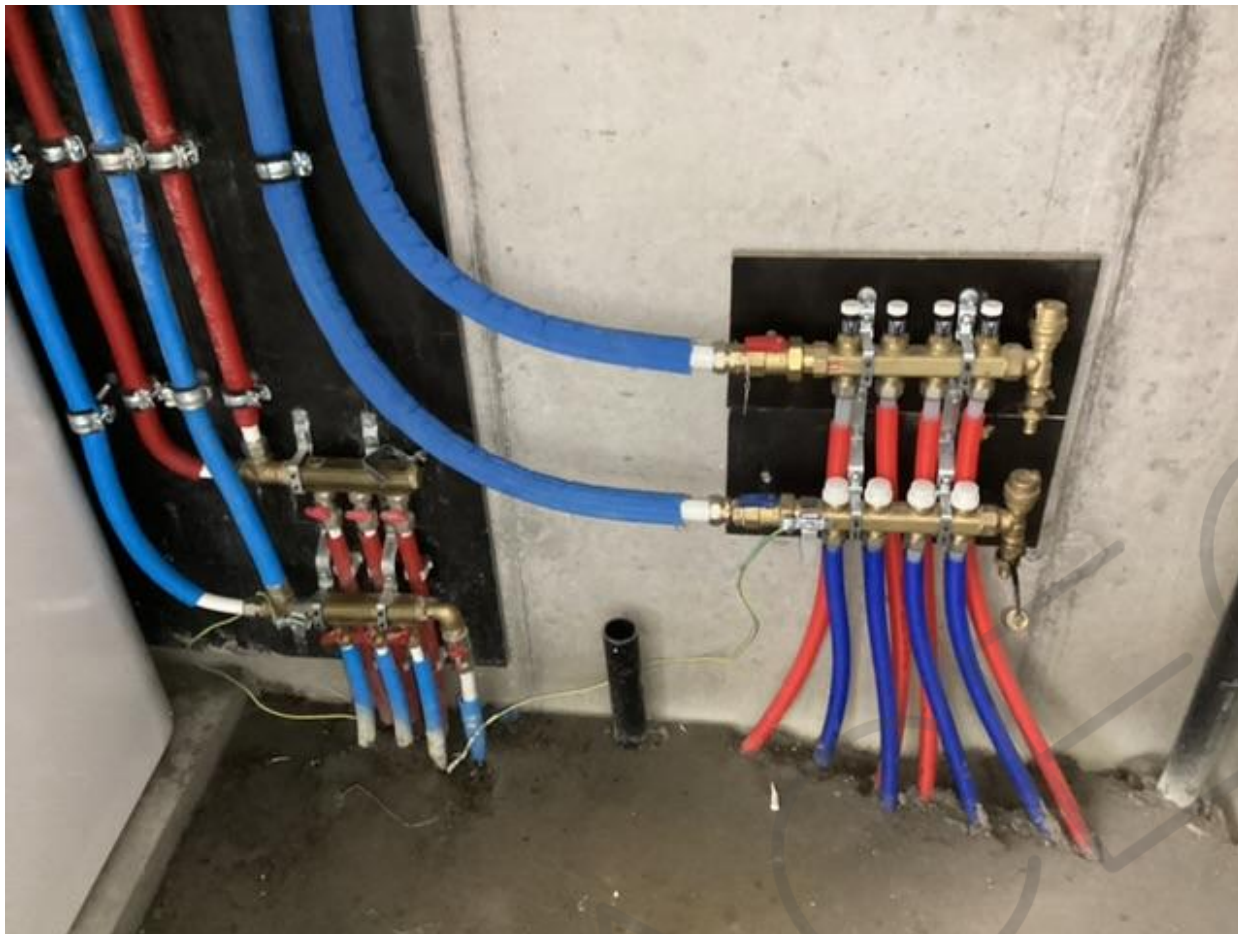








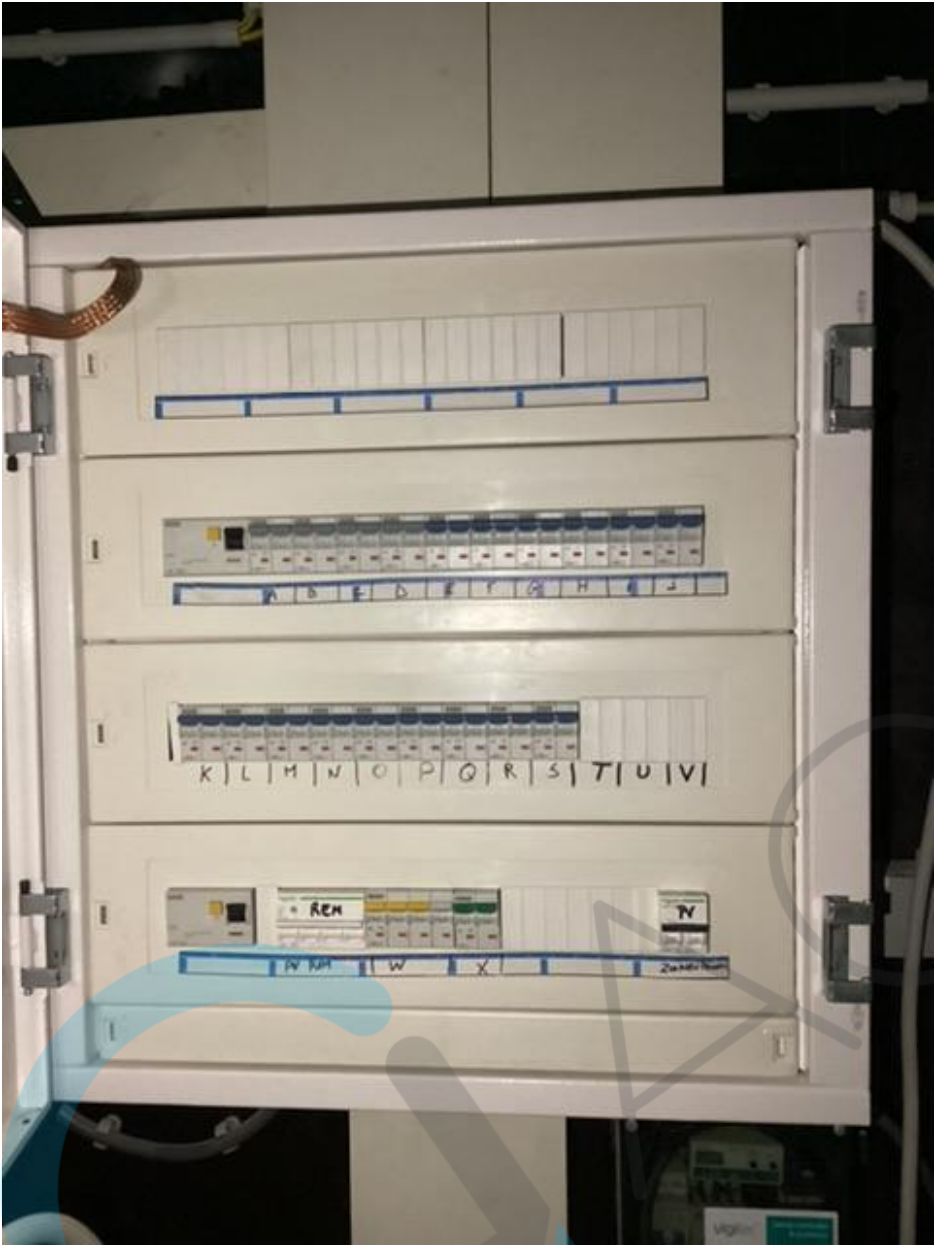







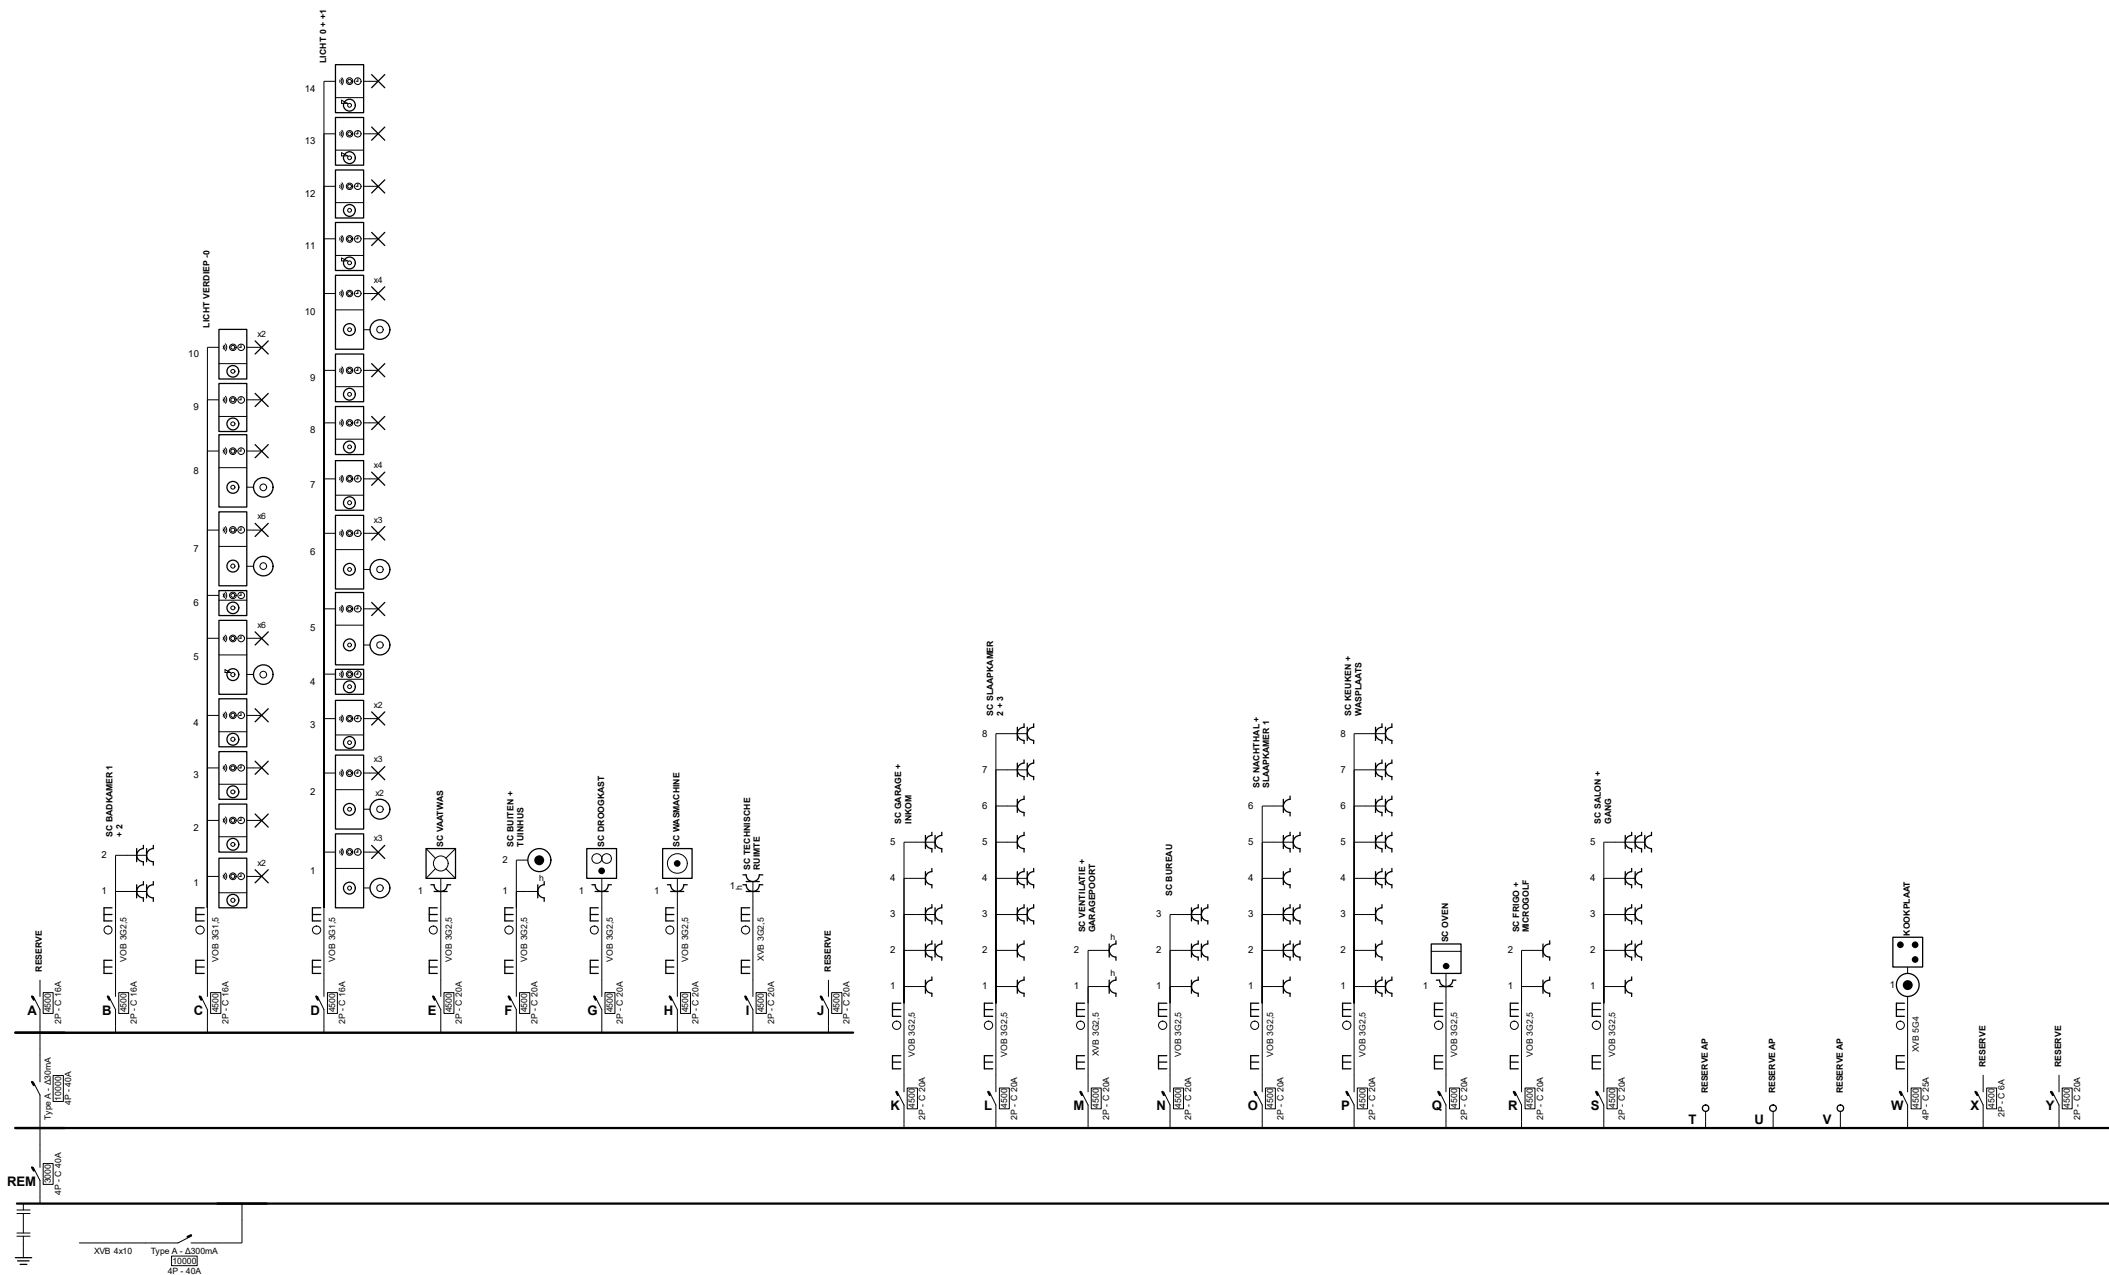

25/10/2023

Plaats van de elektrische installatie


Installateur
IDEM KLANT

p. 1/7
Eendraadschema

Datum: 31/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: EASYKIT-Slimme Zelfbouw - BTW BE 0453.767.582




QACEG
Christophe Sterckx

25/10/2023

Installateur
IDEM KLANT


p. 2/7
Eendraadschema

Datum: 31/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: EASYKIT-Slimme Zelfbouw - BTW BE 0453.767.582

Verdieping -1

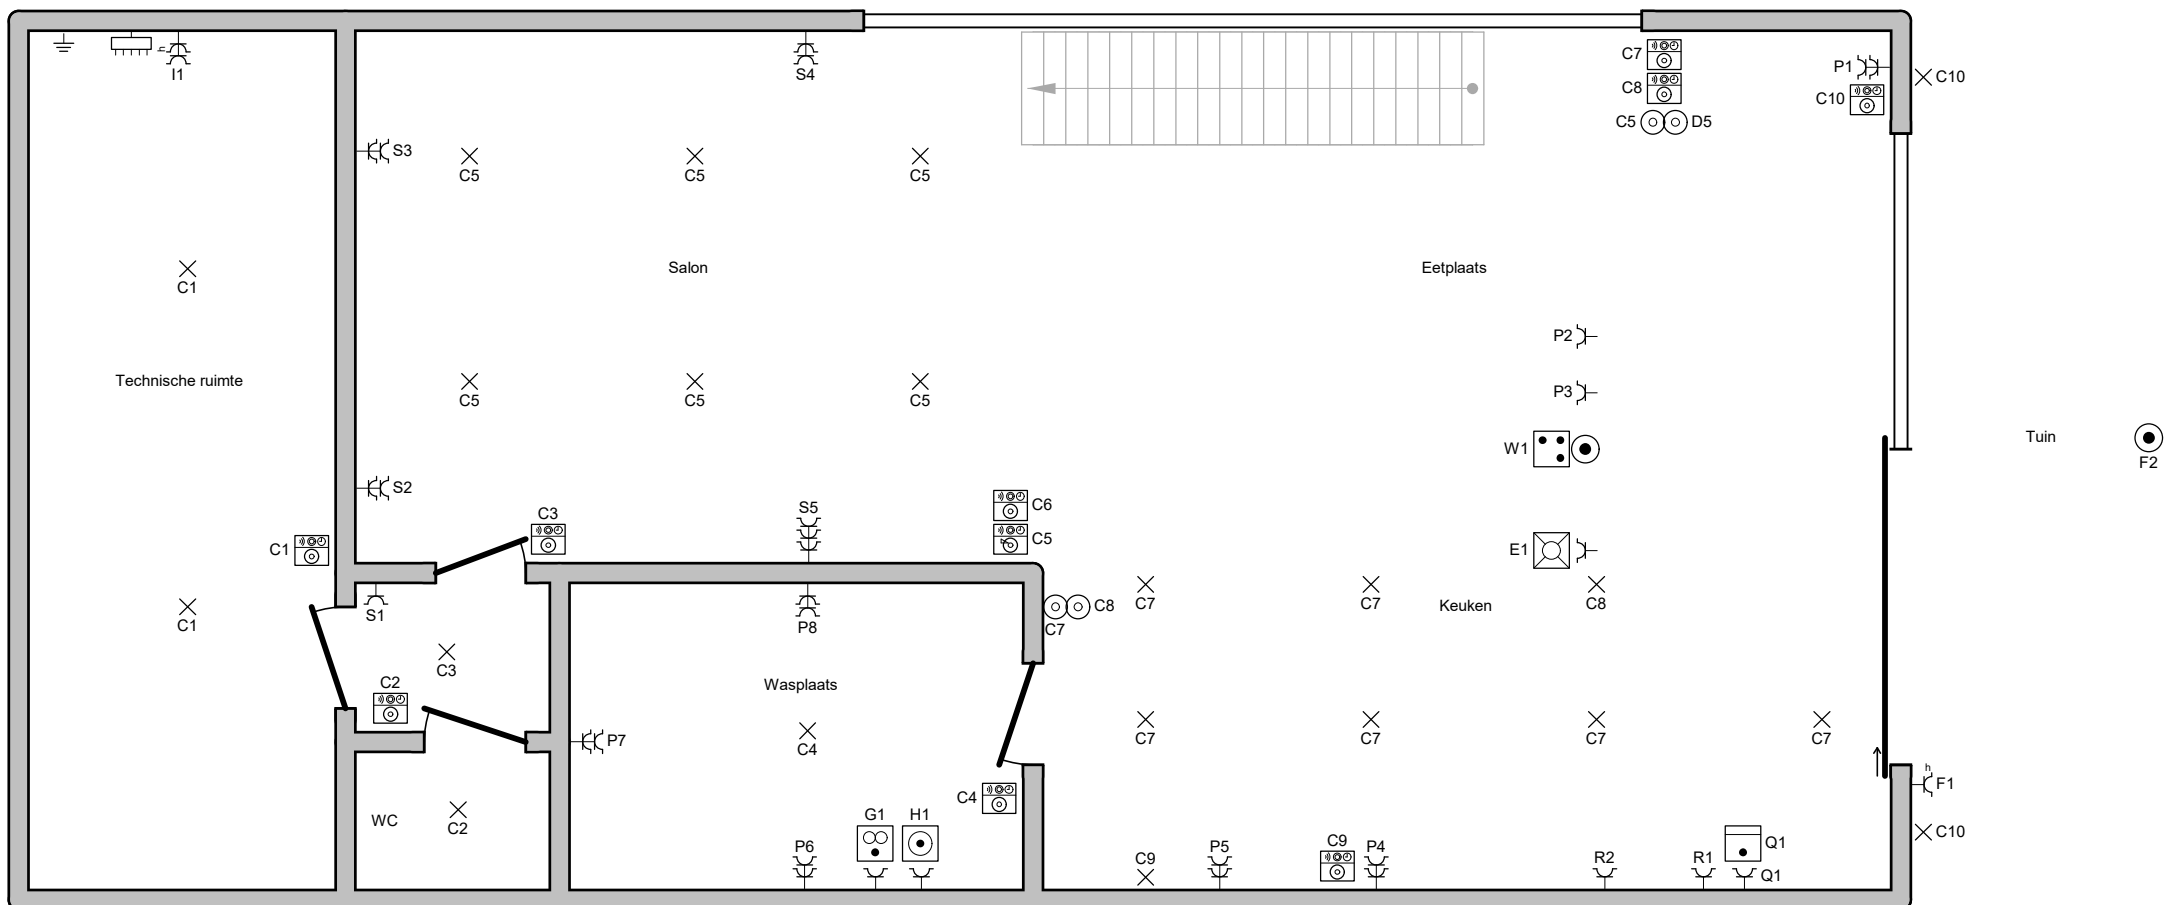


ACEC
 Christophe Sterckx

25/10/2023

Installateur
 IDEM KLANT


p. 3/7
Situatieschema

Datum: 31/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: EASYKIT-Slimme Zelfbouw - BTW BE 0453.767.582

Verdieping 0

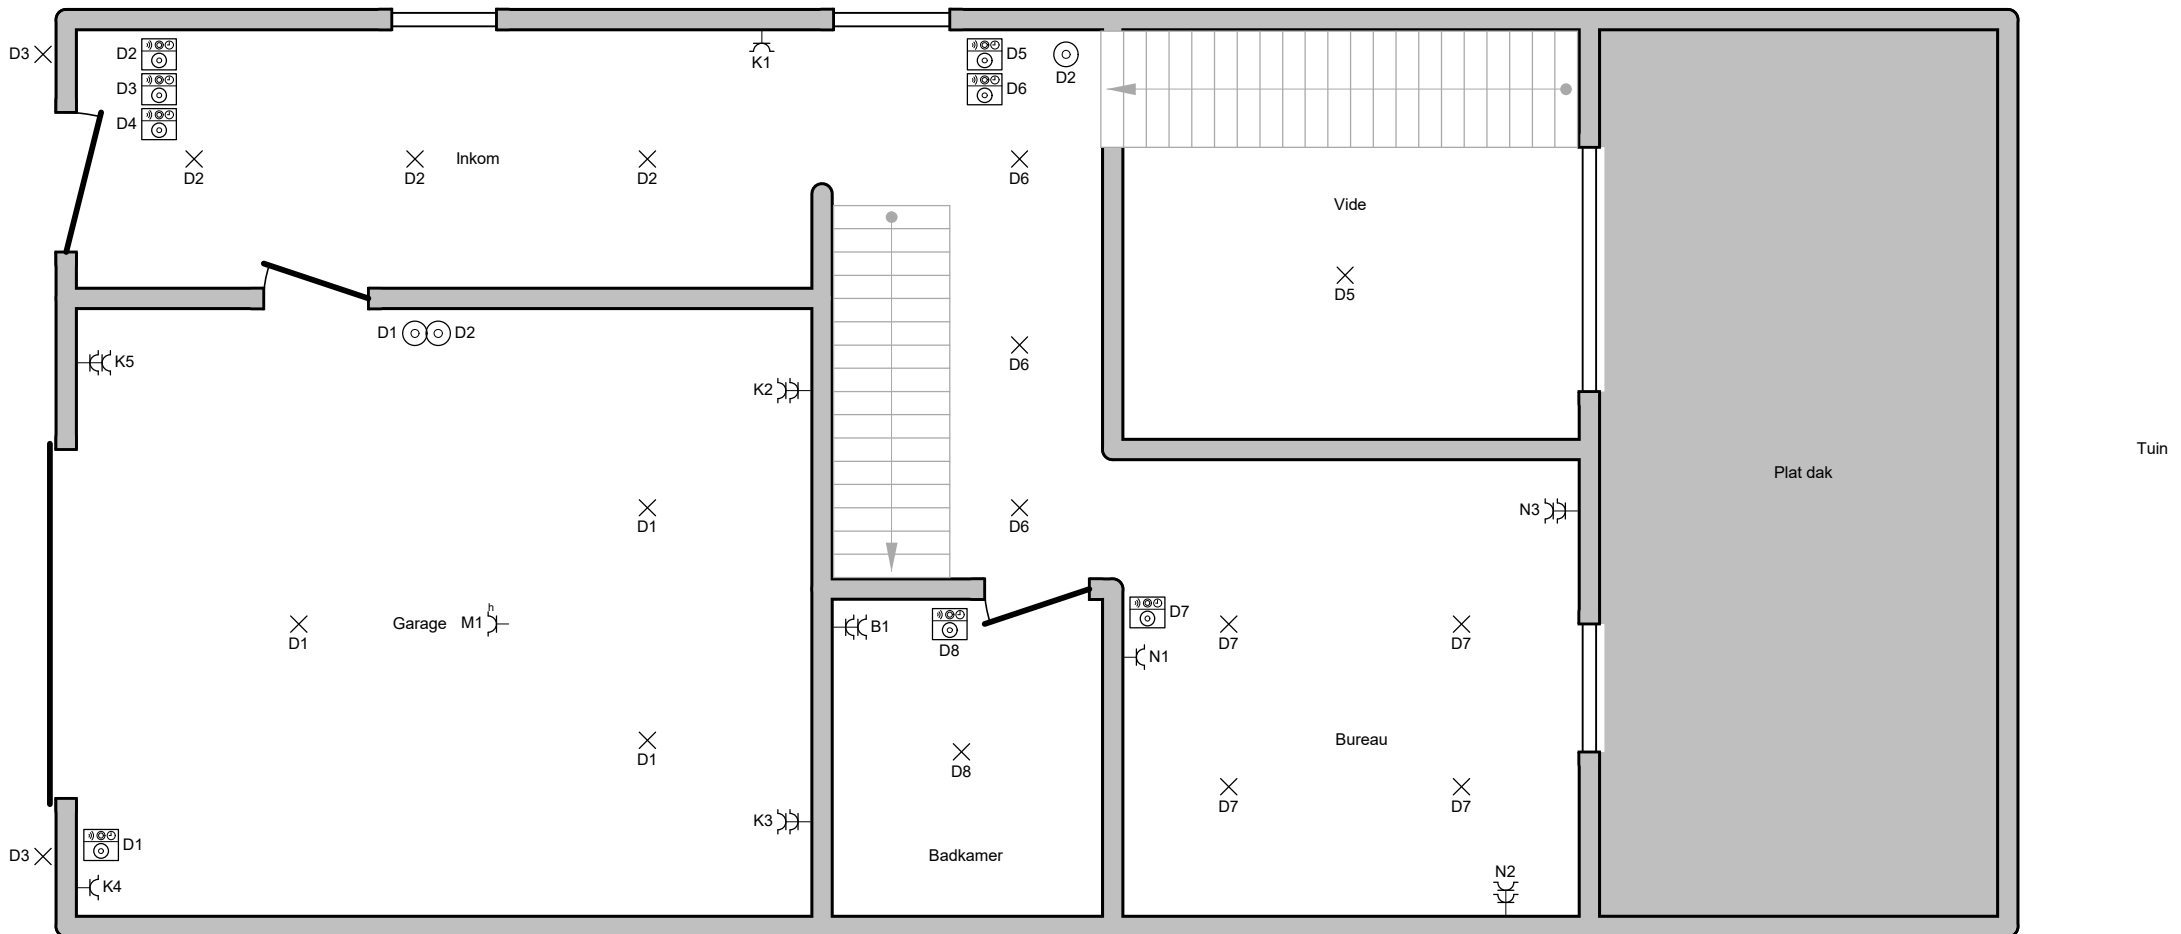


25/10/2023

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
IDEM KLANT


p. 4/7
Situatieschema

Datum: 31/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: EASYKIT-Slimme Zelfbouw - BTW BE 0453.767.582

Verdieping +1

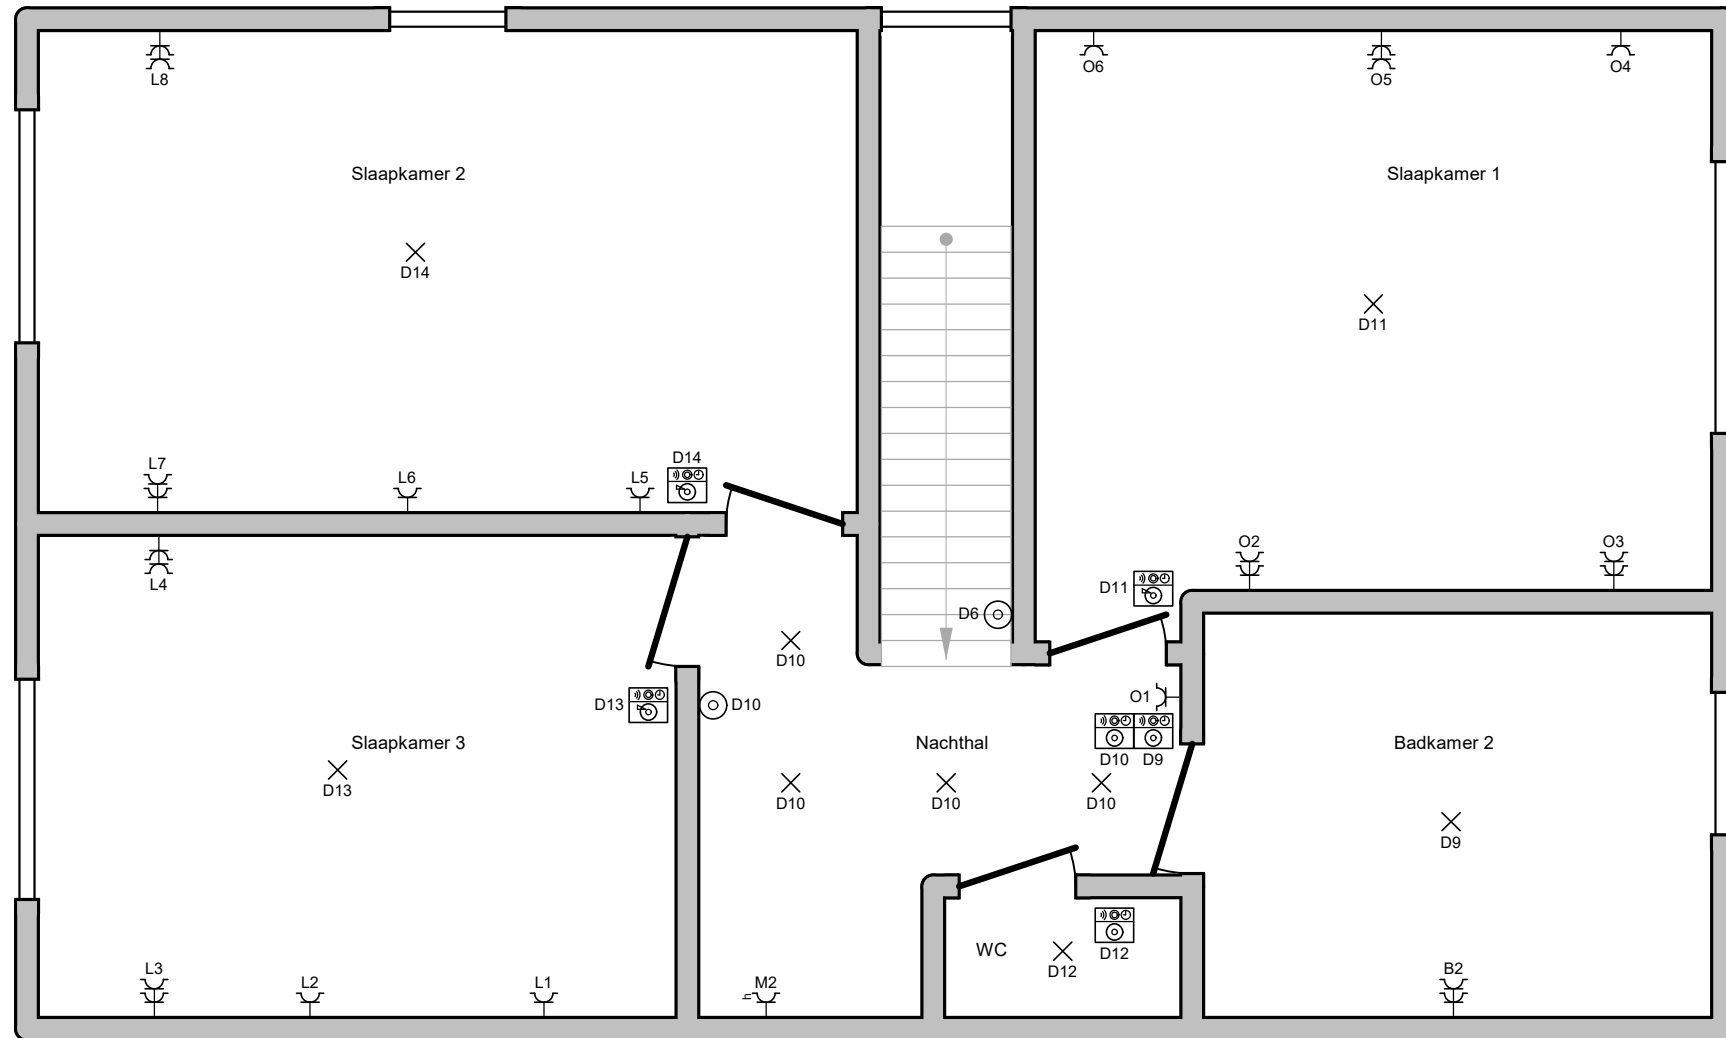


25/10/2023

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
IDEM KLANT


p. 5/7
Situatieschema

Datum: 31/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: EASYKIT-Slimme Zelfbouw - BTW BE 0453.767.582

Verdieping +2



 QACEG
Christophe Sterckx

25/10/2023

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
IDEM KLANT

p. 6/7
Situatieschema

Datum: 31/10/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: EASYKIT-Slimme Zelfbouw - BTW BE 0453.767.582

REM	
A	RESERVE
B	SC BADKAMER 1 + 2
C	LICHT VERDIEP -0
D	LICHT 0 + +1
E	SC VAATWAS
F	SC BUITEN + TUINHUS
G	SC DROOGKAST
H	SC WASMACHINE
I	SC TECHNISCHE RUIMTE
J	RESERVE
K	SC GARAGE + INKOM
L	SC SLAAPKAMER 2 + 3
M	SC VENTILATIE + GARAGEPOORT
N	SC BUREAU
O	SC NACHTHAL + SLAAPKAMER 1
P	SC KEUKEN + WASPLAATS
Q	SC OVEN
R	SC FRIGO + MICROGOLF
S	SC SALON + GANG
T	RESERVE AP
U	RESERVE AP

V	RESERVE AP
W	KOOKPLAAT
X	RESERVE
Y	RESERVE
Z	RESERVE
PV	ZONNEPANELEN

Plaats van de elektrische installatie	Installateur IDEM KLANT	p. 7/7 Lijst Kringen
		Datum: 31/10/2023
		3 x 400V + N ~ 50Hz
Schema's getekend door: EASYKIT-Slimme Zelfbouw - BTW BE 0453.767.582		
