



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 14K 171130

Ref. verslag RAP BD 20151005-2B



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	SHM DENDERSTREEK		Voornaam		Postnr	9470
Adres	DREEF 27		Gemeente	DENDERLEEUEW		
Installateur	CORNELIS FILIP ELECTRO		Gemeente	DEINZE		
BTW-nummer	BE 0583.868.734					
of identiteitskaartnr.			Gemeente			
Plaats van onderzoek			Postnr.	9470		
Adres			Gemeente	DENDERLEEUEW		
EAN-code			Elektriciteits verdelers			
Type installatie	aansluiting voor werf / festiviteiten appartement, andere		☐ huishoudelijke werkenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid			
Algemene beschrijving van de aansluiting						
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	2x	2P AUT 16A - 1,5mm ²			
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	3x	2P AUT 20A - 2,5mm ²			
I _{nom} aansluiting (A)	40A MAX	1x	2P AUT 32A - 6mm ²			
Type alg. schakelaar	ALG. DIFF	VIA 2P DIFF 30mA				
Aantal borden	1	6x	2P AUT 20A - 2,5mm ²			
Aantal eindstroombanen	12					
Type aardelektrode	LUS					
Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A 300mA					
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA					
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :						
Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01						
Aardspreidings- weerstand :	2Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 0,5MΩ	Werking differentieel- stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot. : OK / NOK
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
Inbreuken :	GEEN					
Opmerkingen: - VERLICHTING, KEUKEN, BADKAMER NIET GEPLAATST/AFGEWERKT						
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP BD/20150922-1M						

Besluit


- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- ☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controle-
bezoek uiterlijk op:

05.10.2040

Agent-onderzoeker
(naam - nr -
handtekening)

B. DECAESTECKER



Datum
onderzoek:

05.10.2015

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 14K 171130

Ref. verslag

RAP BD 20151005-2B



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	SHM DENDERSTREEK		Voornaam		Postnr	9470
Adres	DREEF 27		Gemeente	DENDERLEEUV		
Installateur	CORNELIS FILIP ELECTRO		Gemeente	DEINZE		
BTW-nummer	BE 0583.868.734					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
Plaats van onderzoek			Postnr.	9470		
Adres			Gemeente	DENDERLEEUV		
EAN-code			Elektriciteits verdelers			
Type installatie			☐ huishoudelijke werkzaamheden	☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid		

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	2x	2P AUT 16A - 1,5mm ²
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	3x	2P AUT 20A - 2,5mm ²
I _{nom} aansluiting (A)	40A MAX	1x	2P AUT 32A - 6mm ²
Type alg. schakelaar	ALG. DIFF	VIA 2P DIFF 30mA	
Aantal borden	1	6x	2P AUT 20A - 2,5mm ²
Aantal eindstroombanen	12		
Type aardelektrode	LUS		
Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A 300mA		
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat :	apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :	procedure TD-E-01
Aardspreidings- weerstand :	2Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 0,5MΩ	Werkings differentieel- stroominrichting :
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)			OK / NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot. :
				OK / NOK


Inbreuken :	GEEN
Opmerkingen:	- VERLICHTING, KEUKEN, BADKAMER NIET GEPLAATST/AFGEWERKT

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP BD/20150922-1M


Besluit
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controle- bezoek uiterlijk op:	05.10.2040	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	B. DECAESTECKER insp. J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (143) DECAESTECKER Brecht	Datum onderzoek:	05.10.2015
---	------------	--	---	---------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

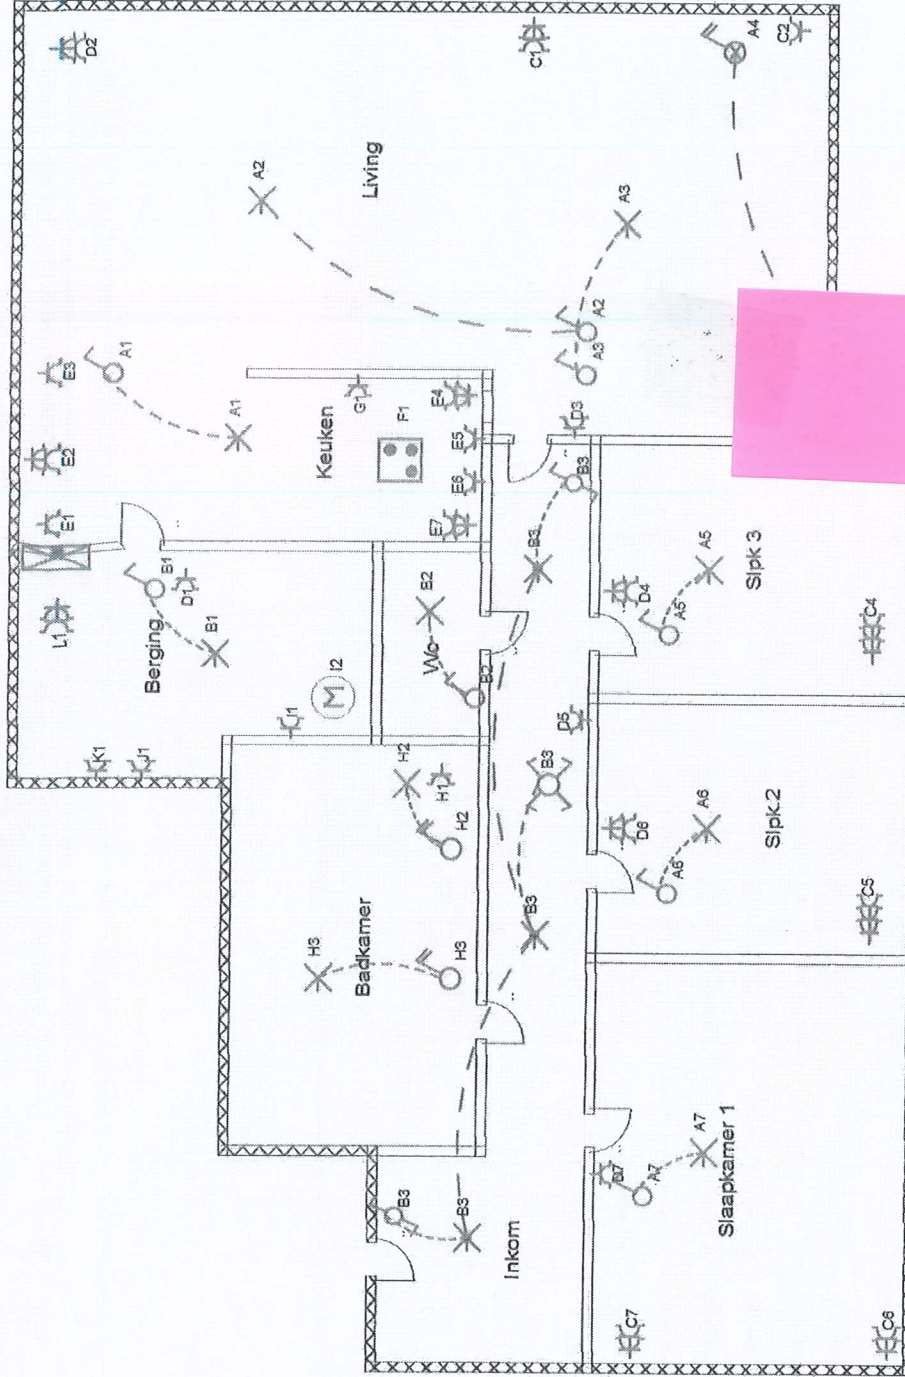

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Situatie	
Naam	Electro Cornelis Filip	ORGANIS.	Van Helden vzw	Naam		1N 230V	
BTW	0583.888.734	Naam	De Groot vzw	Straat		aan rechts verdiep	
Datum	21/09/2015	Datum	22/09/2015	Gemeente			
Handtekening	Cornelis Filip	Handtekening	inspecteur (143)	Handtekening			

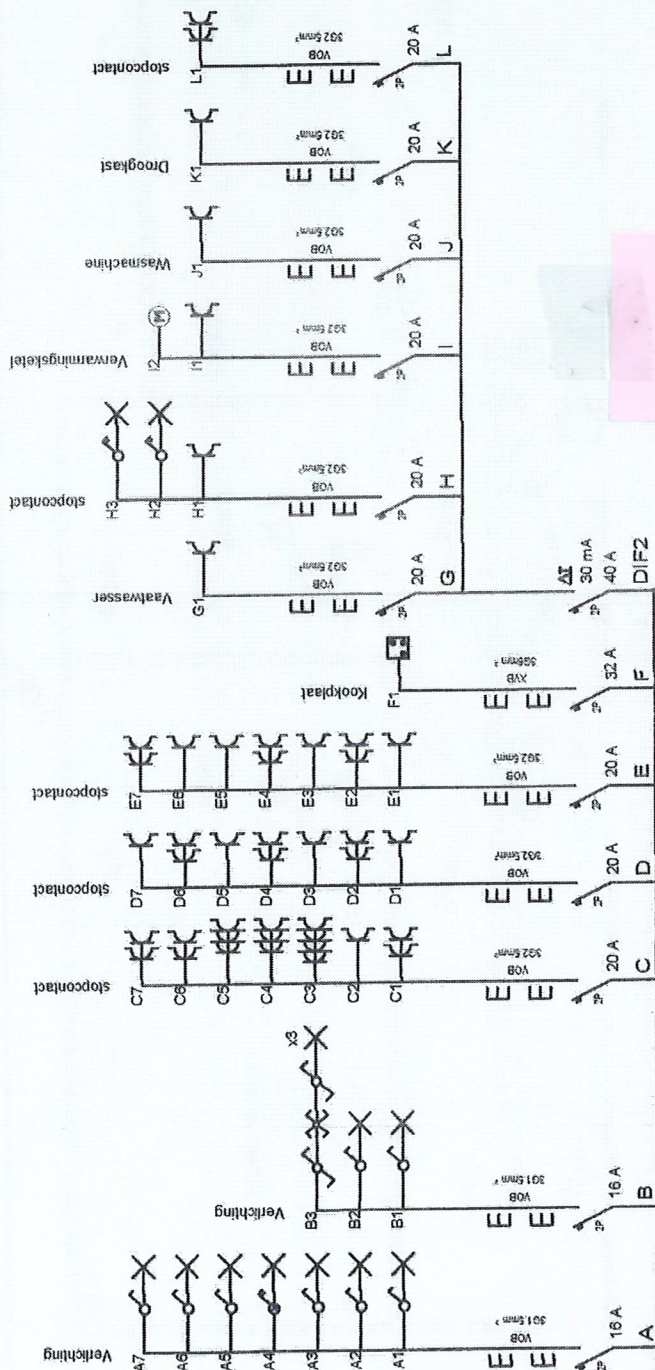

5. OKT 2015

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema 1A		1N 230V
Naam	Electro Cornelis Filip	ORGANIS.	Van Hamelen vzw	Naam	St-	aan rechts verdiep		
BTW	0583.668.734	Naam	Deceuninck	Straat	Dr			
Datum	21/09/2015	Datum	22/09/2015	Gemeent	94			
Handtek	Cornelis Filip	Handtek	inspecteur (143)	Handtek	..			
