

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

0494/52402

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N°:

02440105/02

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

18 Rue du
Volendrieme 4100 Kure 5° Kure

Adresse :

TVA ou CI:

BE 0445 127352

EAN :

Ref.:

Index :

Compteur n°:

Date du contrôle :

5/01/2011

Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 26.2008) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux :

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension

230 V II

Protection raccordement

40

Câble aliment, tableau, princ. :

4 X 10 mm²

Inter.gén. : type

63A 0,3A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma TT

Nombre de tableaux :

2

Nombre de circuits term.:

22

RA :

22

Ohm; RI tot

20

MOhm

Facteurs d'influences externes :

DESCRIPTION :

63A 0,3A - Tout - 1A → 0

40A 0,03A - Tout - 1A → 6

Voir schémas ci-joints RGIE 1997

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

Note : Appareils de chauffage non
placés dans la SdB. (Vérifier !)

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION :

1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 5/01/2036 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

Le directeur,




Page 1/4 - Schéma de position rez-de-chaussée

Page 2/4 - Schéma de position 1 er étage

Page 3/4 - Schéma unifilaire coffret I (hall entrée)


Page 4/4 - Schéma unifilaire coffret II(garage)


Coordonnées installateur	Coordonnées client	Coordonnées de l'organisme agréé			
D.D.S Eis D'ALONZO Sergio & Fils Rue des Hamendes, 131 6040 Jumet Tél. : +32 (0) 71.397.008 N° Ent.: BE 0715.127.352			Modifié le	Description	Dessiné par
			29/12/2010	Plan de l'installation réalisée	D'Alonzo Samûel
			04/01/2011	Contrôle et vérification plans	D'Alonzo Sergio

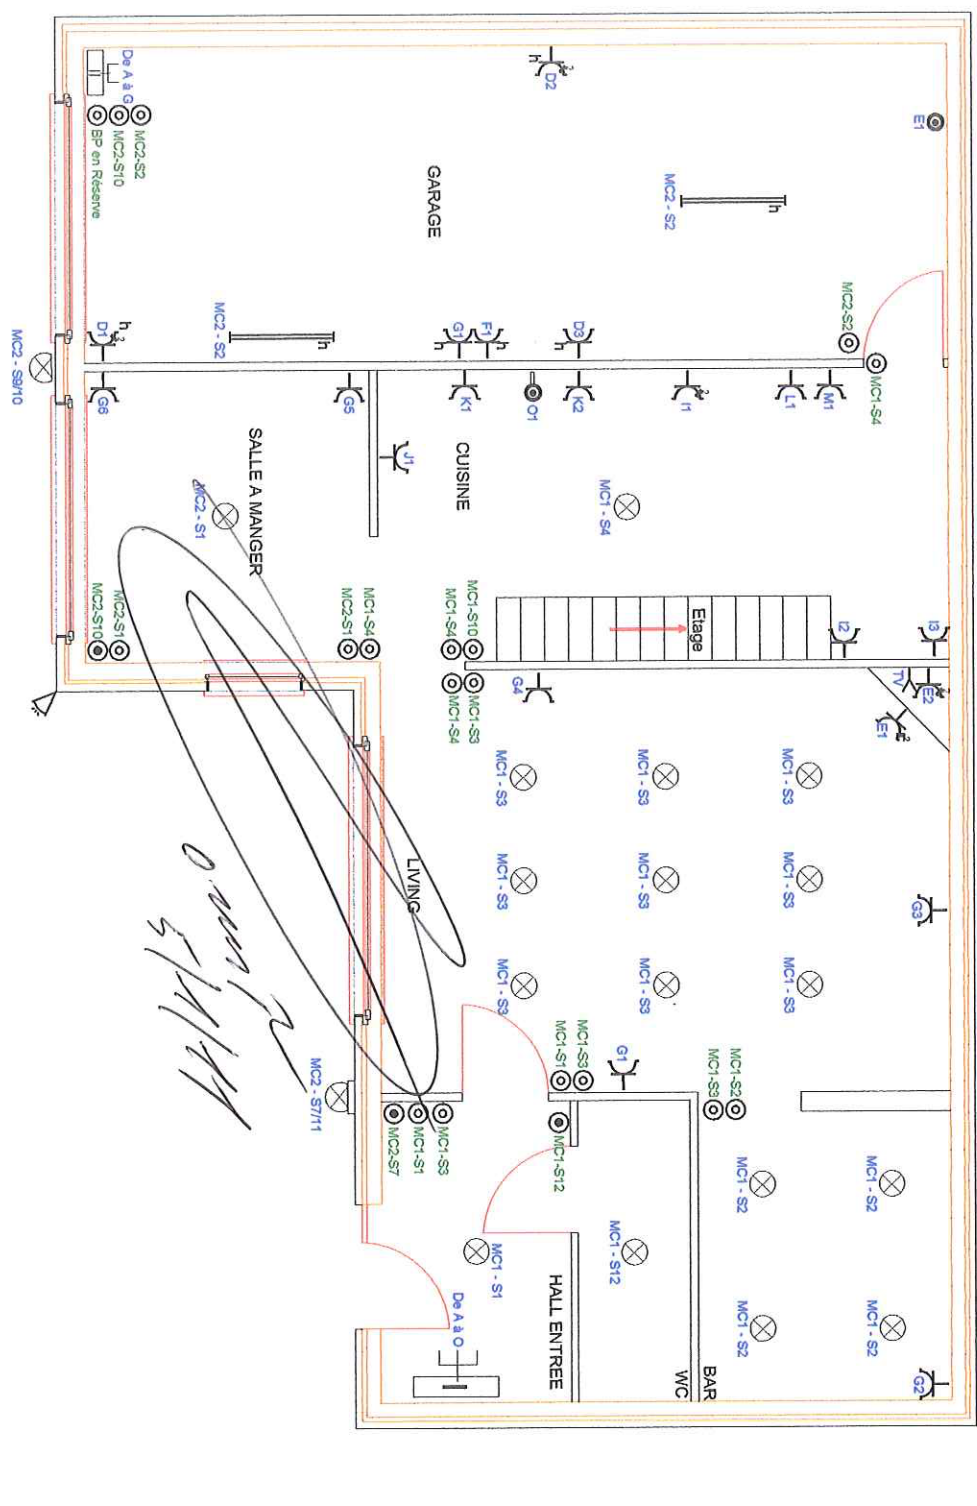

Le représentant de l'organisme agréé,	Le Client ou son représentant,	D.D.S. Ets D'Alonzo Sergio & Fils Rue des Hamendes, 131 6040 Jumet Tél.: +32(0)71.397.008 N° Ent.:BE 0715.127.352
...../...../.....		/...../.....

Page	Désignation folio	Tension de service
2 / 4	Schéma de Position 1 er étage	230 V-1~

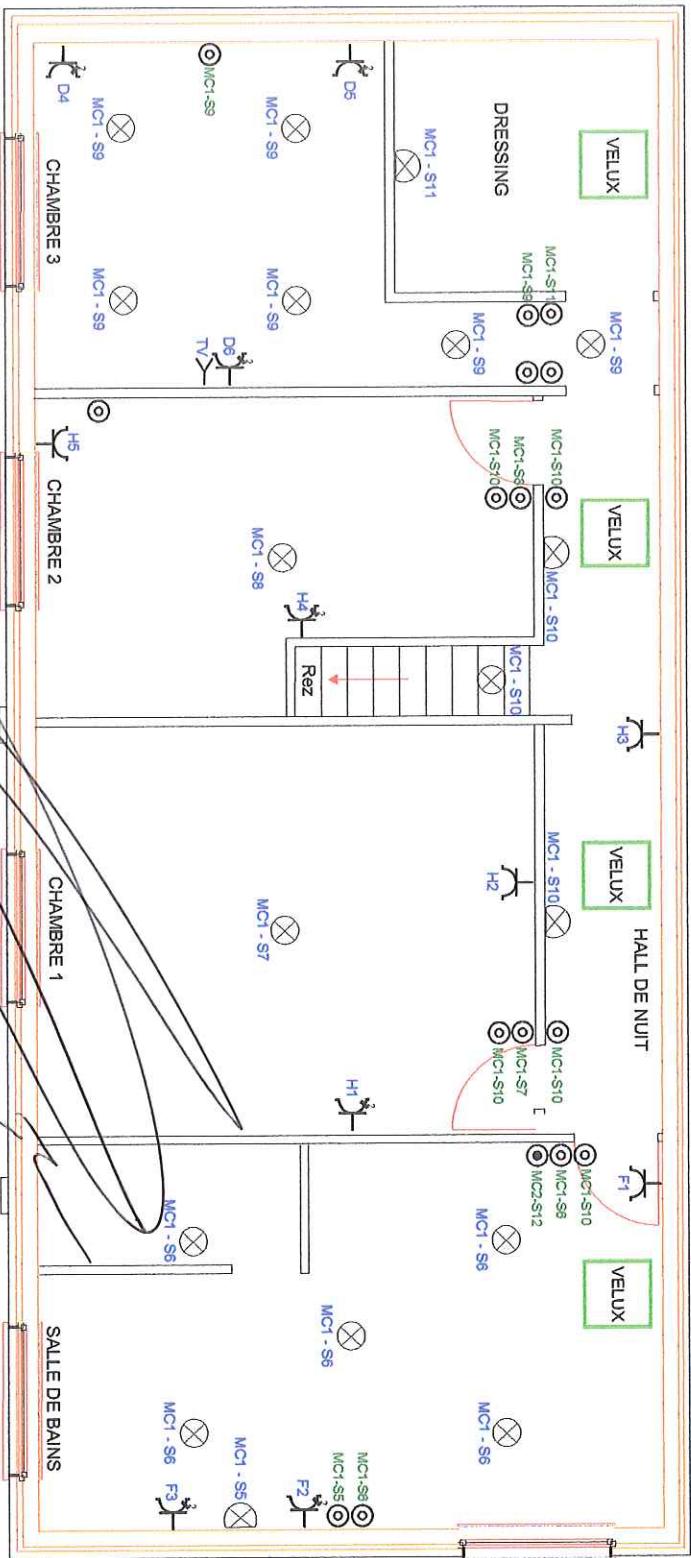

Le représentant de l'organisme agréé,	Le Client ou son représentant,	D.D.S
...../...../.....		Ets D'Alonzo Sergio & Fils Rue des Hamendes, 131 6040 Jumet Tél.: +32(0)71.397.008 N° Ent.:BE 0715.127.352/...../.....

