



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Verslag nr.:

50.60.837.379/006



N 322481

Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam:	Naam, voornaam:	Adres:
		Post nr. + Stad:
Ident. Kaart nr.:		Tel.:
BTW nr.: BE		

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaaring	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	541448860018992087	☐ EAN niet meegegeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.:			☐ kWh excl. nacht meter:
	Bescherming aansluiting (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100		nr.:
	Ontworpen voor U _N :	☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V		Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100		☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord:	4 X 10 mm ² - Type: XVB		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting:	40 A 1300 mA	Aantal borden:	Aantal eindstroombanen:
☐ zie bijlage(n)				

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 6,4 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: 1 MΩ	☐ Controle foutius	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil	
Opmerkingen	☐ Nihil	Visum DNB of aangesteide:

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Lekeys Agent nr.: 5438 Datum: 15/10/2019

Bijlage(n): ☐ Situatieschema(s): 1 ☐ Eéndraadsschema(s): 2

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

15/10/2019

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal: Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(* De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Alg. Electriciteit
VEKEMAN MARNIK

Stationstraat 31 app gelijk Rechts

9420 Erpe -Mere

220v

Handtekening verantw. v/h werk

aarding


Handtekening eigenaar

I.O.

Handtekening verantw. v/d erkende keuringsorg.

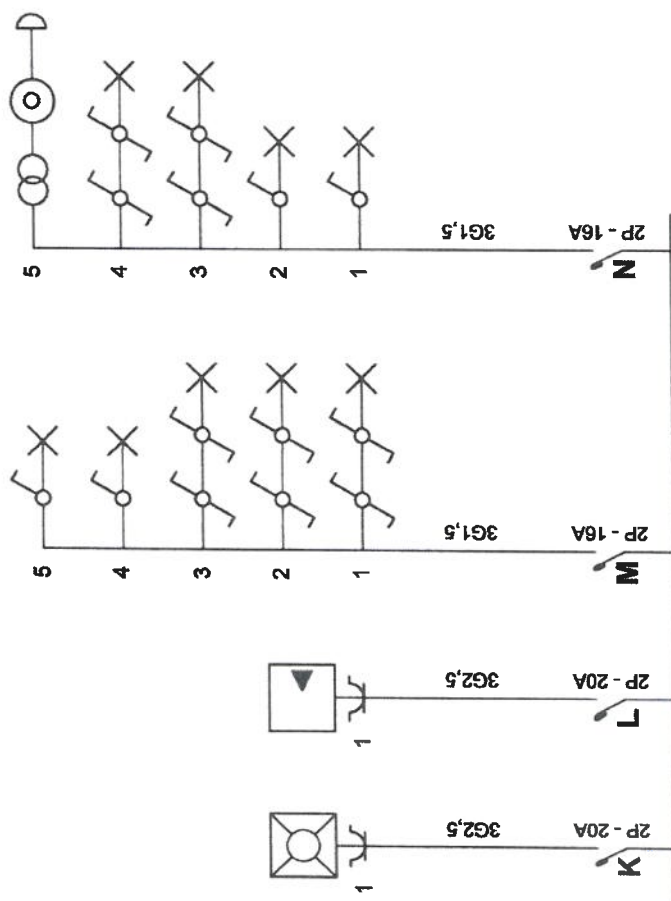

V. COTTE
Jonas
Stuurman
15/10/19



VEKEMAN MARNIK
BRUSSELSESTEENWEG 285
9230 WETTEREN
BTW 884.637.624
TEL 0495/304821

LEGENDE Stationstraat 31

- A. 25A kookplaat
- B .20A oven
- C.20A frigo
- D. 20A aanrecht
- E. 20A living
- F. 20A slaapkamers
- G,20A Ventilatie +berging
- H 20A badkamer
- I 20A wasmachine
- J 20A droogkast
- K 20A vaatwas
- L 20A cv
- N 16A verlichting
- M 16A verlichting +bel



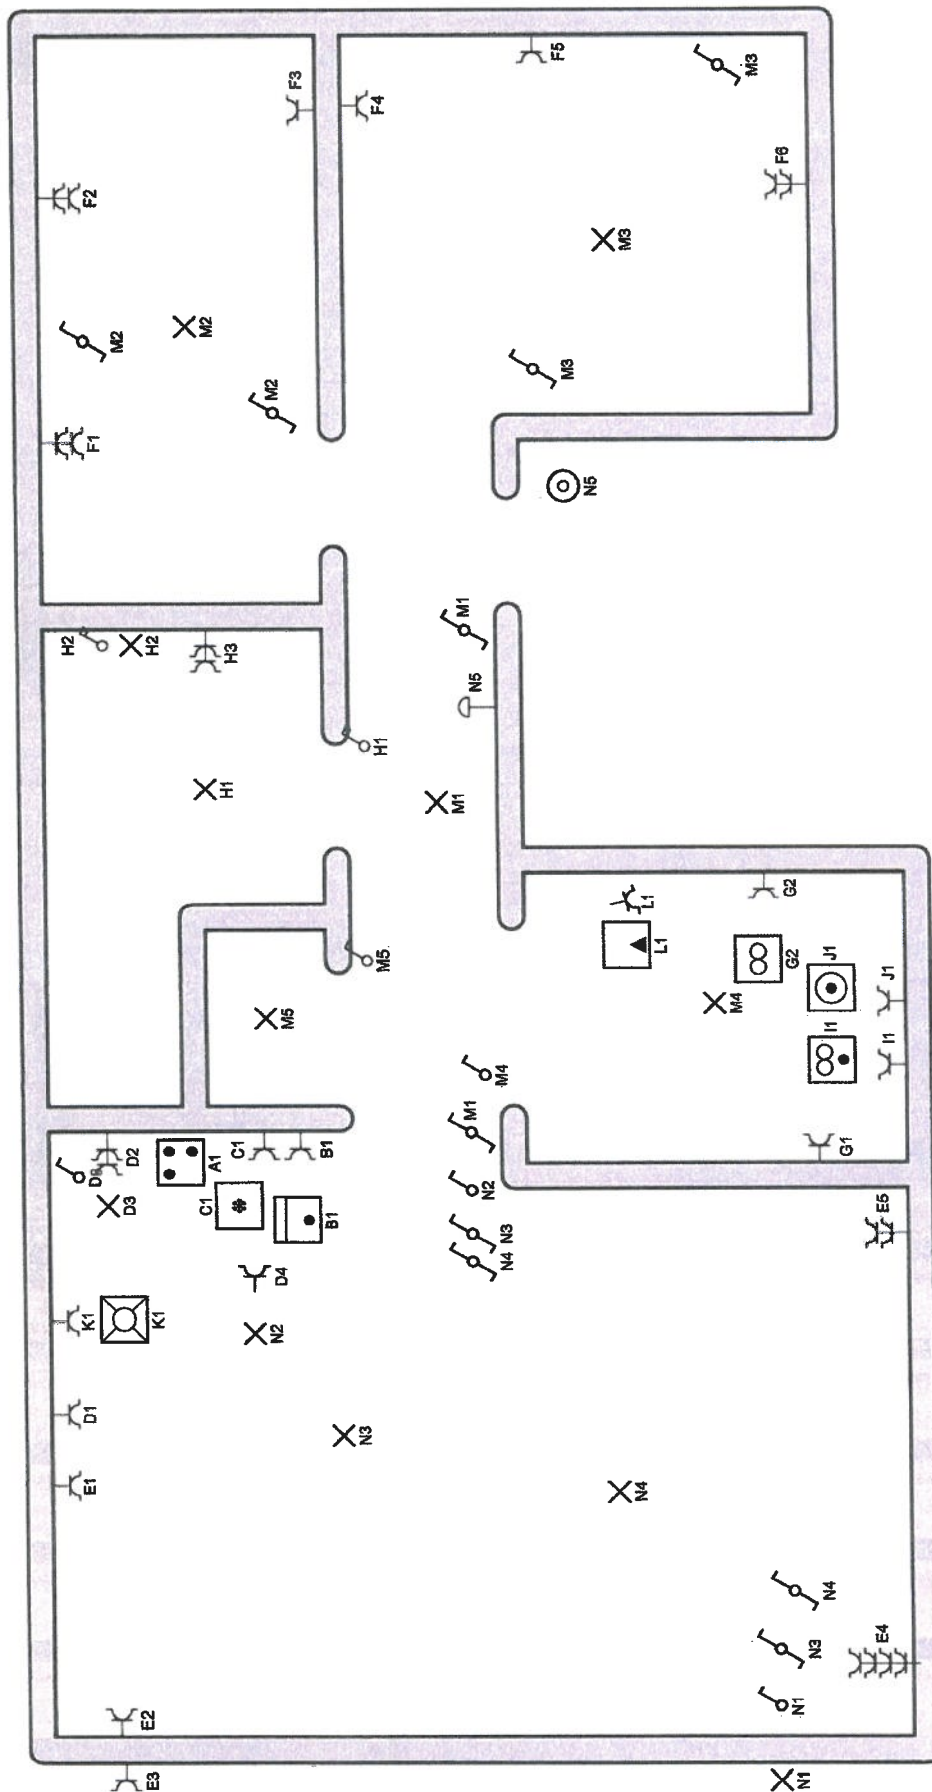
Plaats van de elektrische installatie

**Stationstraat 31
9420 Erpe - Mere**

p. 2/3
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Vekeman GCV
 Brusselsesteenweg 285
 9230 Wetteren
 Tel.: 09 366 48 21 GSM: 0495 30 48 21
 e-mail: marnik.vekeman@pandora.be
 BTW BE 0884.637.624



p. 3/3
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Vekeman GCV
Brusselsesteenweg 285
9230 Wetteren
Tel.: 09 366 48 21 GSM: 0495 30 48 21
e-mail: marnik.vekeman@pandora.be
BTW BE 0884.637.624

Plaats van de elektrische installatie

Stationstraat 31
9420 Erpe-Mere

