

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20160619-010-023 Datum onderzoek: 17/06/2016 Agent: De Grave G. HK: 17/06/2041 CFM: ☒ 1/1

ALGEMENE GEGEVENS


Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Distellaan 74-76 bus 0302 ,8434 Westende
 Opdrachtgever: Willem Steven , Jacob Van Maerlantstraat 2 , 8490 Jabbeke
 Bedrijf: Willem Technics Ond nr / IDnr: BE0873480644
 Eigenaar: _____
 Type lokalen: Appartement
 Doel onderzoek: 270 - Gelijkvormigheid/indienststelling

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	<u>0000464</u>	Continuïteitsmeting:	<u>ok</u>
Nominale spanning:	<u>2 x 230V</u>	ADS testknop:	_____
Hoofdbeveiliging:	<u>40A</u>	ADS foutlus:	_____
Voedingsleiding:	<u>4 x 10 mm2 XVB</u>	Bescherming RA OA:	<u>ok</u>
		R isolatie:	<u>OK, > 0,5 MΩ</u>
Elektrode type:	<u>Aardingslus</u>	R aarde:	<u>27 ohm</u>
Aantal borden:	<u>1</u>	Schema's:	<u>ok</u>
Aantal stroombanen:	<u>9</u>	Staat vast	_____
Waarde ADS:	<u>300mA 40A</u>	elektrisch materieel:	<u>ok</u>

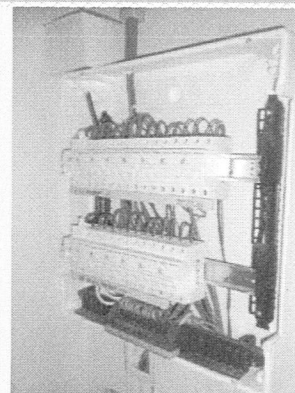

TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 17/06/2041 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.


Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN


Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur:

De Grave G.



302

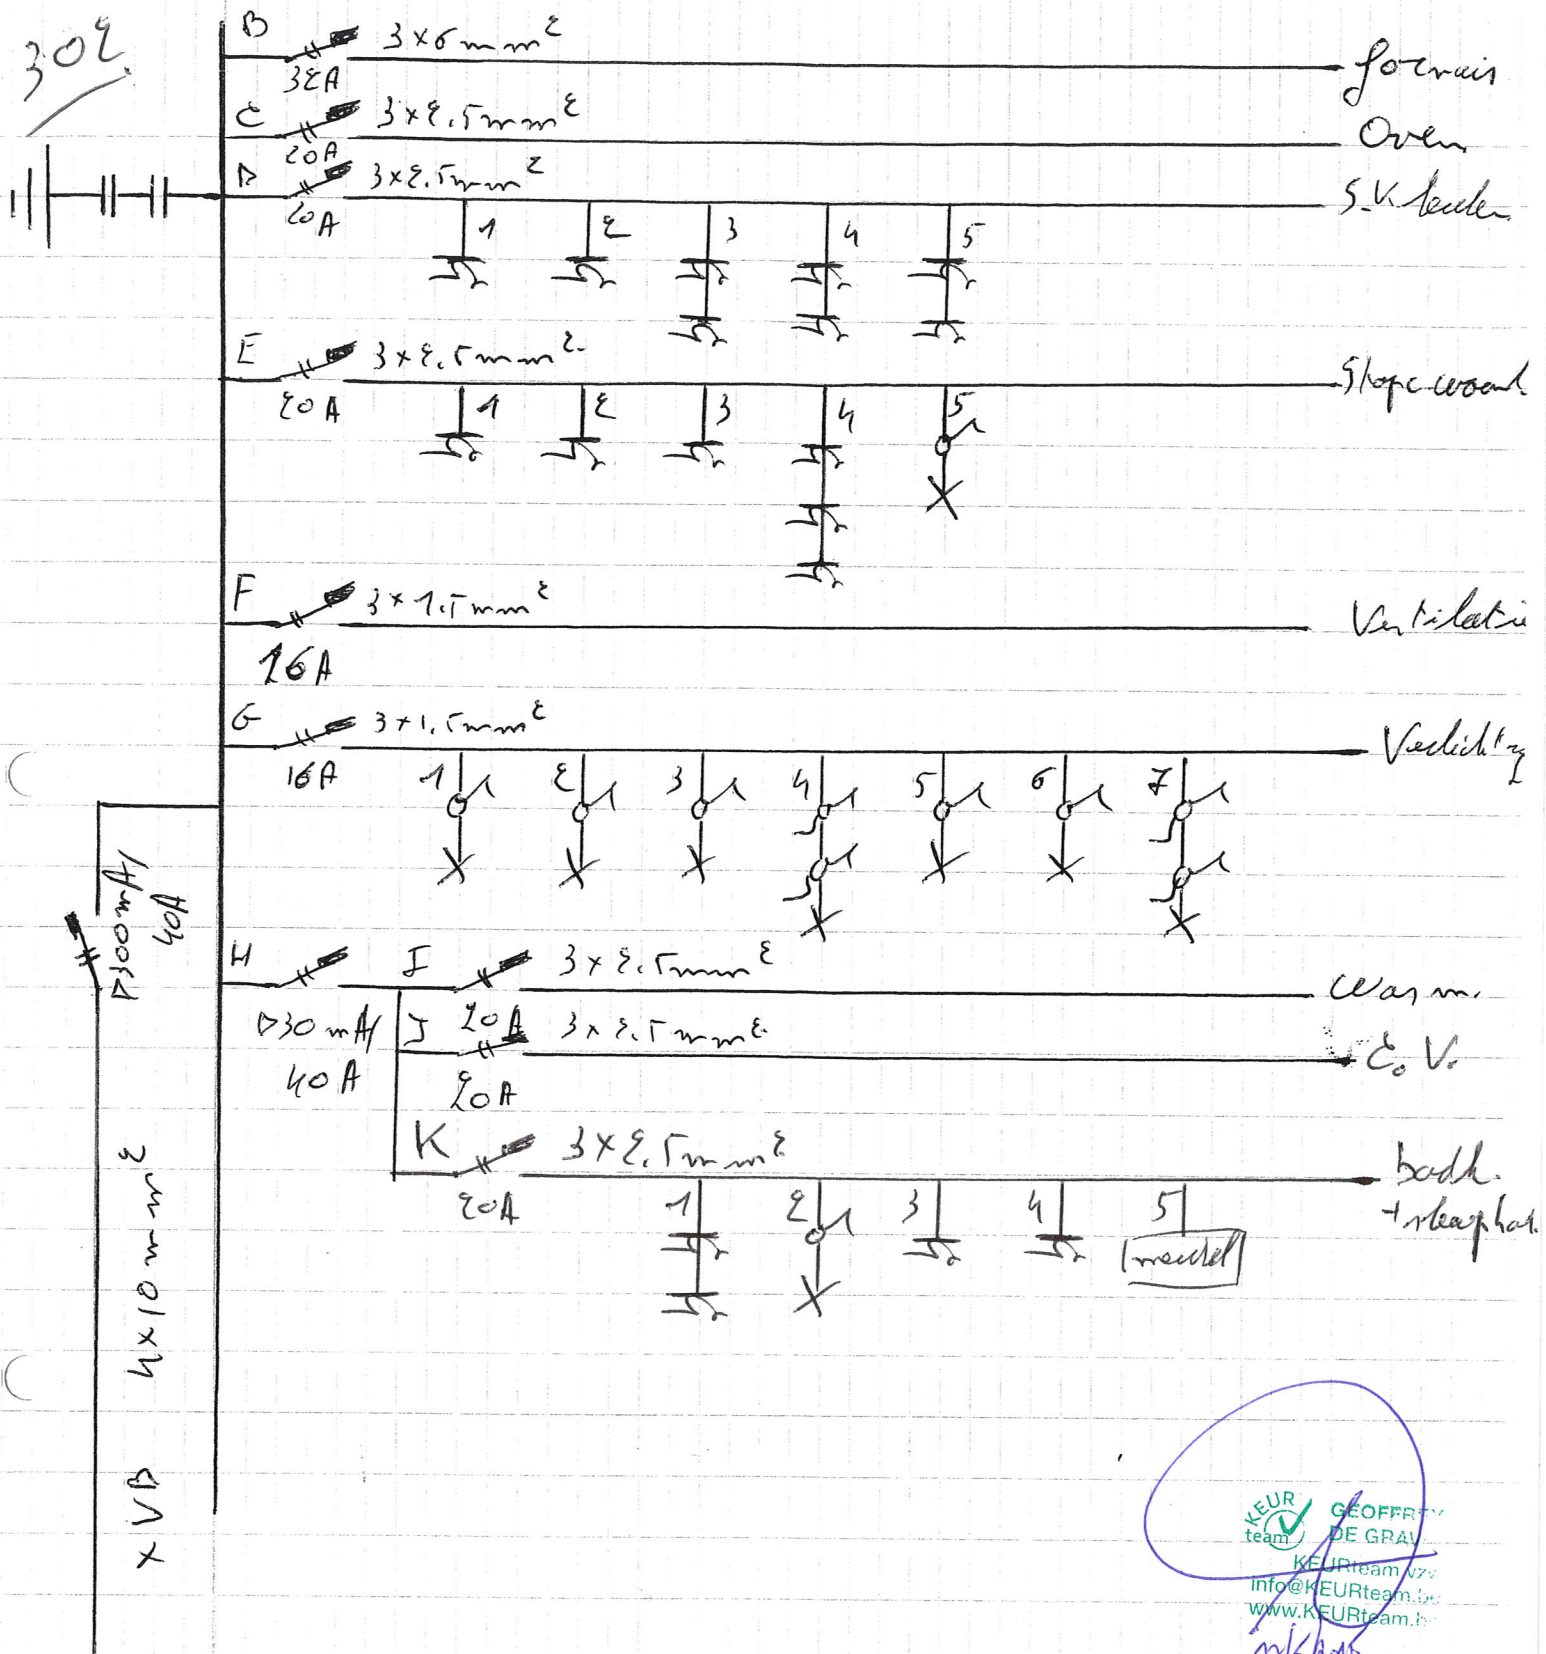


werf : Per Odyne 302
 Distelsteaan 74-76
 8434 Westende
 54144 920000 4647871

bed : Willem Technics
 Jacob V. Maerlantstraat
 8450 Snellegem

873 480 649

302

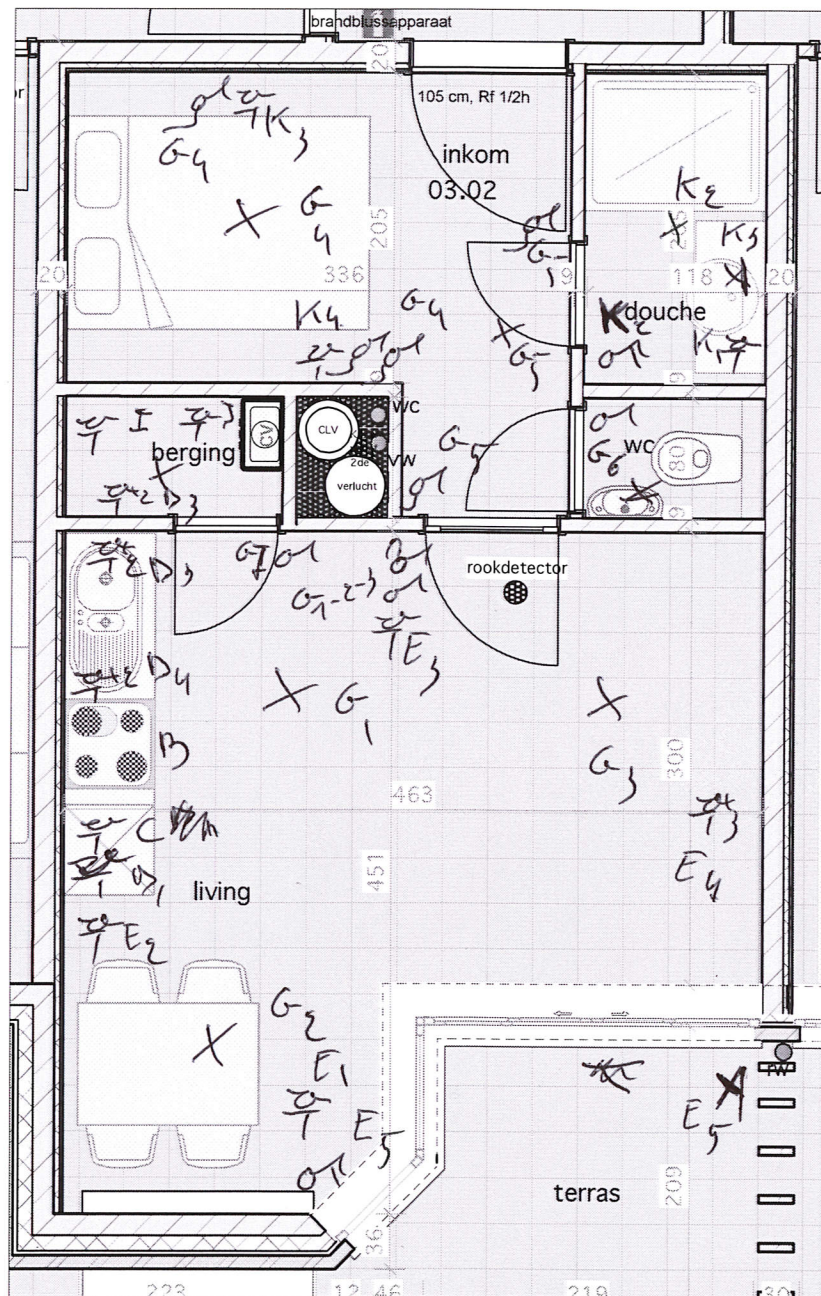

17/5/2016

KEUR team
GEOFFREY DE GRAVE
KEURteam vzw
info@KEURteam.be
www.KEURteam.be
