

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 14/08/2026

Inspecteur: Dean Deneweth

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23120926

Datum verslag: 14/08/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Terlicht
Huisnummer 112
Busnummer
Postcode 9450
Gemeente Haaltert
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam Terlicht
Huisnummer 112
Busnummer
Postcode 9450
Gemeente Haaltert
Land België

Installateur

Naam Bestaande installatie
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: 1617188

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 14.58 MΩ

OK

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V


Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 20 + 9

RE: 3.78 Ω

OK

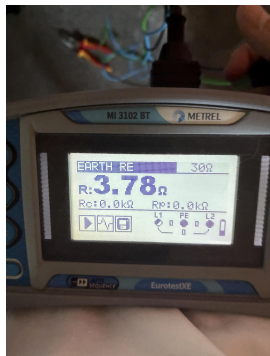

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		-	A	20	OK	OK
30	40		-	A	7	OK	OK
300	63	UNT	-	A	9	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie inbreuken	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	NOK	Indirecte aanraking	NOK
Aansluitingen	NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.01 Eëndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I6.10 De I2t-waarde (minimum 22,5 kA2s bij een stroom van 3000 A) voor de differentieelstroombeschermingsinrichting(en) met een nominale stroom kleiner of gelijk aan 40 A is niet voorzien. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.5)
- I7.02 In meerfasige kringen is de afzonderlijke smeltzekering of 1-polige kleine vermogensschakelaar van de nulgeleider niet toegelaten. (Boek 1 Onderafdeling 4.4.4.7.)
- I8.17 De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden te isoleren. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.3.3.b)
- I9.12 Stopcontact(en) moet(en) gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden. (Boek 1 Afdeling 5.1.4.)
- I9.12 Stopcontact(en) moet(en) gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden. (Boek 1 Afdeling 5.1.4.)
- I9.12 Stopcontact(en) moet(en) gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden. (Boek 1 Afdeling 5.1.4.)
- N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

Nota :

Tellernummer UNT : 6891422

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 14/8/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

- Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:
- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
 - de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:24 tot 12:00

De inspecteur Dean Deneweth



Dean Deneweth
ACEG VZW - #366

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.




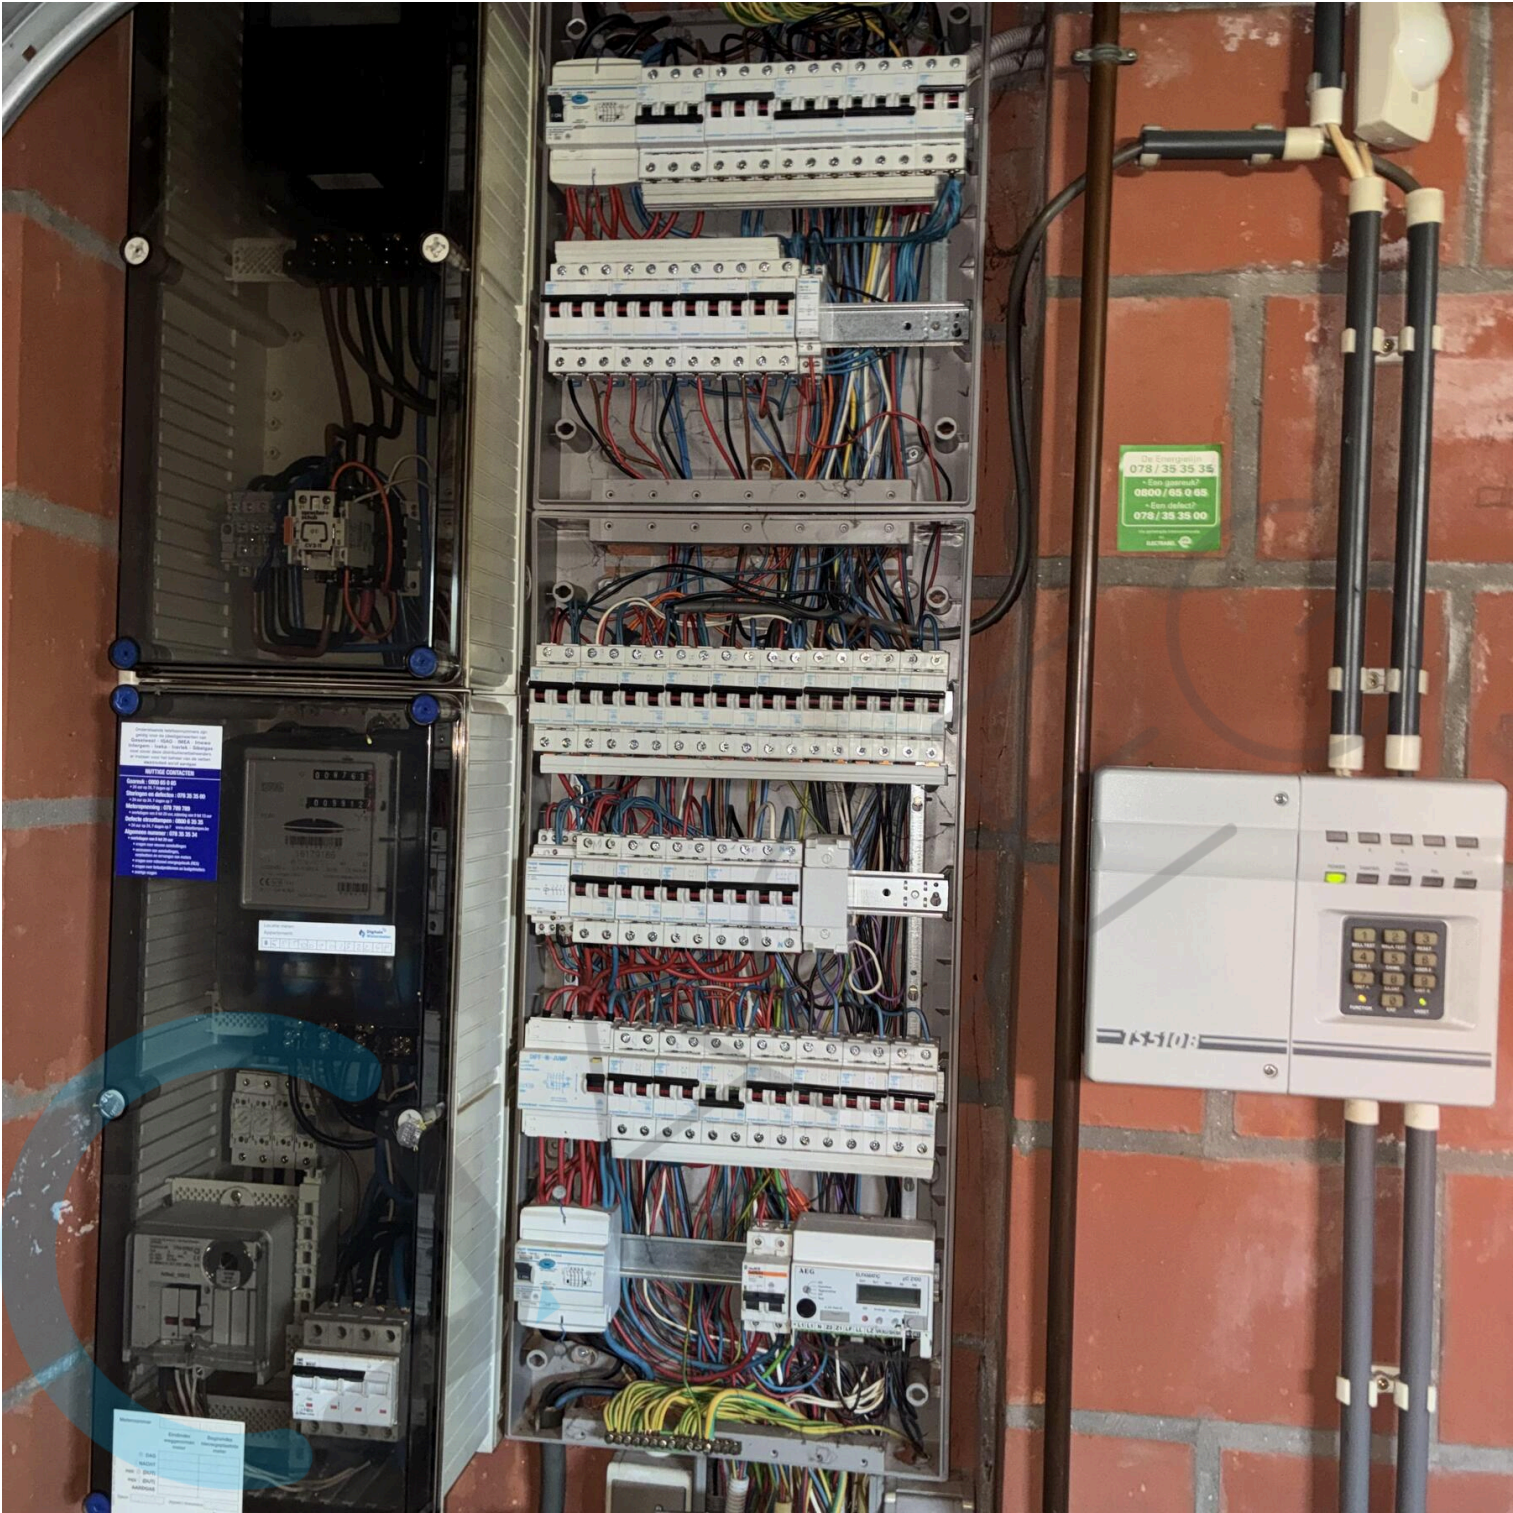




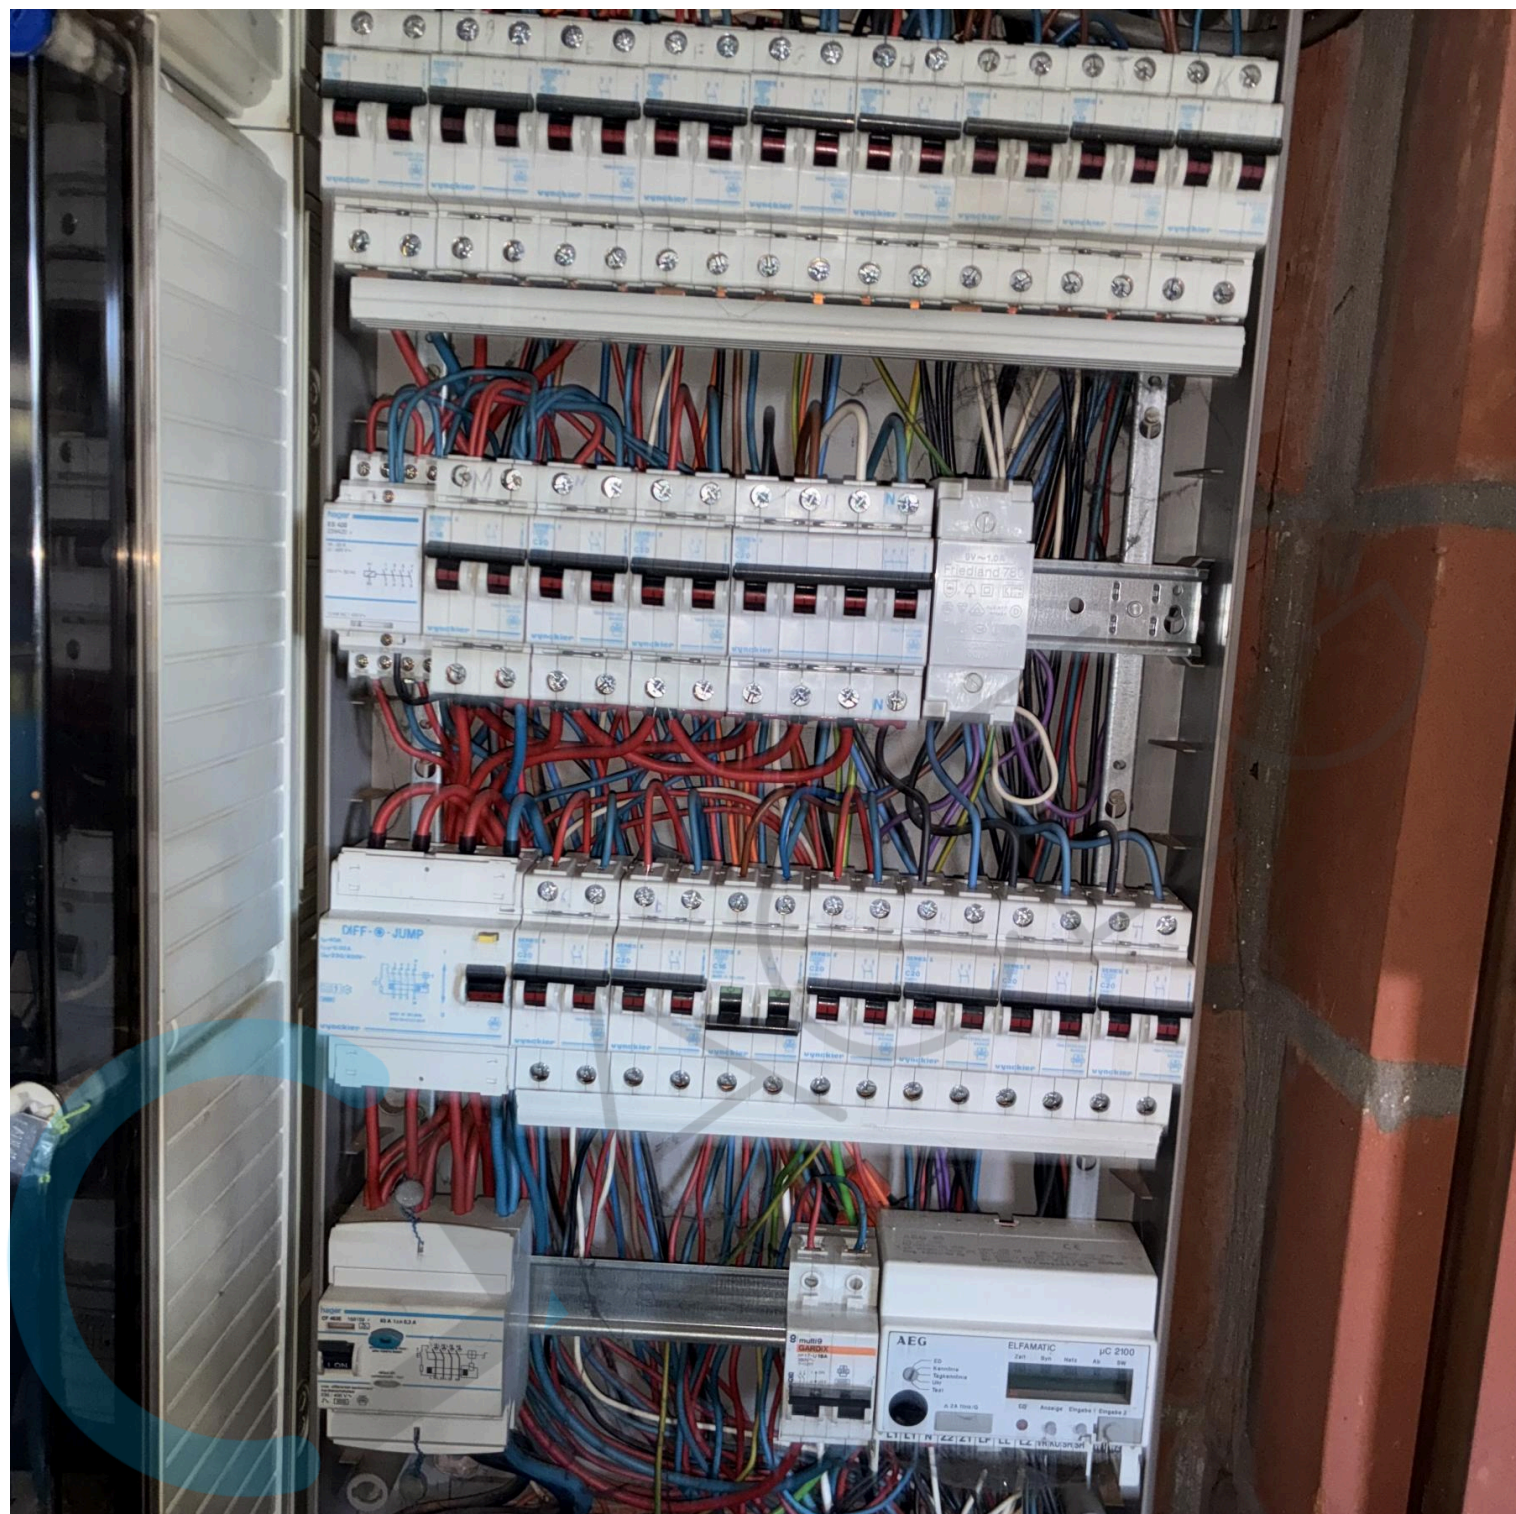

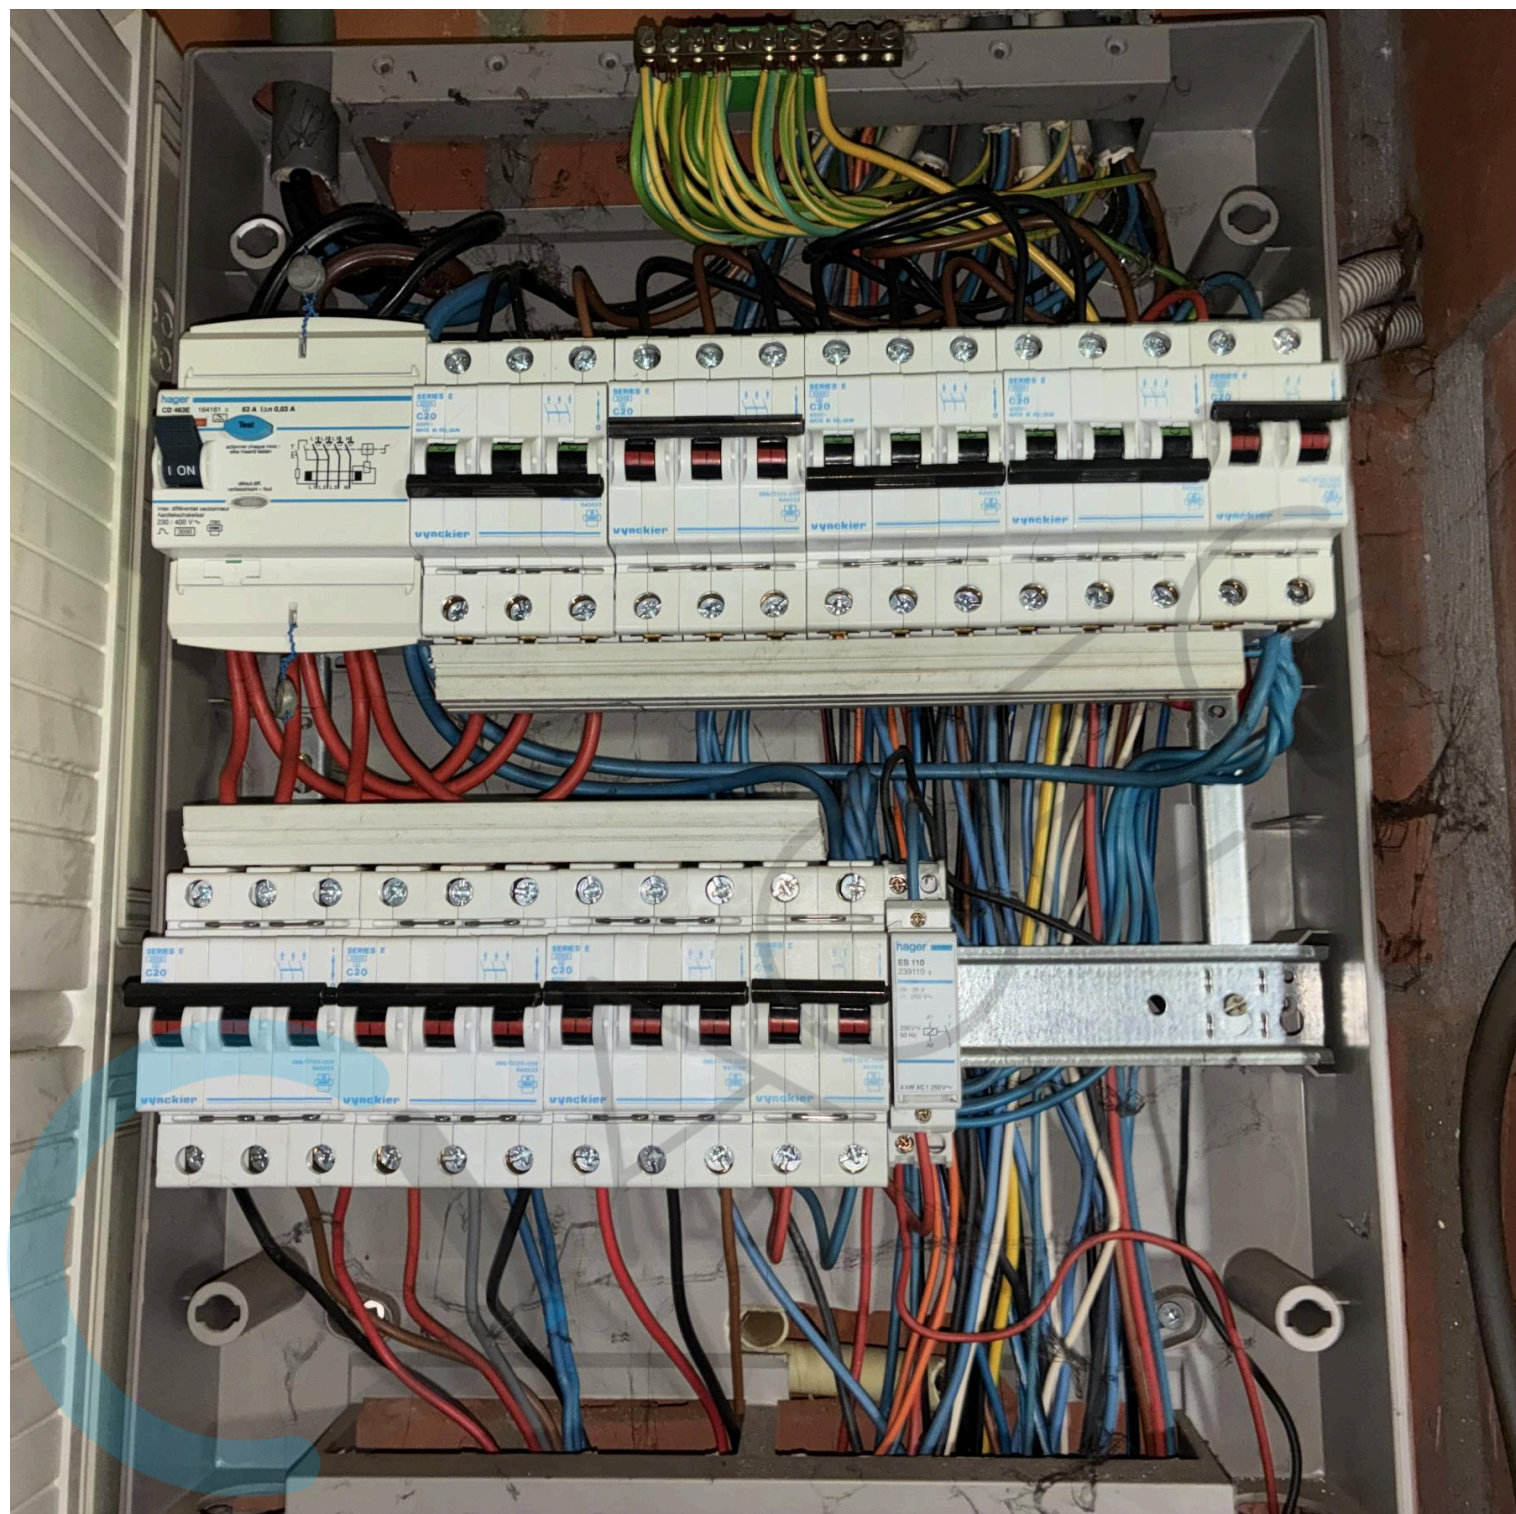

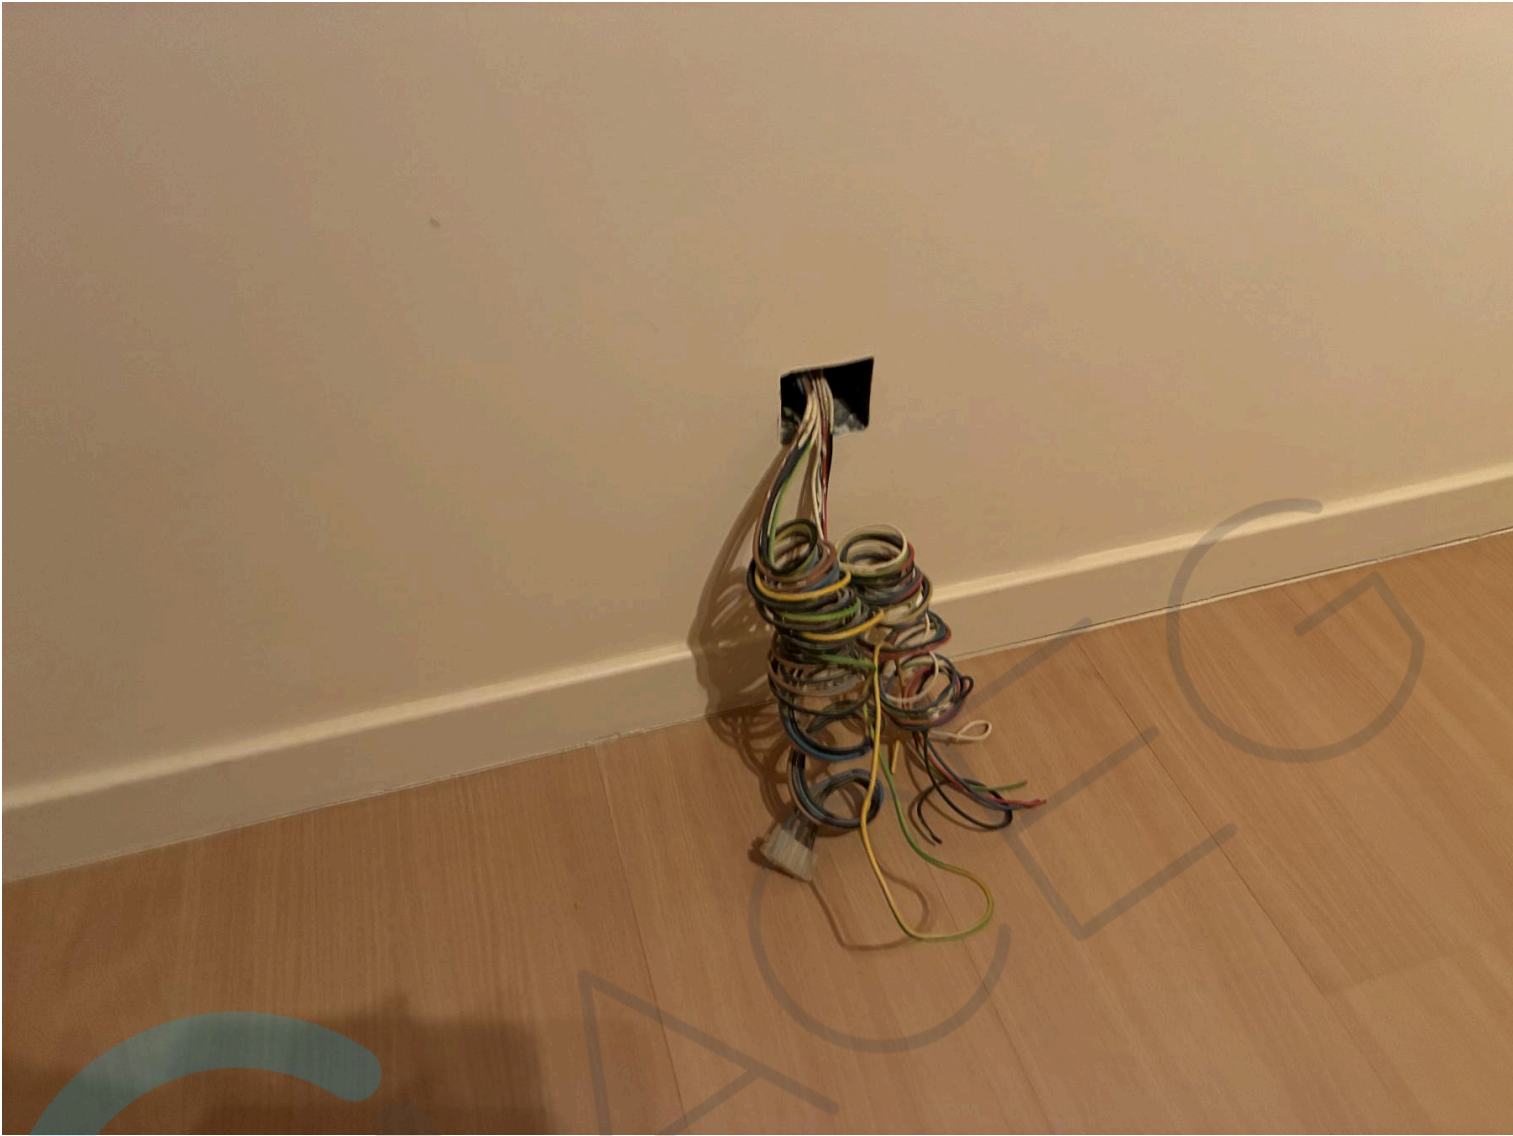

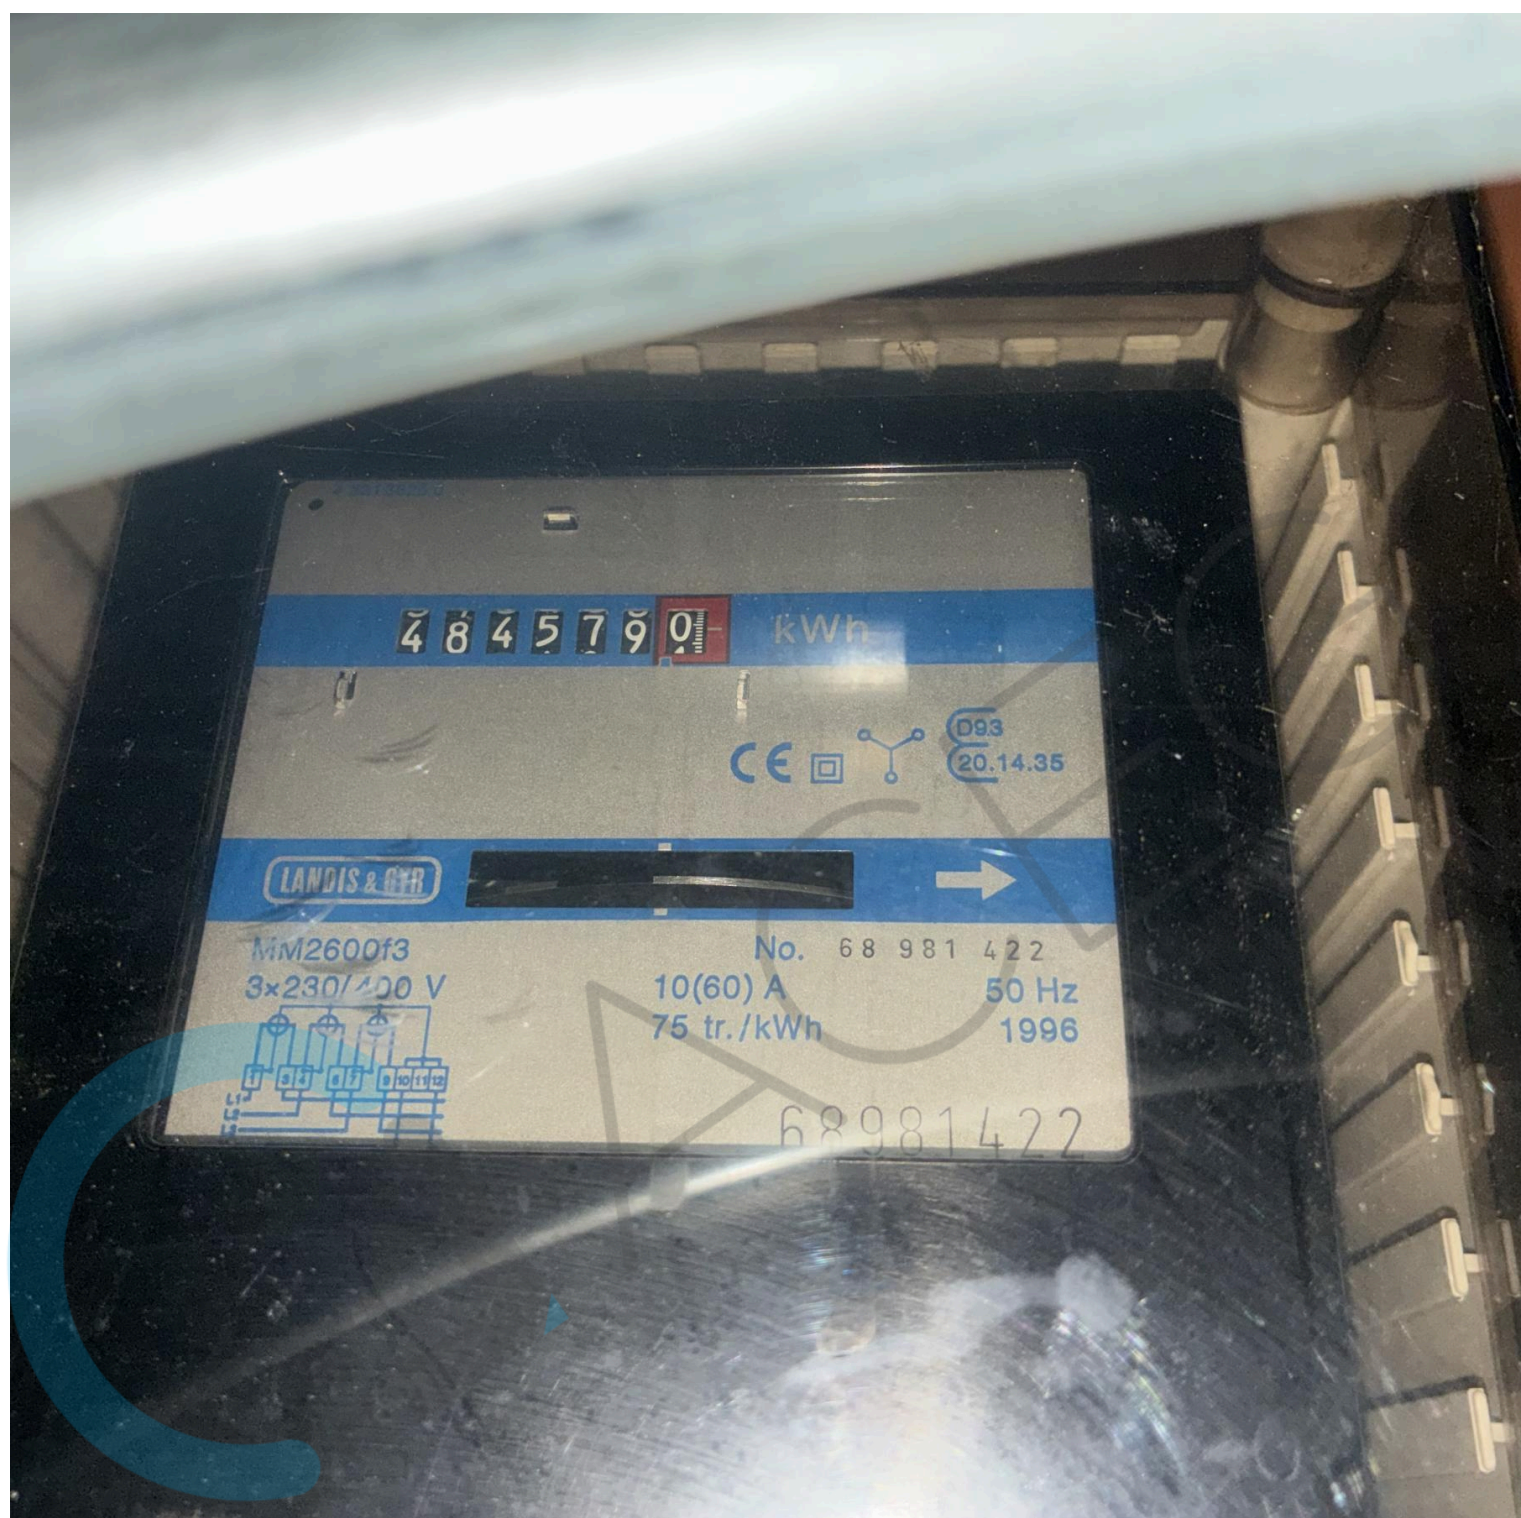

4845790 kWh

CE   D93
20.14.35


LANDIS & GYR

MM2600f3
3x230/400 V



No. 68 981 422
10(60) A
75 tr./kWh
50 Hz
1996


68981422

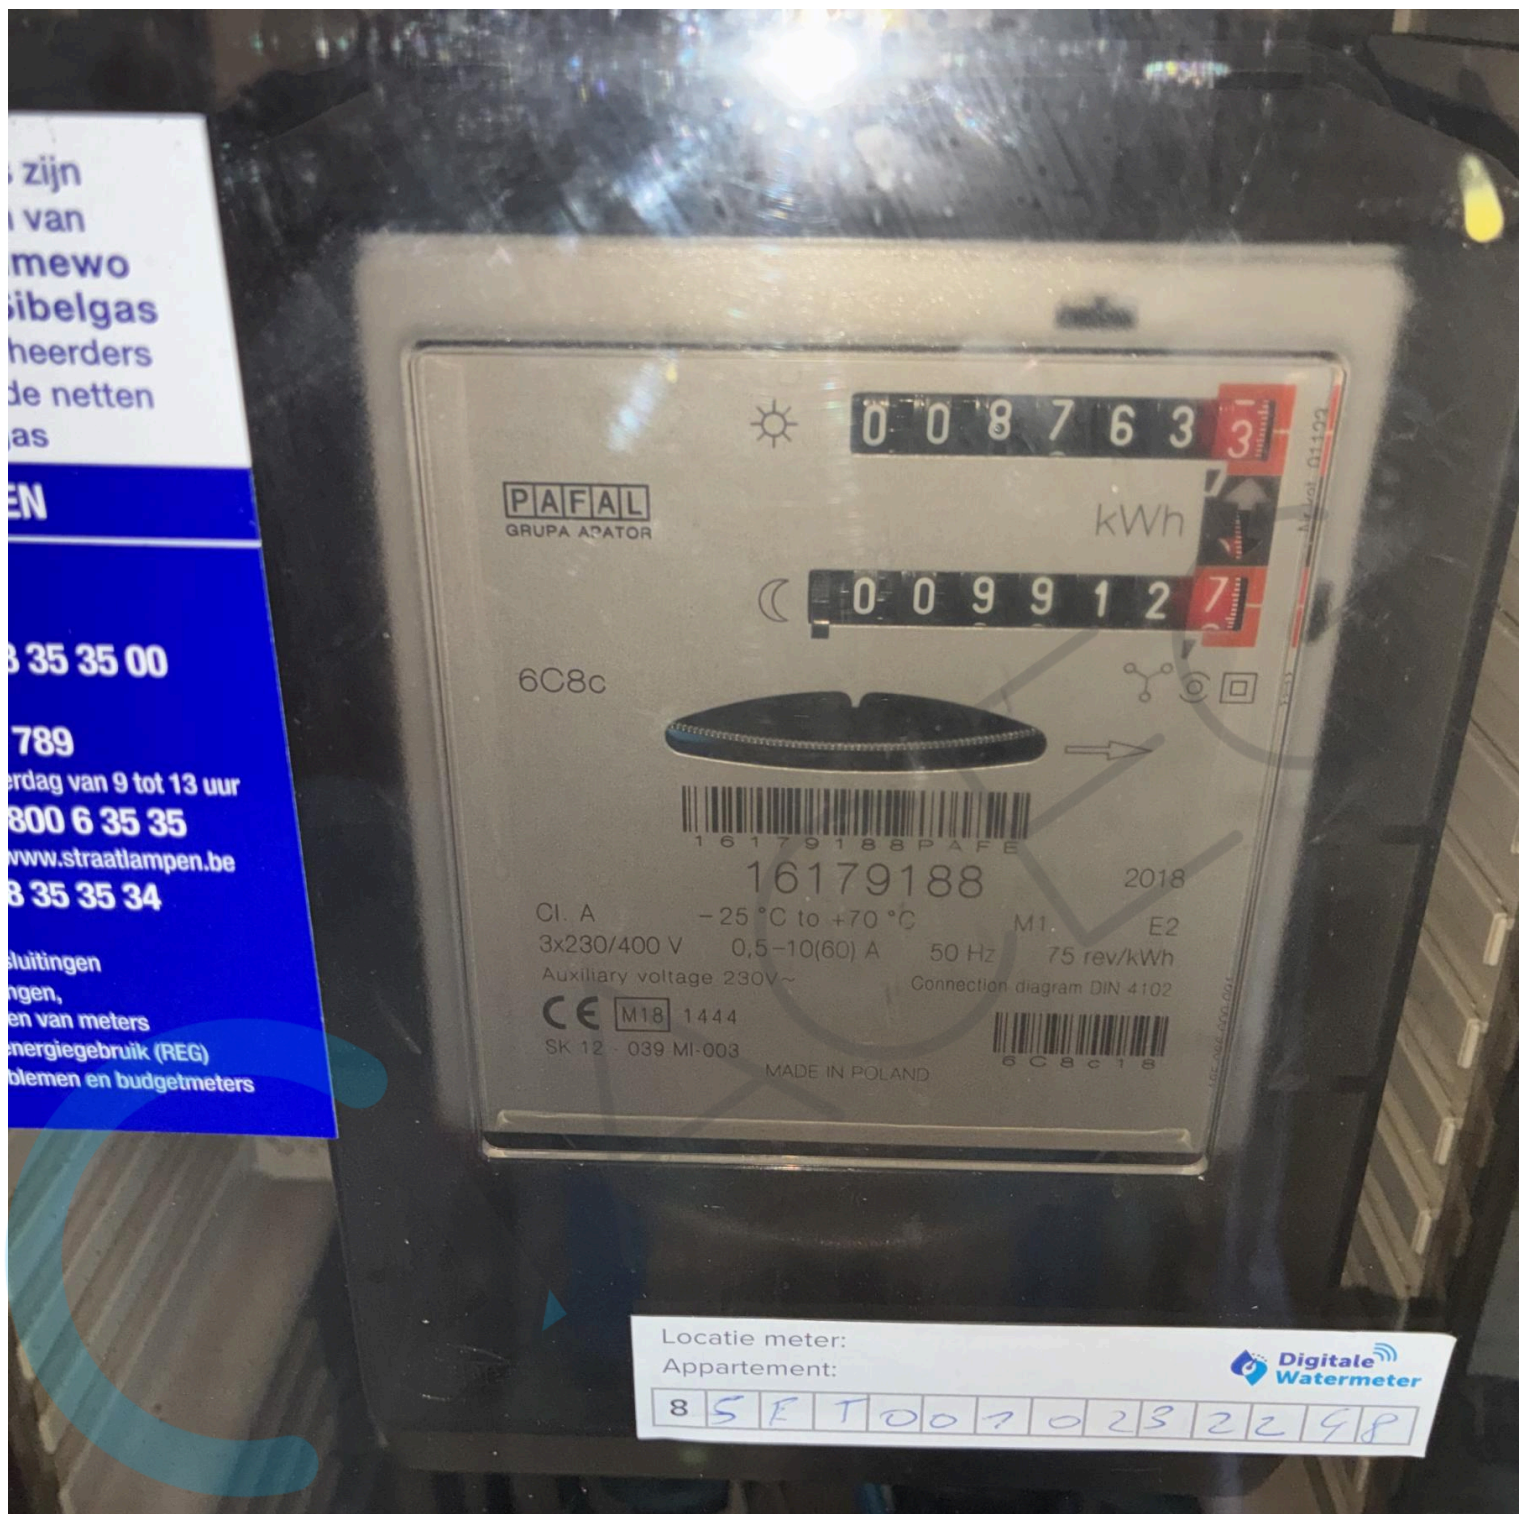









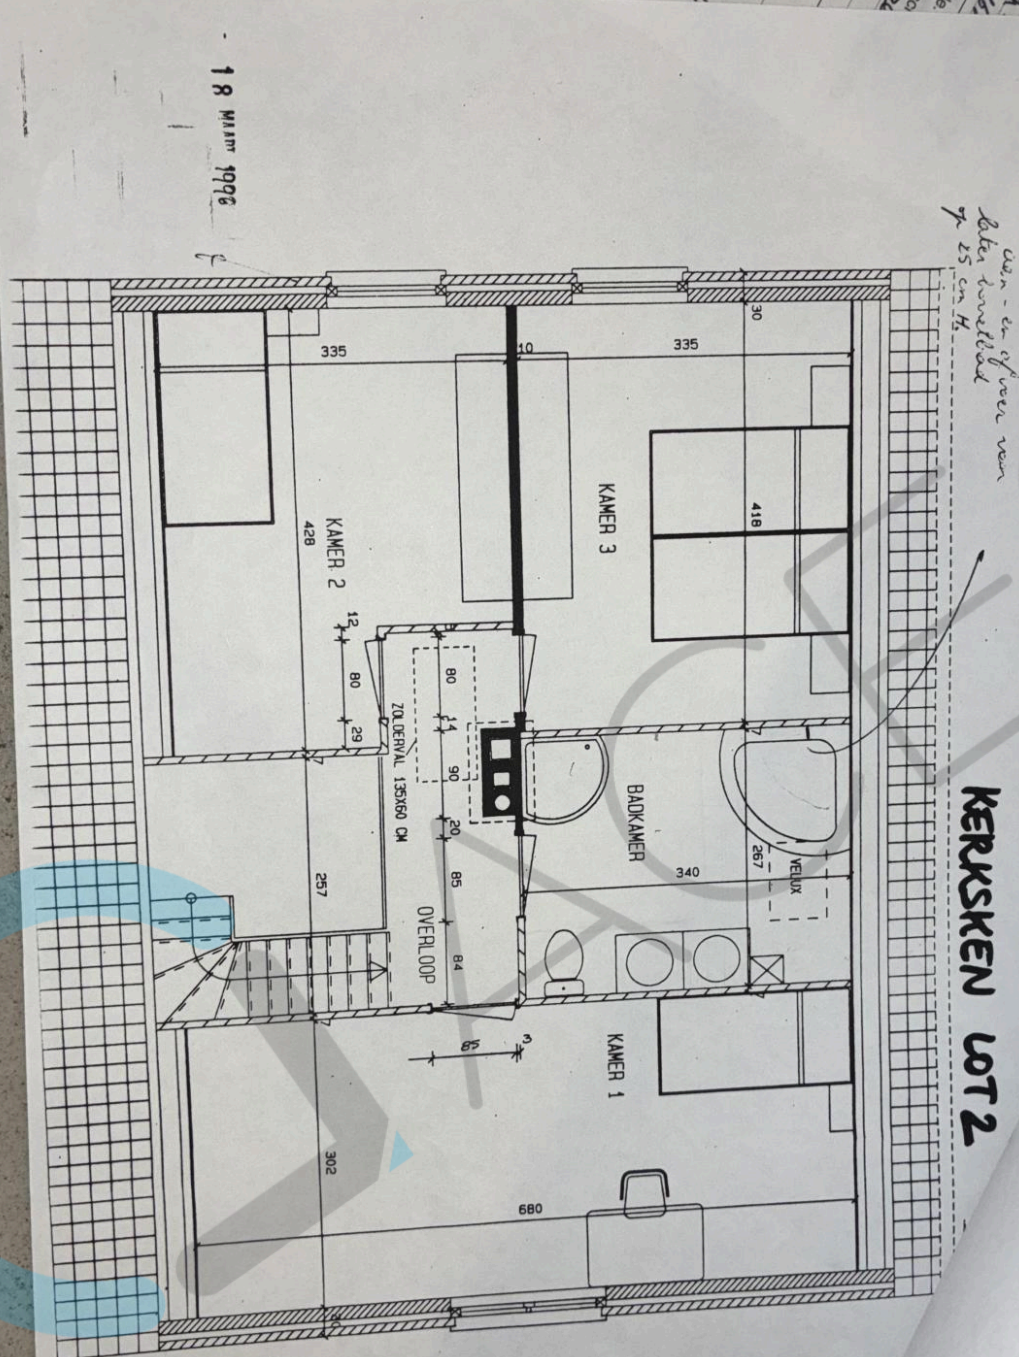

12/03/96
S.F.







VERM.
+ ELEKTR.

12/03/96
GSA

print order platform

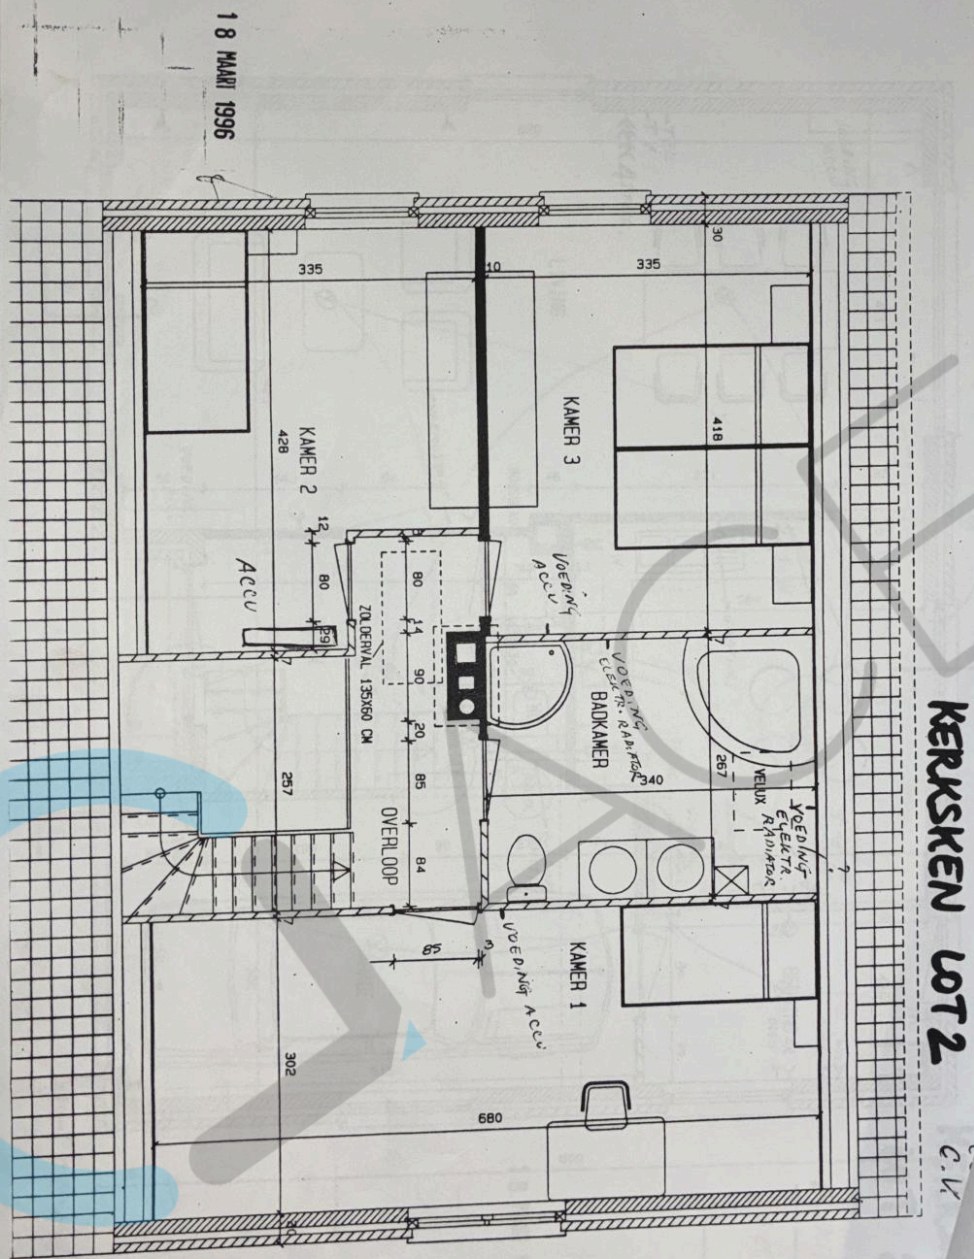


ΕΛΕΚΤΡ.



55

12/03/96



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

Halsendallaan 5, 1652 Alseberg
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

Meensestraat 41, 8500 Kortrijk
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

085702

KONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : VAN SCHELVERGEN

Plaats van onderzoek : TERLICHT 112 KERKSKEN (HAALTEXT)

Installateur : BVBA VERVAEKE-MATTON CEDERSTRAAT 1 2560 WEVELGEM

- B.T.W.-nummer :

- of identiteitskaartnr uitgereikt te :

op datum van :

Aard van de inrichting : Ras - nieuwbouw

Stroomleveraar : Electabel-Noord

Agent-Onderzoeker : De Smet

Datum van onderzoek : 30-09-96

- | | | |
|---|---------------------|--|
| - Bedrijfsspanning | <u>3N, 400V</u> | - Beschrijving van de stroombanen : |
| - Doorsnede voedingskabel | <u>EXVB 4x16-2</u> | <u>Op Δ 300mA/63A:</u> |
| - Algemene bescherming | <u>2x max 63A</u> | <u>A3, B6, I1, T1, K1, M1 op 16A ant</u> |
| - Type algemene schakelaar | <u>2x Gant 4p</u> | <u>F8, G7, H6, E8, N1, O1 op 20A ant</u> |
| - Type aardelektrode(s) | <u>lus</u> | <u>P1 op 20A ant 4p</u> |
| - Aardspreidingsweerstand | <u>5,0 Ω</u> | <u>Op Δ 300mA/63A: C2, D1, Q1, R3, S1 op 20A ant / L1 op 16A ant</u> |
| - Algemene isoleringsweerstand | <u>0,5 MΩ</u> | |
| - Aantal borden en eindstroombanen | <u>2/20-8</u> | <u>Op Δ 300mA/63A:</u> |
| - Algemene differentieelschakelaar | <u>2x 300mA/63A</u> | <u>U1, V1, W1, X1, Y1, Z1 A'1 op 20A ant 3p</u> |
| - Bijkomende differentieelschakelaar(s) | <u>300mA/40A</u> | <u>B'1 op 20A ant / C'1 op 16A ant</u> |
- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : accu's 3kW + 4kW + 5kW + 6kW + 2 reserves + boiler.

Vastgestelde inbreuken :

Geen.

Opm: - Badkamer: bad, verlichtingsstopkroket, en badkamameubel zijn nog niet geplaatst.

- Het broekblad is nog niet geplaatst

INTERCEM - ELECTRABEL

Nedawijk nr 267

9400 NINOVE

Tel. 054/31 52 11

Fax. 054/32 78 58

30/9/96

De elektrische installatie werd konform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieel-schakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controlebezoek uiterlijk op 30-09-2021

F: 1

Agent-Onderzoeker,

[Handwritten Signature]

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

