

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

**N 360620**Resi code: **7c****VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE****Verantwoordelijke uitvoering van het werk :****Installatie :****Eigenaar / Uitbater / Beheerder :**

Naam, voornaam : Jan Heek	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres :
BTW nr.: BE 088540600	Post nr. + Stad :
	Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	☐ Wooneenheid	☐ Vóór 1/10/1981
☐ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	☒ Werkeenheid	☐ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
☐ Controlebezoek (6.5.)	☐ Werfinstallatie	☒ Vanaf 1/06/2020
☐ Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)	☐ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
☐ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	☐ Technische lokalen van een residentieel geheel	
☐ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	☐ Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8: ☐ Toegepast ☐ Niet toegepast	☐ Andere installatie:	

Algemene gegevens elektrische installatie :☐ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdelers	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Naam verdelers	kWh meter nr. 75463700	meterstand dag : 85.573	nacht : 32.905
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ mono 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode : ☐	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ open / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 70 mm ² - Type : XLVB	Aardverbindingssyst.: ☒ TT ☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 30 A / 300 mA	Aantal borden : 7	Aantal eindstroombanen : 17
☐ Zie bijlage(n)	skema's aanwezig		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Verplaatsb. materieel	☐ Vast materieel	☐ I>/doorsnede	☒ Schema's
☐ Aardingsweerstand : 1.03 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 0.1 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Continuïteit (equipot., PE)	☒ Test diff.		
Alg. diff. : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden			Schema's en plannen getekend: ☒ Ja / Nee			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)







Vastgestelde inbreuken	
Nieuwe installatie	☒ Nihil
Vastgestelde inbreuken	
Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	ndr. ndr.
☐ Nihil	

Besluit :

- ☐ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Agent bezoeker :Naam : **Jan Loeken** Agent nr. : **5749** Datum : **4 / 7 / 2020****Bijlage(n) :** ☐ Situatieplan(nen) : ☐ Eéndraadsschema('s) : ☐**Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór****4-7-2020**
☒ door hetzelfde erkend organisme (*).**Voor de directeur generaal : Handtekening**

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

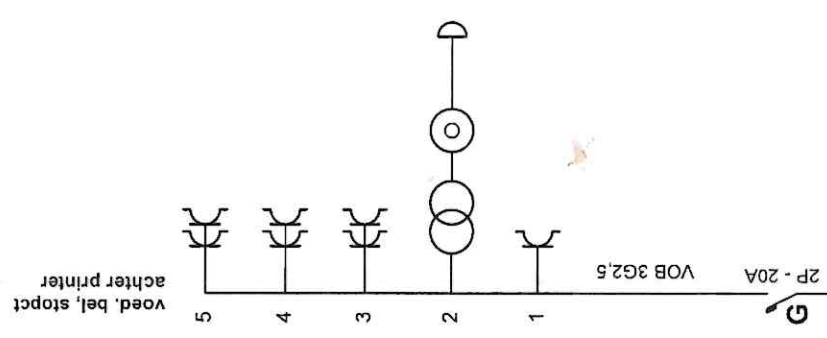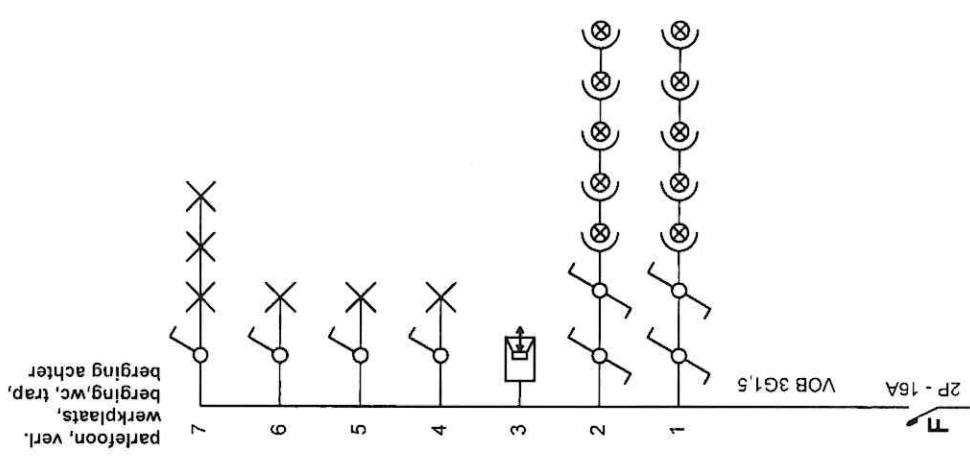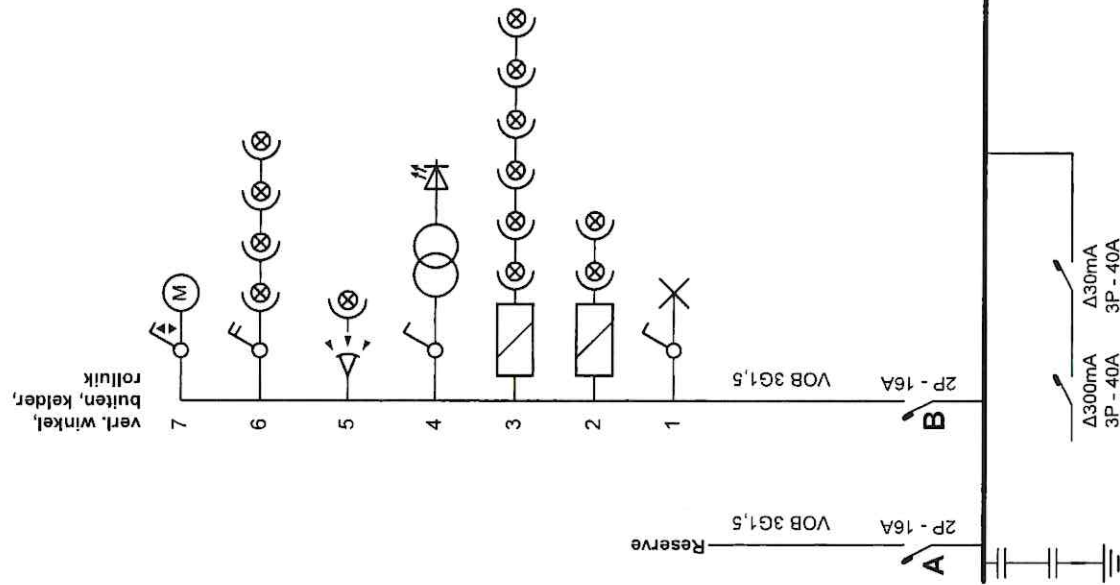


Plaats van de elektrische installatie
 trapstraat 44 bus 0001
 9620 Zottegem

[Handwritten signature]




Installateur
 Van Hecke Koen
 Wassenhovestraat 36
 9620 Zottegem
 0485406033

p. 1/4
 Einddraadschema
 3 x 230V ~ 50Hz

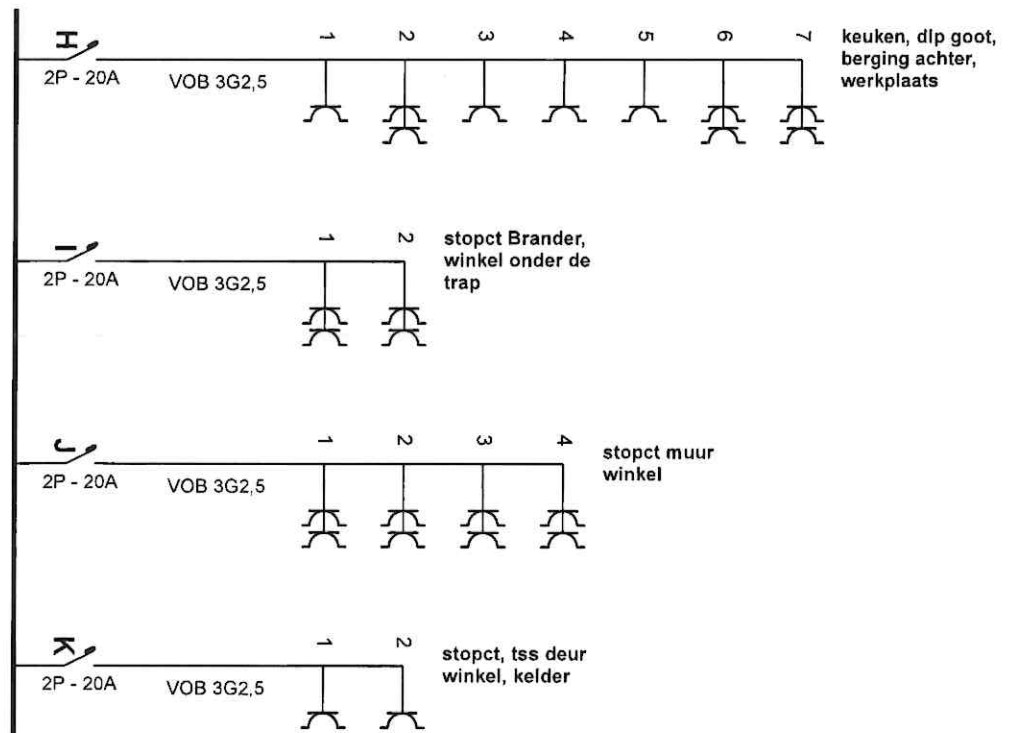

Handwritten signature

Handwritten signature

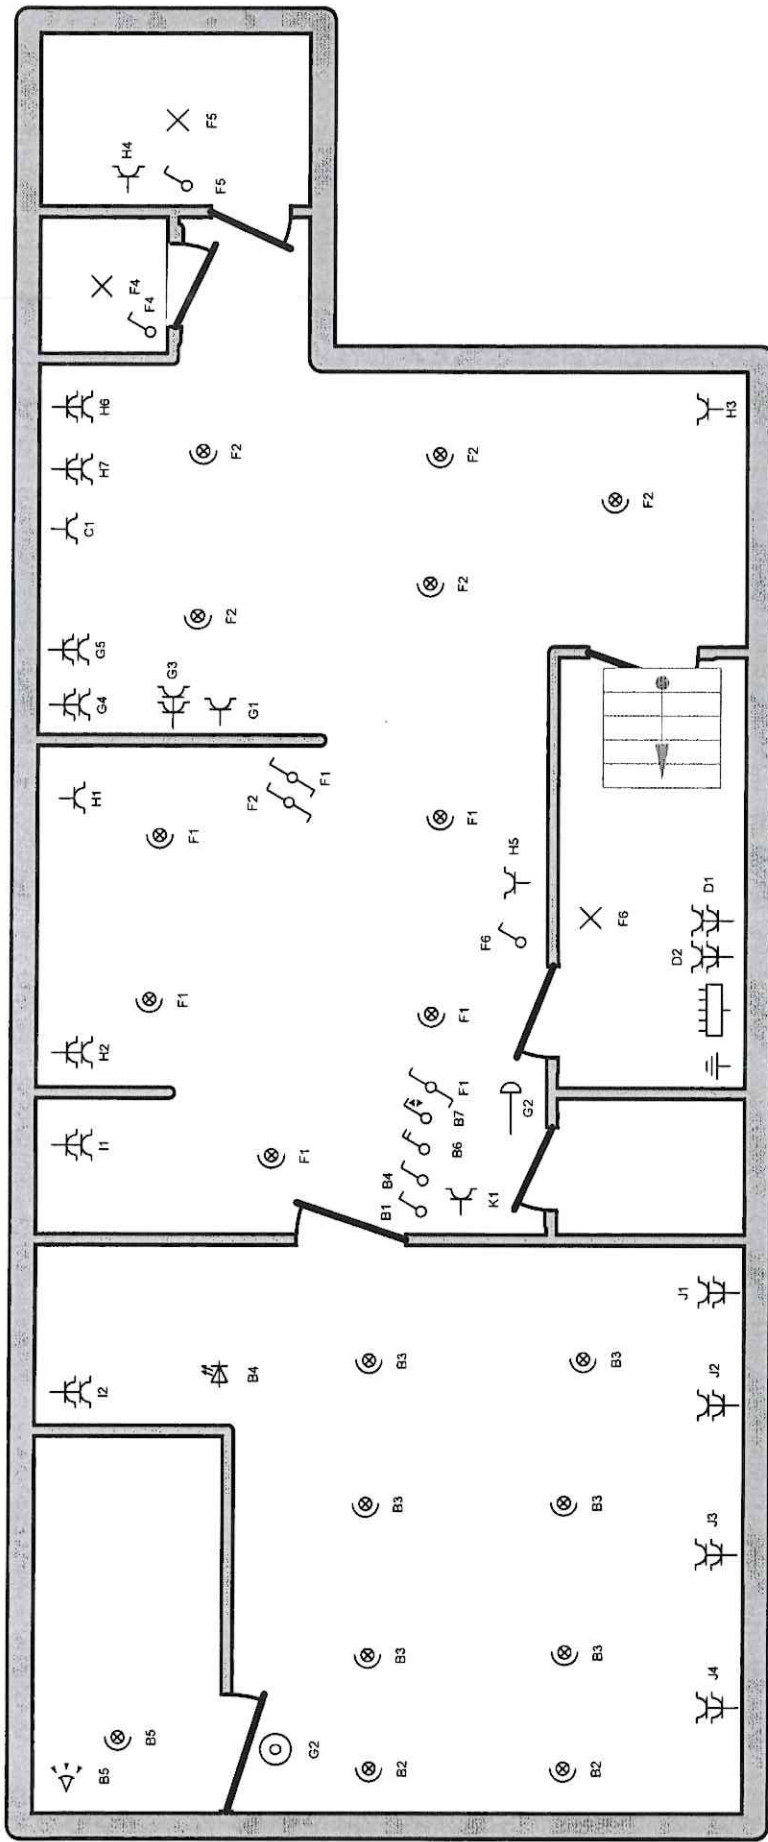

p. 3/4 Situatieschema 3 x 230V ~ 50Hz	

- | | |
|----|---|
| A: | Reserve |
| B: | verl. winkel, buiten, kelder, rolluik |
| C: | stopct, achter snijmachine |
| D: | stopct aan zekeringskast |
| E: | Reserve |
| F: | parlefoon, verl. werkplaats, berging,wc, trap, berging achter |
| G: | voed. bel, stopct achter printer |
| H: | keuken, dlp goot, berging achter, werkplaats |
| I: | stopct Brander, winkel onder de trap |
| J: | stopct muur winkel |
| K: | stopct, tss deur winkel, kelder |

