

Resp. client:
N° commande.
N° client: 149147
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: julien.mathy@amcs.be

ProKo.: LS01
N° rapport : 5910863
N° rapp. prov.:
Date: 07/11/2022



OCB vzw
Member of OCB Group

Client / Mandant :

AMCS
RUE DE JEMEPPE 73
5190 MOUSTIER-SUR-SAMBRE

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 497 ROBERFROID SYLVAIN
Propriét. / exploit./gestionn.: **Nom:** STROBBE NICOLAS **Adresse:** MOUSTIER-SUR-SAMBRE
Installat. / respons. travaux: **Nom:** AMCS **Adresse:** MOUSTIER-SUR-SAMBRE **T.V.A.:**
Adresse installation: STROBBE NICOLAS RUE DE JEMEPPE 21 MOUSTIER-SUR-SAMBRE 5190 **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: N/C **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** 338 600 54 **Compteur nuit :**

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: contrôle de conformité après la mise en usage - modification/extension importante (chap.6.4)

Dérogat. partie 8 livre 1 *: appliqué

Date installation: entre 01/10/1981 et 01/06/2020 + après 01/06/2020

(*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Pas d'application

Date: 07/11/2022

Contrôle suivant dans 300 **mois, ou avant le** 30/11/2047

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -
Tension nominal: 1 x 240V **Protection max.:** 40A **Protection princ.:** 2P20A **Interr. princ.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²
Prise de terre **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre
Électrode de terre: **type:** barres **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 2p 40A/300mA **supplémentaire:** 2p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☐ références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☐ luminaires
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 20

15x D2P2d 20A C / 5x D2P2d 16A C

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: >18,27 MOhm **Résistance de dispersion:** 24.3 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentielle:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant
I Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**


Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES


Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

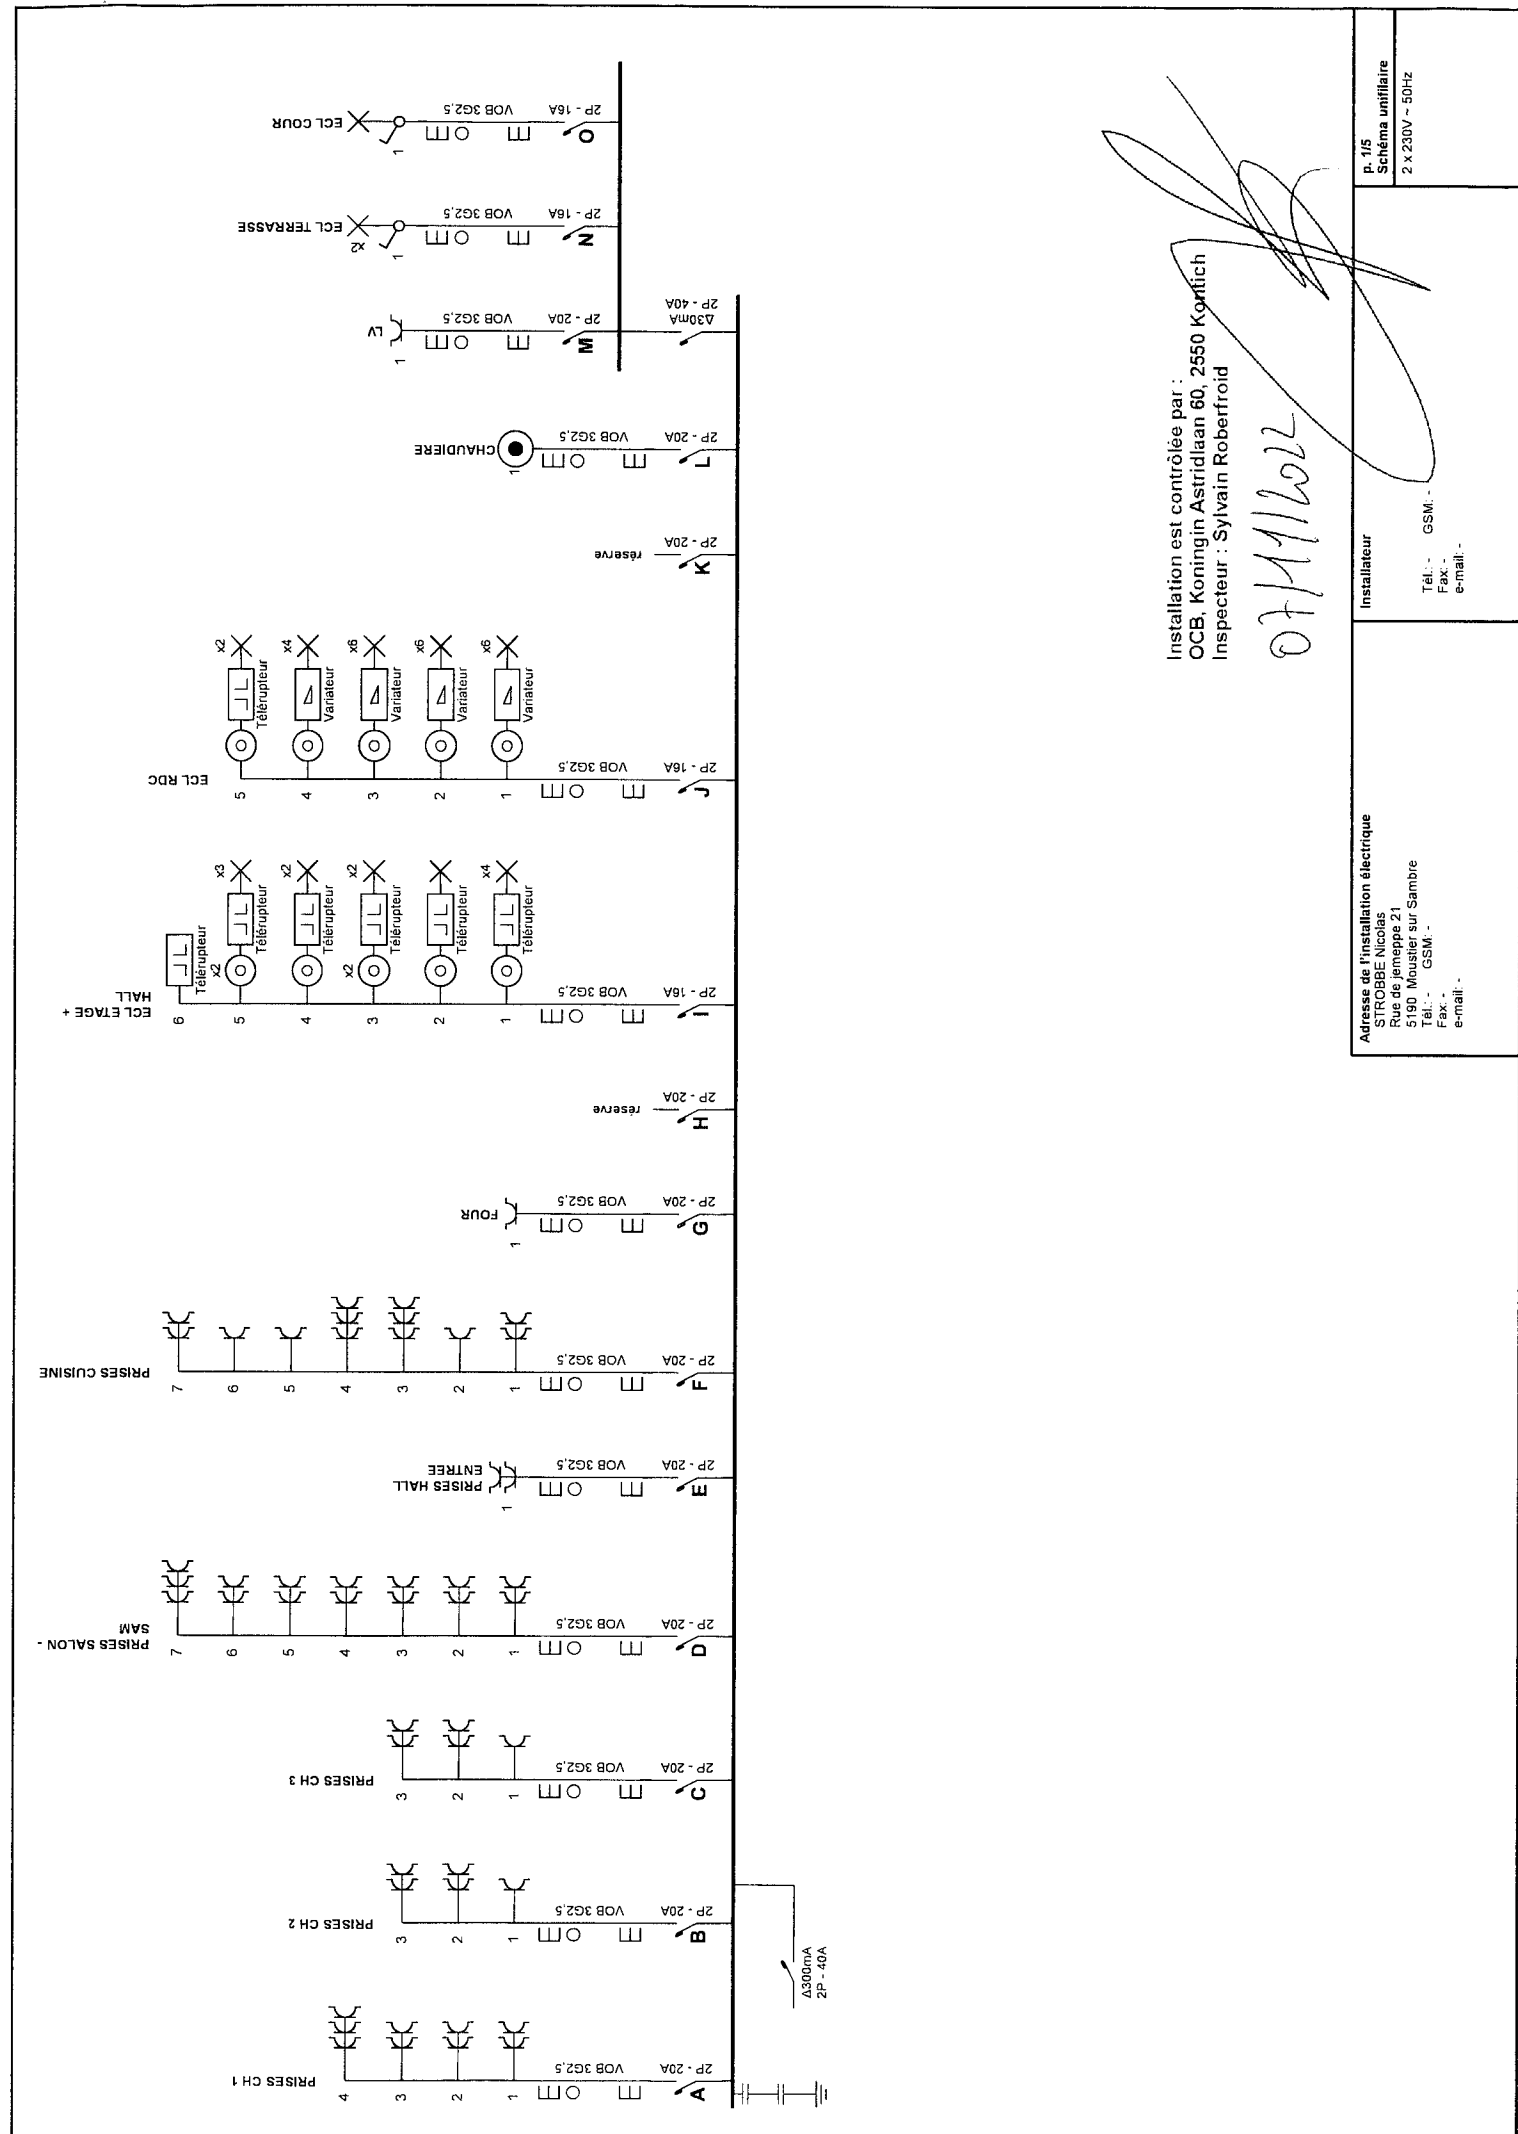

Installation est contrôlée par :
OCB, Koningin Astridlaan 60, 2550 Kontich
Inspecteur : Sylvain Roberfroid

07/11/2012

P. 115 Schéma unifilaire 2 x 230V - 50Hz	
Adresse de l'installation électrique STROBBE Nicolas Rue de Jeneeppe 21 5190 Mouslier sur Sambre Tél. : GSM : Fax : e-mail :	Installateur Tél. : GSM : Fax : e-mail :

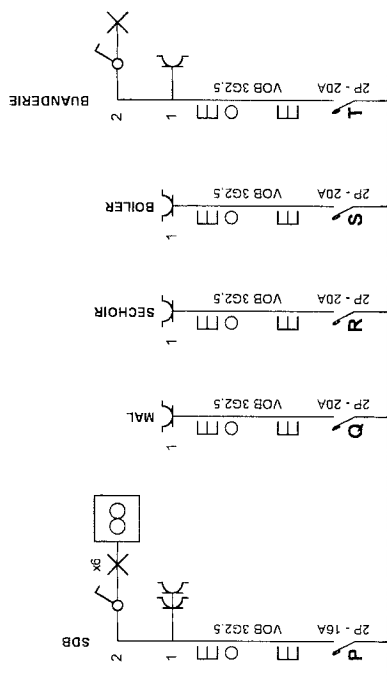

Installation est contrôlée par :
OCB, Koningin Astridlaan 60, 2550 Kontich
Inspecteur : Sylvain Roberfroid

Signature


Adresse de l'installation électrique
STROBBE Nicolas
Rue de Jemeppe 21
5130 Moustier sur Sambre
Tel. - GSM -
Fax -
e-mail -

Installateur

Tel. - GSM -
Fax -
e-mail -

P. 2/5
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Rez-de-chaussée

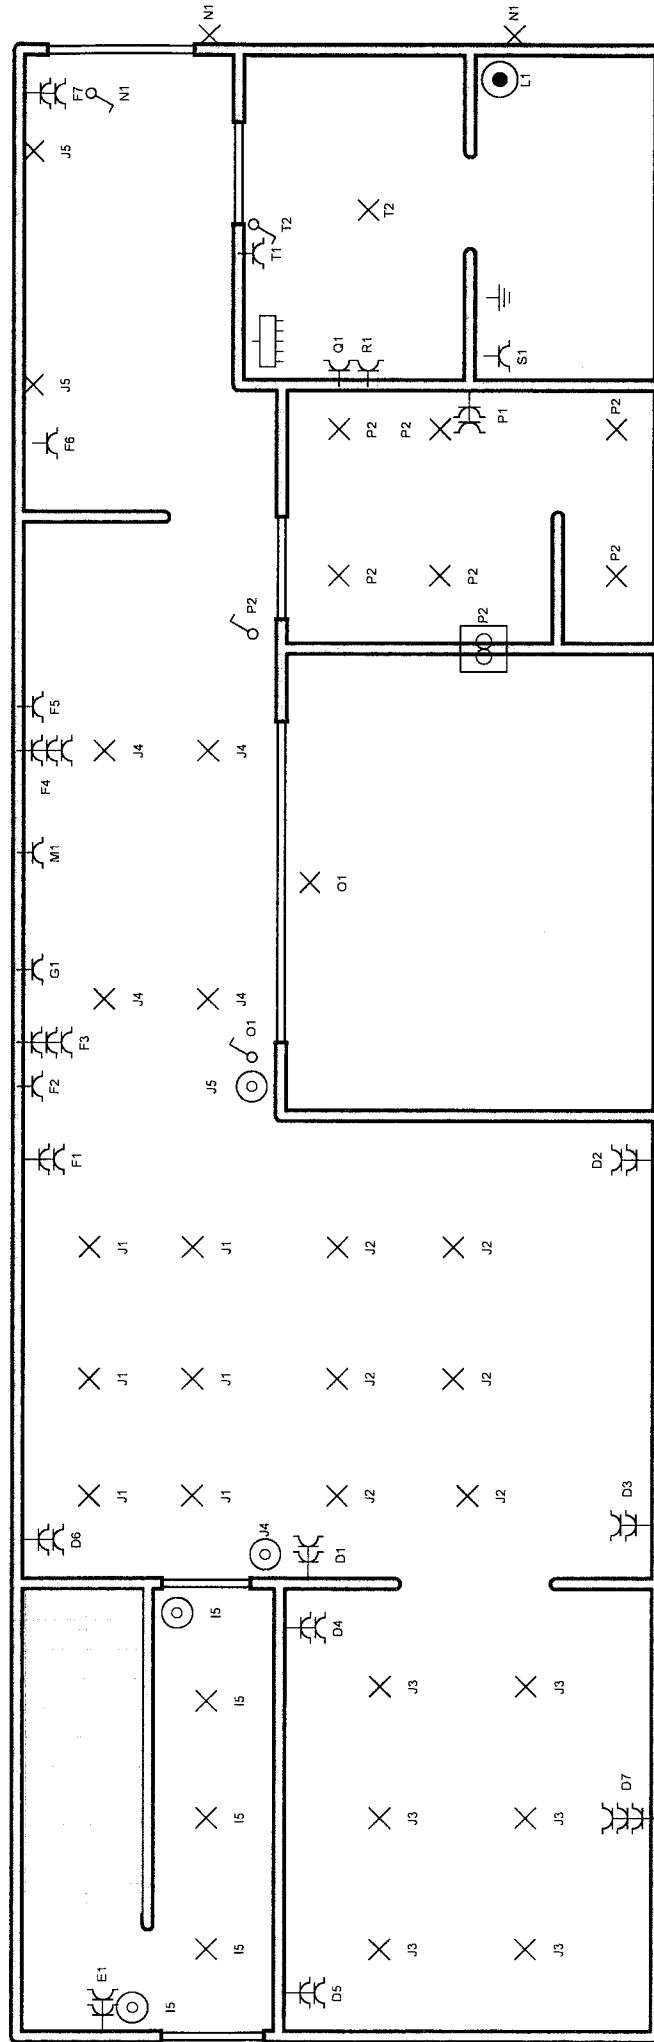

Installation est contrôlée par :
OCB, Koningin Astridlaan 60, 2550 Konfich
Inspecteur : Sylvain Roberfroid


Adresse de l'installation électrique
STROBBE Nicolas
Rue de Jeneppre 21
5150 Mousier sur Sambre
Tel. - GSM -
Fax. -
e-mail -

Installateur

Tél. - GSM -
Fax. -
e-mail -

p. 3/5
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

1er étage

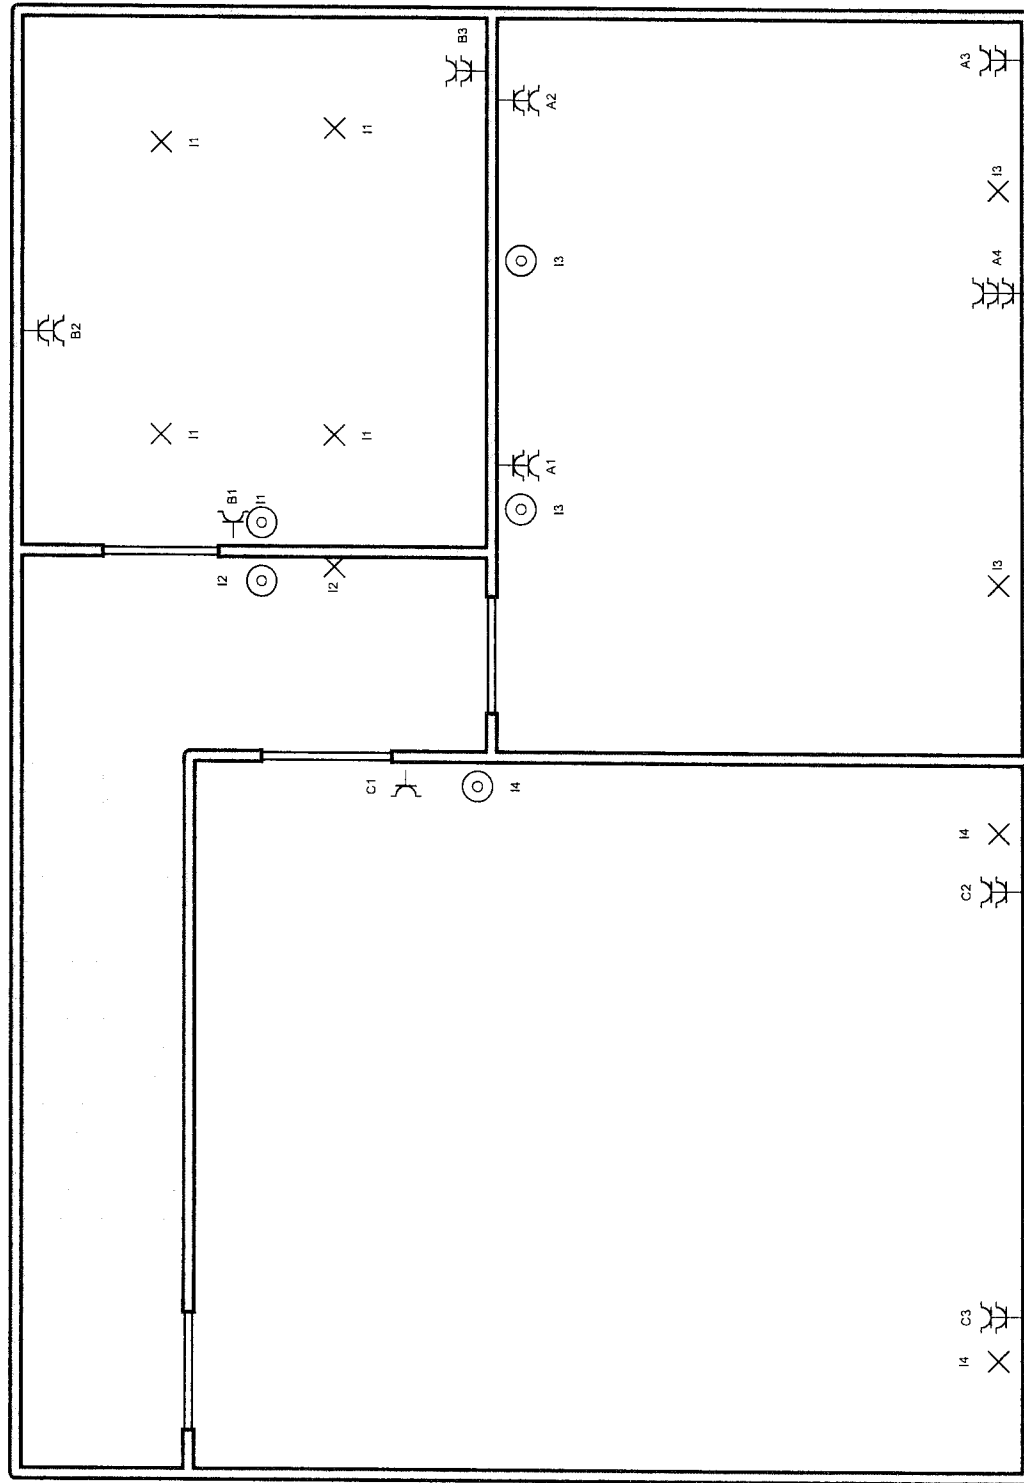

[Signature]

Installation est contrôlée par :
OCB, Koningin Astridlaan 60, 2550 Kontich
Inspecteur : Sylvain Roberfroid

Adresse de l'installation électrique
RUE ROBBE Nicolas
Rue de Jemeppe Z1
6190 Mousier sur Sambre
Tél. - GSM.
Fax - e-mail -

Installateur

Tél. - GSM.
Fax -
e-mail -

P. 4/5
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

A:	PRISES CH 1
B:	PRISES CH 2
C:	PRISES CH 3
D:	PRISES SALON - SAM
E:	PRISES HALL ENTREE
F:	PRISES CUISINE
G:	FOUR
H:	réserve
I:	ECL ETAGE + HALL
J:	ECL RDC
K:	réserve
L:	CHAUDIERE
M:	LV
N:	ECL TERRASSE
O:	ECL COUR
P:	SDB
Q:	MAL
R:	SECHOIR
S:	BOILER
T:	BUANDERIE

Adresse de l'installation électrique
STROBBE Nicolas
Rue de Jéneppe 21
5190 Moustier sur Sambre
Tél. - GSM. -
Fax -
e-mail: -

Installateur
Tél. - GSM. -
Fax -
e-mail: -
