



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61135900/00/NL/002



040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Galeipad 1 - 9000 Gent



Uitgevoerd op: vanaf
21/11/2022 tot 22/11/2022



Uitgevoerd door: OLIVIER FOULON (6681)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam Decat Energy Technics nv
Adres Handelsstraat 15- 8630 Veurne

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam Artes-Group NV
Adres Galeipad 1 - 9000 Gent

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam Decat Energy Technics nv
Adres Handelsstraat 15- 8630 Veurne

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID 100 127 145
Adres Galeipad 1 - 9000 Gent
EAN-code 541 448 860 021 778 586
Nr Teller 1105110416
Teller index dag 0
Teller index nacht 0
Type installatie HUISHOUDELIJKE Inst.

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Uitgiftedatum: 23/11/2022

1 / 8

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/06/2020
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd. - De verlichtingsarmaturen waren niet geïnstalleerd op het moment van onze controle. - De badkamer/doucheruimte was op het moment van onze controle nog niet geïnstalleerd/voltooid. - De foto's ter illustratie van inbreuken en opmerkingen worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief, de inbreuken en opmerkingen kunnen elders in de installatie worden herhaald.
Afwijkingen	- Geen

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	230
Aard van de stroom	Eenfasig
Type van aardelektrode	Aardingslus
Voedingsleiding - Type	XGB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm ²)	10
Aantal eindstroombanen	17
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	2


Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Q1	40	300	A

Beschrijving van de elektrische installatie

VB00.5

Plaats **Berging**

Aantal
differentieelstroominrichtingen **2**

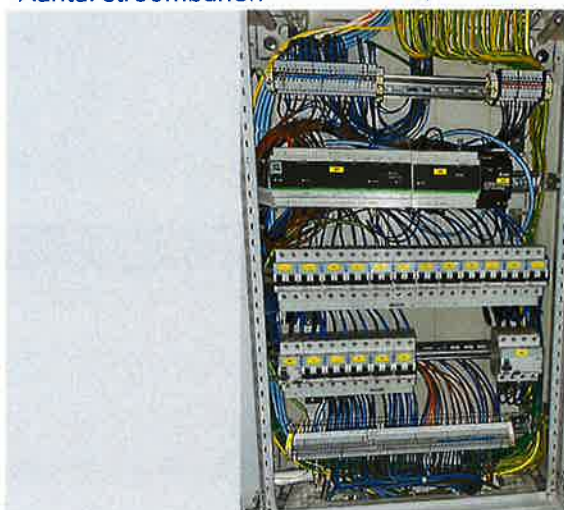Aantal stroombanen **17**

(Inwendige foto)

(Uitwendige foto)

Type of aarding **Aardingslus**
Waarde (Ω) **0.38**

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie	DECAT
Stroombaanschema - versie	1
Stroombaanschema - datum	21/11/2022
Eendraadsschema	Zie bijlagen
Situatieplan - referentie	DECAT
Situatieplan - versie	1
Situatieplan - datum	21/11/2022
Situatieplan	Zie bijlagen



RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.

Metingen en beproevingen

Spreadingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	0.38
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	278
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Niet getest
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Niet getest
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

Badkamer

- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar



BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 21/11/2047.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

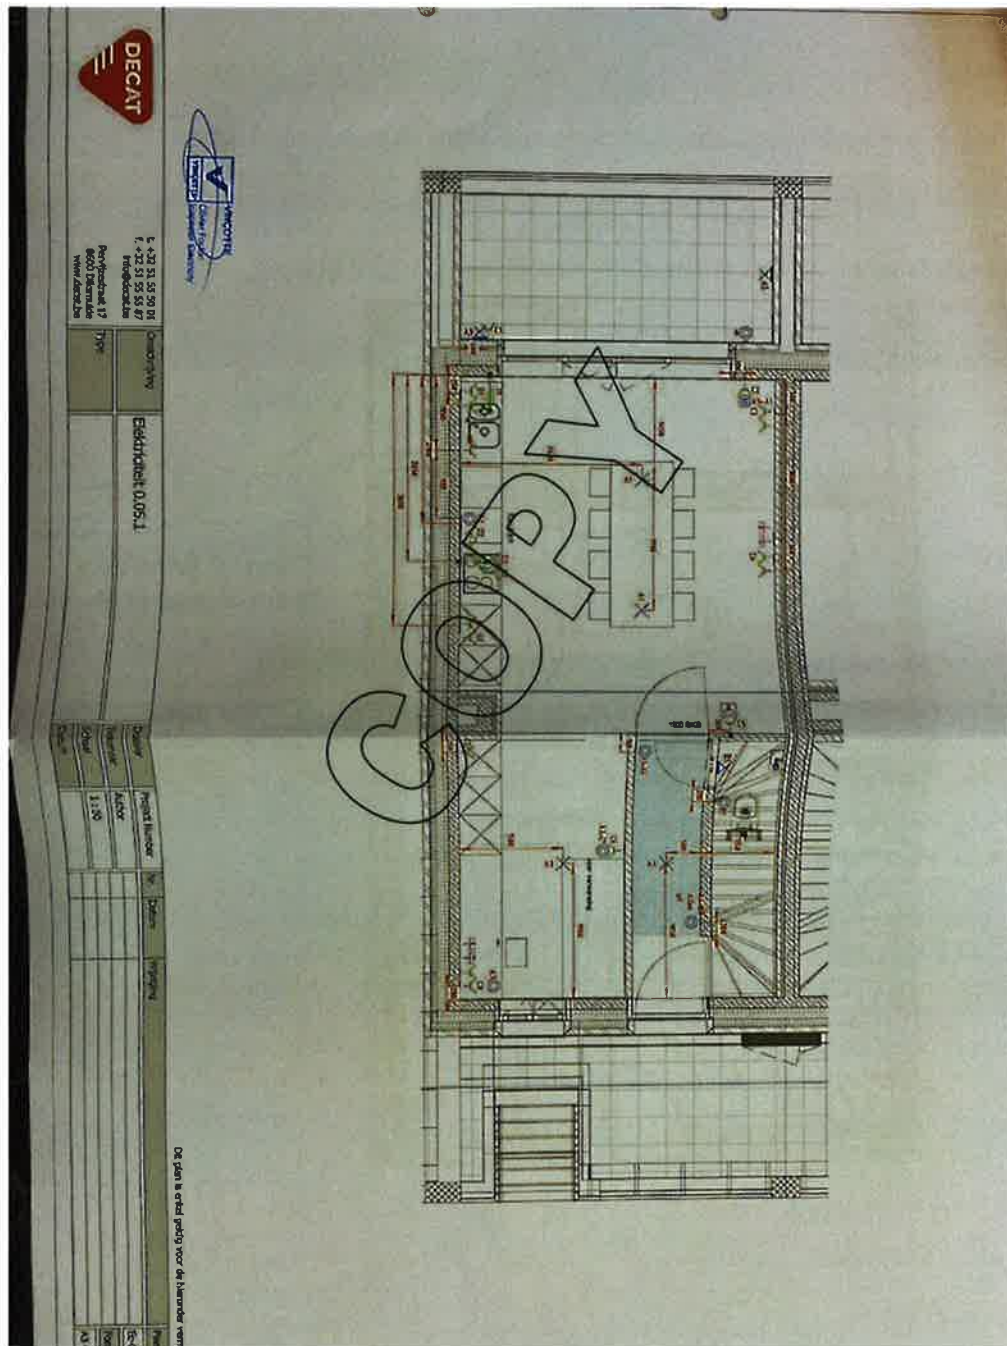


Foto situatieplan (2 / 2)


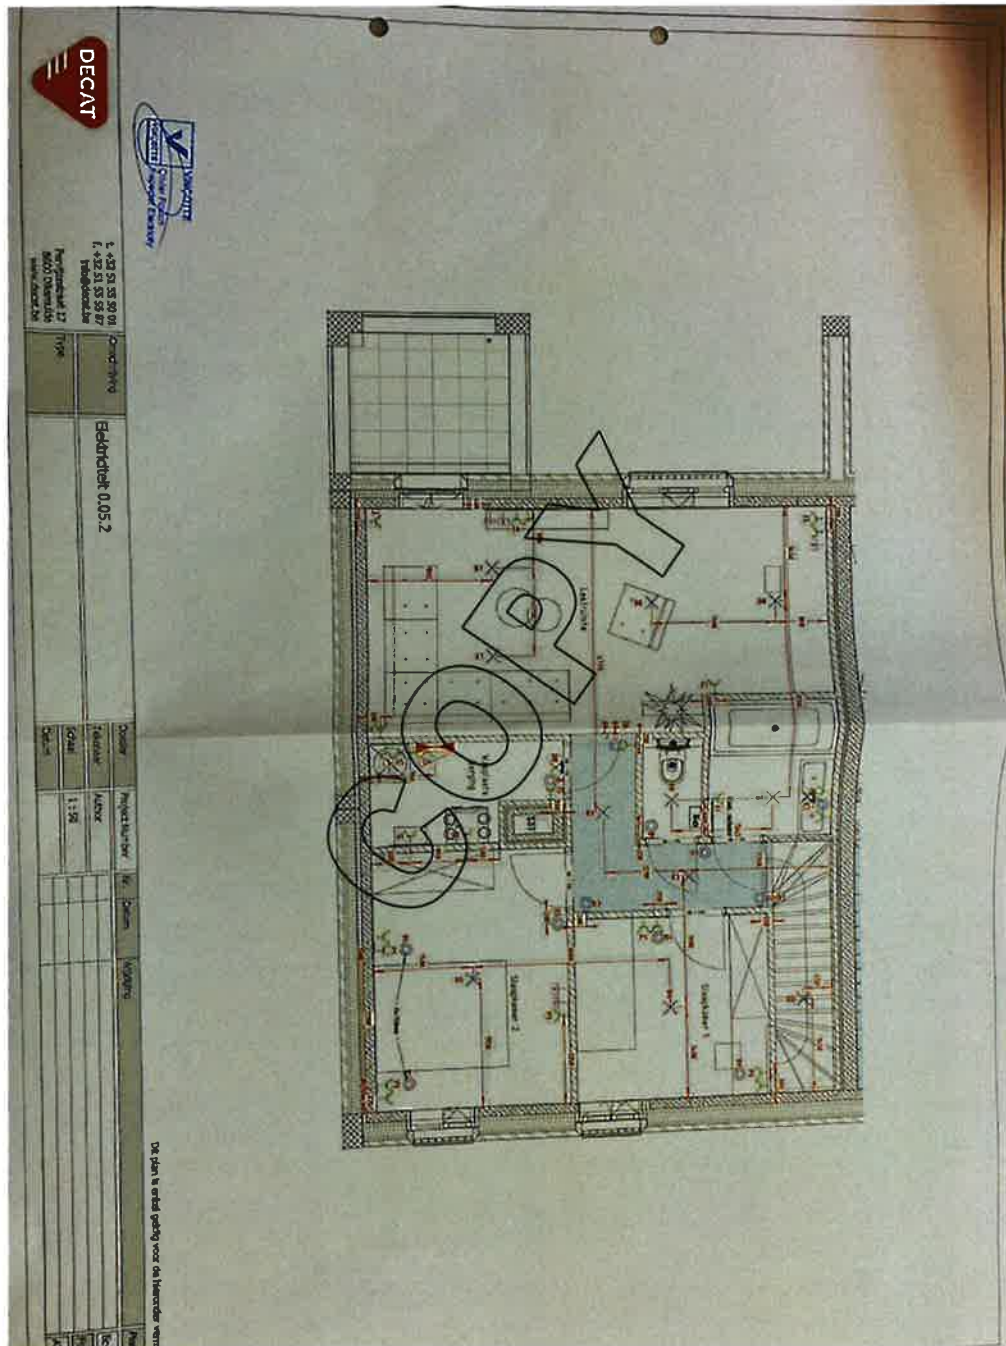


Foto van de eendraadschema's (1/1)




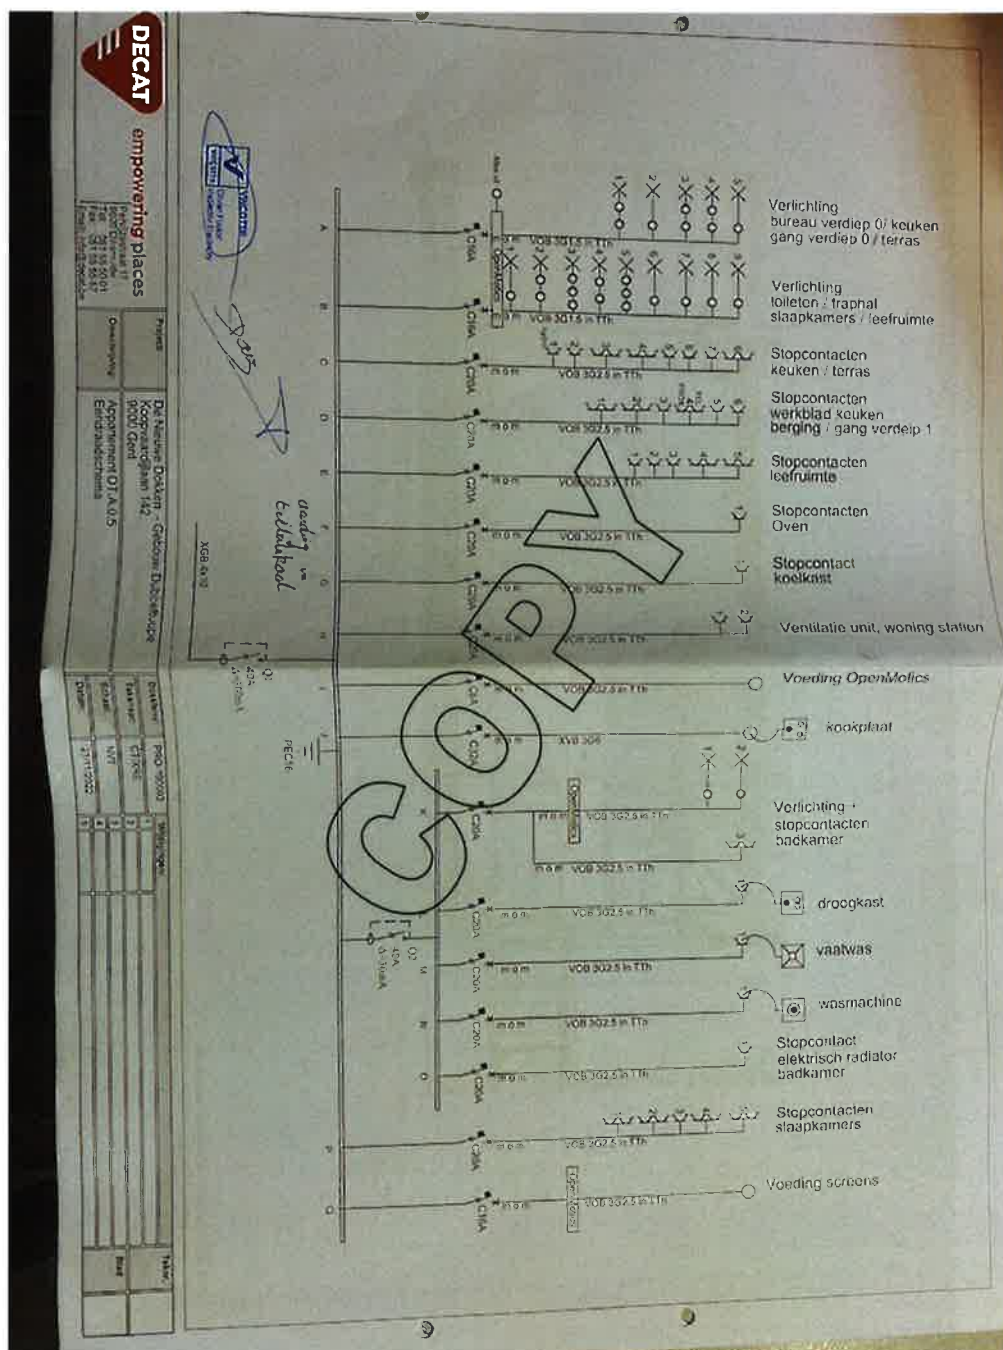

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61135900/00/NL/001

Foto situatieplan (2 / 2)

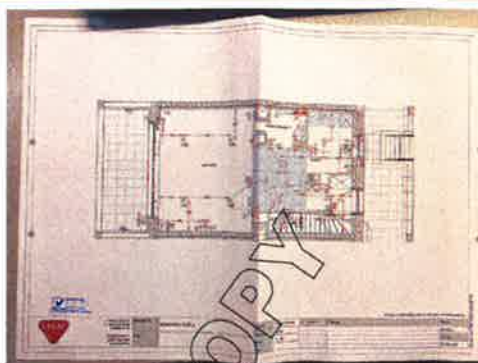

Uitgiftedatum: 23/11/2022


7 / 8



Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61135900/00/NL/001

Foto van de eendraadschema's (1 / 1)

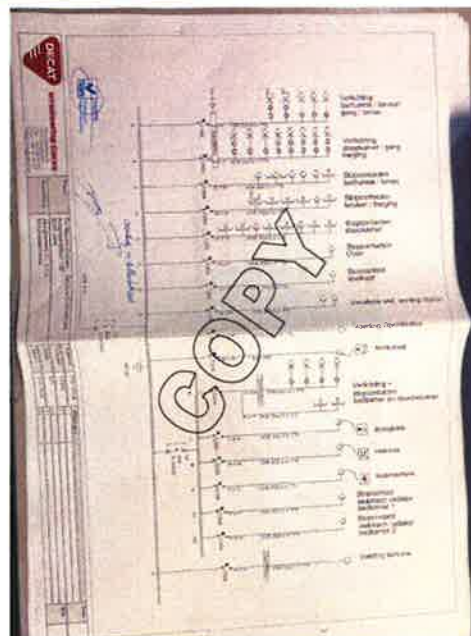

Uitgiftedatum: 23/11/2022

8 / 8



Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61135900/00/NL/002



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Gelocipad 1 - 9000 Gent

Uitgevoerd op: vanaf
21/11/2022 tot 22/11/2022

Uitgevoerd door: OLIVIER FOULON (6681)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam: Decat Energy Technics nv
Adres: Handelsstraat 15 - 8630 Veurne

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam: Artes Group NV
Adres: Gelocipad 1 - 9000 Gent

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam: Decat Energy Technics nv
Adres: Handelsstraat 15 - 8630 Veurne

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID: 100 127 145
Adres: Gelocipad 1 - 9000 Gent
EAN-code: 541 448 860 021 778 586
Nr Teller: 1105110416
Teller index dag: 0
Teller index nacht: 0
Type installatie: HUISHOUDELIJKE inst.

Uitgiftedatum: 23/11/2022

1 / 8



Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61135900/00/NL/002

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle: - Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum van de uitvoering van de installatie: - Vanaf 01/06/2020

Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.
De verlichtingsarmaturen waren niet geïnstalleerd op het moment van onze controle.

Informatie inhoud controle: - De badkamer/douchecabine was op het moment van onze controle nog niet geïnstalleerd/voltooid.
De foto's ter illustratie van problemen en opmerkingen worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief. Problemen en opmerkingen kunnen elders in de installatie worden gevonden.

Afwijkingen: - Geen

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V): 230
Aard van de stroom: Enkelfase
Type van aardelektrode: Aardingsstus
Voedingsleiding - Type: WGB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm²): 10
Aantal eindstroombanen: 17
Type van het aardverbindingssysteem: TT
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A): 40
Geplaatste (elg.) differentieelstroomrichtingen: 2

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Q1	40	300	A

NR 1 = A. 05
N. 0

Uitgiftedatum: 23/11/2022

2 / 8

