



C I B
N° 49541

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Bruxelles : 126, b°12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles
Hainaut : 188 Rue des Pierres - 7020 Maisières
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse
T.V.A. BE 0406.671.312 Compte Bancaire : 340-0298168-28 cibic@skynet.be



Tél : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78
Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

CONFIDENTIEL

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT

Rapport N° : 14071402	Personne responsable de l'exécution du travail (Nom-Prénom) : SPRL VDMB.
Date du Contrôle : 140714	N° TVA/N° C. Ident. : 0809862106
Propriétaire (Nom-Prénom) :	Adresse de l'installation : Rue Claire Dumont
Adresse :	7321 Nanfmaison

1) REFERENTIELS : - R.G.I.E. - Procédure interne : PRO-INS-E-10

2) TYPE DE CONTROLE :

- ☒ Examen de contrôle avant mise sous tension d'une installation électrique BT et TBT domestique.
- ☐ Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution.

3) TYPE D'INSTALLATION :

☒ Unité d'habitation ☐ Parties communes ☐ Autres : , soumise à ☒ l'Art.86 ☐ l'Art.87 du RGIE.
Distributeur : Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 230/400 V.

Alimentation tableau principal : EXUB 4x16 mm². Protection raccordement : 40 A. In max. à prévoir).

Colonne d'alimentation : EXUB 4x16 mm². Interr-Sect. Général : 40 A.

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 22 RE 230 Ω RIGEN 0.10 MΩ.

Type prise de terre ☒ boucle ☐ piquets -

Différentiels	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés
	40	3	0.3	Tous	40	3	0.03	Nc V				

4) DESCRIPTION DE L'INSTALLATION :

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
ACND	EXUB 16A/13kA	2.5			
BDEIKL	EXUB 20A/13kA	2.5			
DESV	EXUB 20A/13kA	2.5			

5) MANQUEMENTS :

NEANT

6) NOTES :

- Le différentiel général : ☐ était plombé. ☐ n'a pu être plombé. ☒ a été plombé. ☐ n'est pas plombable. ☐ absence de différentiel.
- Les schémas : ☒ ont été signés. ☐ n'ont pas été signés. ☐ absence de schémas.
- Installation ☐ plomberie ☐ sanitaire : ☐ non réalisée(s) au jour du contrôle. ☐ Liaisons équipotentiels en attente. A connecter lors de la réalisation.

7) CONCLUSION :

☒ - L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 14072036

☐ - L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

☐ - Dans le délai d'un an à dater de ce jour, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès verbal sera envoyée conformément à l'Art. 276.02 du RGIE à l'Administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

☐ - Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier. Le présent document ne valide pas la mise sous tension ou le renforcement de puissance de l'installation visitée.

Nom/signature de l'inspecteur
Pour CIB

Date d'émission :

Nom/signature du demandeur
Pour réception

Client :

INSTALLATEUR : **SVD**
P
R
MB
 VDMB sprl
 Rue de la station 73
 6042 Lodelinsart
 Tel : Régis 0494/276.120
 n° ent : 0809.861.116

ORGANISME DE CONTROLE

C.I.B. BONDROIT

14-07-2011

☎ 0472 900 092

A	16A	Éclairages rez de chaussée
B	20A	Prises Sallon rez de chaussée
C	16A	Chambre 2 + Dressing
D	20A	Prises Bureau
E	20A	Hotte
F	20A	Chauffage Chambre
G	20A	Chauffage bureau
H	20A Tetra	TQ Elec
I	20A	Appoint
J	6A	Alarme
K	20A	PPT
L	20A	Four
M	20A Tetra	Accu VFMI40
N	16A	Baignoire hydromassage
O	20A	Sèche Serviette SDB
P	16A	Boiler
Q	20A	Mal
R	20A	Séchoir
S	16A	Éclairage SDB
T	20A	Groupe Hydro
U	20A	Chauffage sol
V	20A	Lave vaisselle

dupont-khijji - Nomenclature

14/07/2011

Client :

INSTALLATEUR :

VDMB sprl

Rue de la station 73

6042 Lodelinsart

Tel : Régis 0494/276.120

n° ent : 0809.861.116


SVD
P
RMB

ORGANISME DE CONTROLE

C.I.B. BONDROIT

14-07-2011

0472900 092

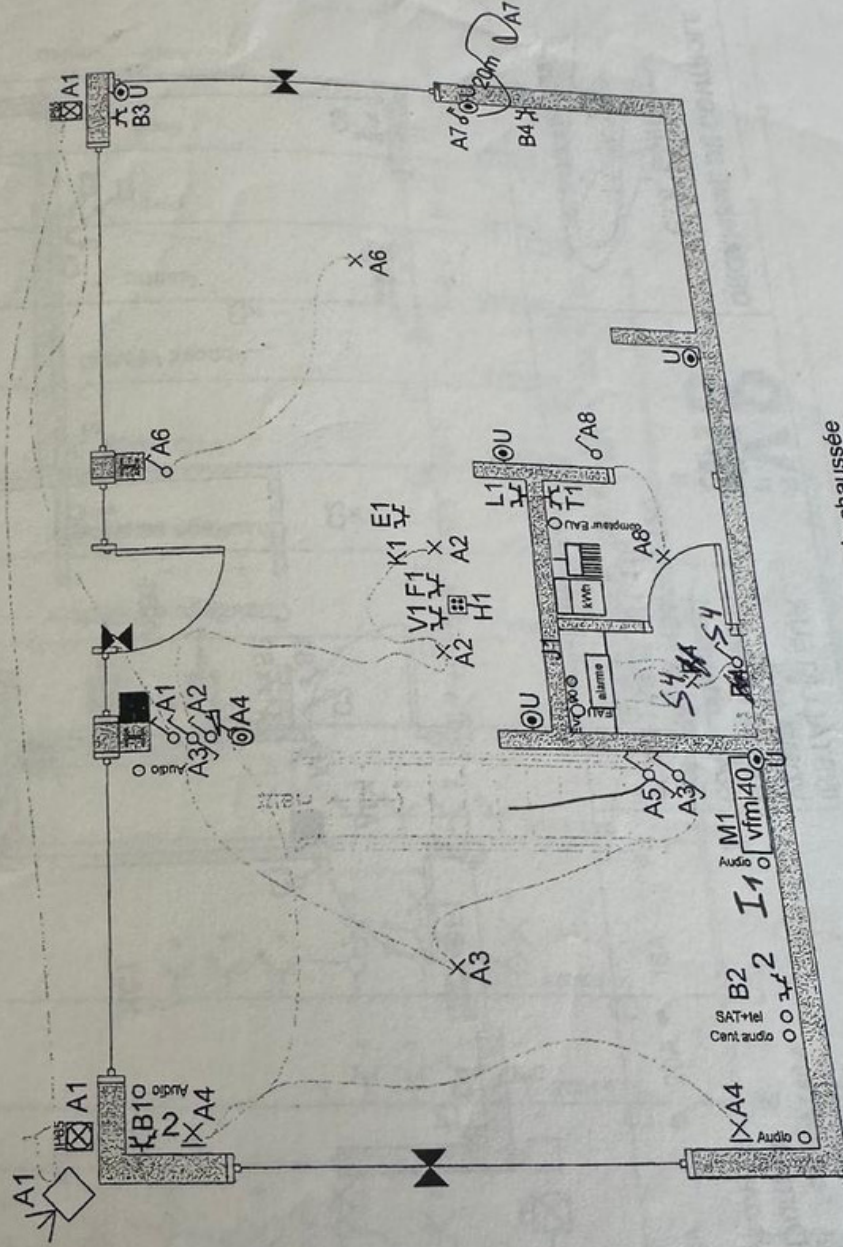

14/07/2011


dupont-khilji -Rez de chaussée

ORGANISME DE CONTROLE
C.I.B. BONGROU
14/07-2011
0472 900 092

**VD
LMB**

INSTALLATEUR :
VDMB sprl
Rue de la station 73
6042 Lodelinsart
Tel : Régis 0494/276.120
n° ent : 0809.861.116

Client :

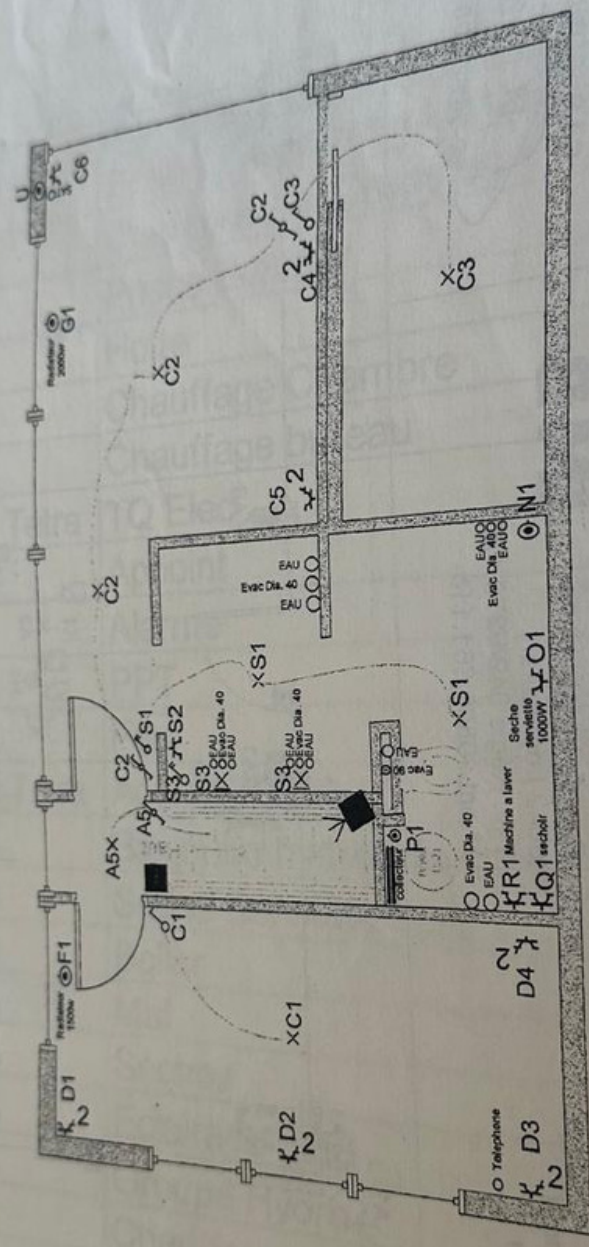


dupont-khilji -étage 1

14/07/2011

14/07/2011


Client : 	INSTALLATEUR : VDMB sprl Rue de la station 73 6042 Lodelinsart Tel : Régis 0494/276.120 n° ent : 0808.861.116	ORGANISME DE CONTRÔLE C.I.B. BONDROIT 14-07-2011 0472 900 092

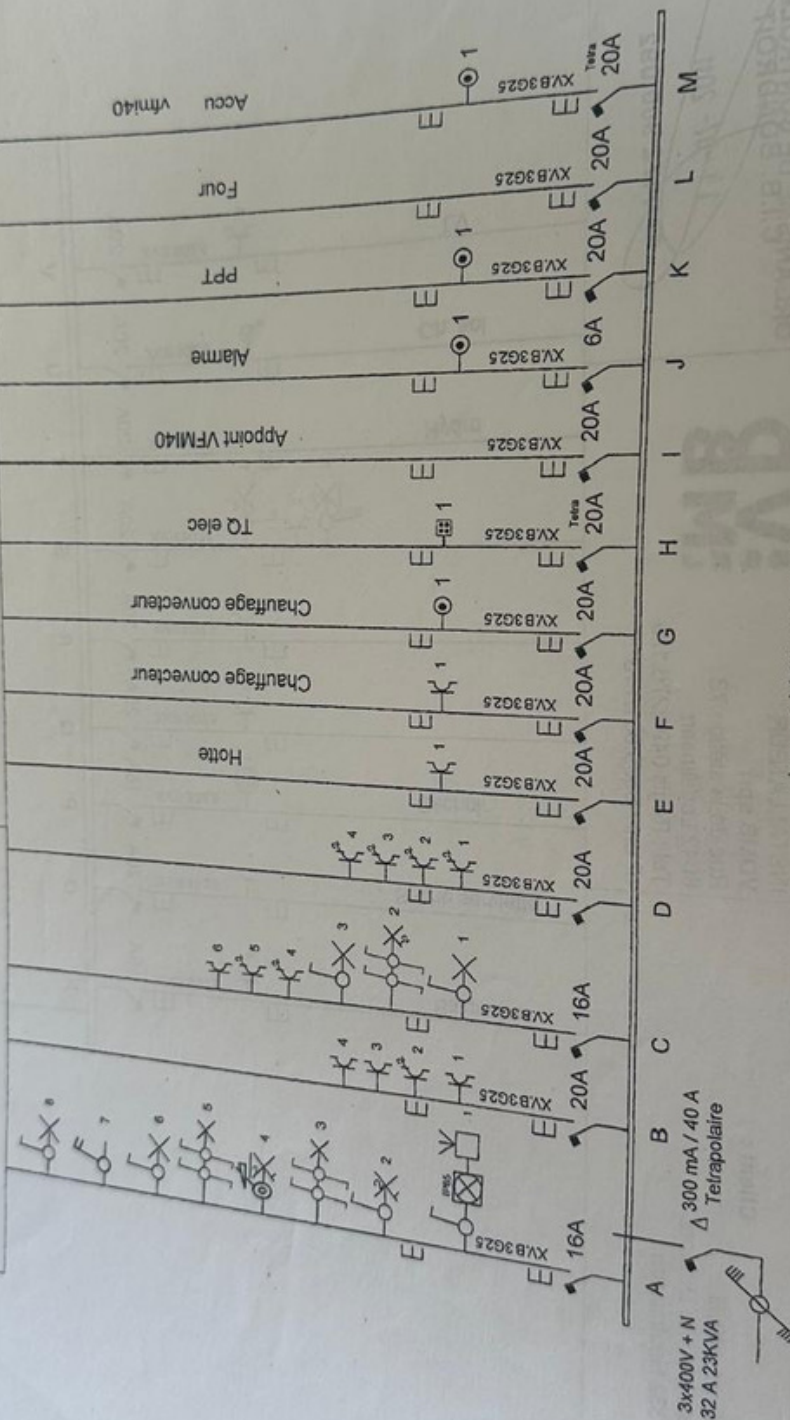

dupont-khijji - Unifilaire

14/07/2011

Client :	INSTALLATEUR : VD PR MB Rue de la station 73 6042 Lodélinart Tel : Régis 0494/276.120 n° ent : 0809.861.116	ORGANISME DE CONTRÔLE : C.I.B. BONBROIT 13-07-2011 03 03 72 900 092
----------	--	--

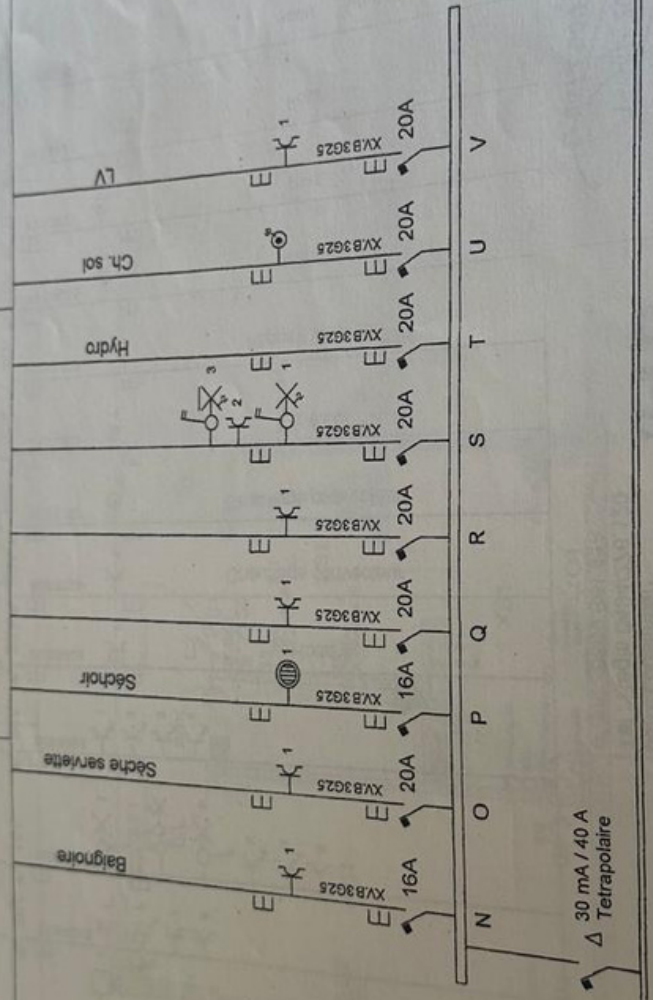

14/07/2011

dupont-khijji -Unifilaire 2
