

Resp. client:
N° commande.:
N° client:
Pers. cont.:
Tél.:
GSM:

Attestation de conformité de
l'installation gaz.



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: TL06
N° rapport: 6414123
N° rapp. prov.:
Date: 11/02/2025



Département: REC

RAPPORT DE L'ETANCHEITE D'UNE TUYAUTERIE DE GAZ.
(exécuté suivant procédure QPRO/REC/001, §7.3)

Appareil/Install. ID: 1600 L 36801
Lieu de contrôle: ROUTE DE JENEF 7 PORCHERESSE (NAM.) 5370
Date du contrôle: 11/02/2025
Base du contrôle: AGW 7 JUILLET 2005 art.36
Contrôleur: TAFFAREL ALEXANDRE
Propriété de :
Personne présent:

I) GENERALITES

Référence réservoir: R 36801

Société: PRIMAGAZ

Type de gaz: ☒ propane

☐ butane

Genre de contrôle:

☐ mise en service

☒ contrôle périodique

Installation :

☒ Résidentiel
☐ Nouveau

☐ Industriel (70 kW)

☐ Extension

☒ Existante

☐ Temporaire/mobile

☐ Remplacement chaudière

II) EXAMEN

Contrôle de l'étanchéité d'une tuyauterie visible et ces connexions. L'examen se limite aux parties visibles de l'installation et exclut les parties cachées.

1) Description:

1) Nature de l'installation

☒ La tuyauterie propane – butane qui se trouve entre le robinet principal situé sur le réservoir jusqu'au robinet d'arrêt placé avant l'appareil d'utilisation.

☒ Tuyauterie intérieur: - Diamètre: 22 mm; - pression de travail: 37 mbar: ☒ Cuivre ☐ acier ☐ flexible

☒ Tuyauterie extérieur: - Diamètre: 15 mm; - pression de travail: 1.5 bar : ☒ Cuivre ☐ acier ☐ flexible

2) Type de connexions: ☒ assamblage filetés ☒ raccords à compression ☒ raccords vissés
☐ soudés ☒ accessoires à sertissage.

3) Des appareils connectés.

☒ Appareil: CHAUDIERE ☒ Marque: VAILLANT ☒ No: ...312164N1 ☒ Type: C ☒ Cat: I3P

☒ Appareil: CUISINIERE ☒ Marque: FOX ☒ No: 024410006 ☒ Type: A ☐ Cat:

1/2

- ☒ Chaque appareil d'utilisation est équipée d'un robinet d'arrêt.
- ☐ Tuyaux inutilisés sont munis d'une soupape d'arrêt à l'arrêt.
- ☒ Flexible: - ☒ 0,5 m pour la connexion d'appareils fixes. ☒ date de validité: EN14800
- ☐ 2 m pour la connexion d'appareils transportable. ☐ date de validité:

2) Epreuve d'étanchéité

- ☒ L'étanchéité de la tuyauterie a été inspecté à leur pression de service maximale.
- ☒ L'étanchéité de la tuyauterie a été inspecté en utilisant un manomètres de contrôle.
- ☒ Toutes les connexions visibles ont été vérifiées au moyen d'une solution savonneuse.

3) Observation:

- ☒ Aucune fuite, perte de pression a été constatées pendant l'examination.
- ☐ On a constaté des fuites, une perte de pression pendant l'examination.

III) REMARQUES

IV) INFRACTIONS

CONCLUSION

- | | |
|--|---|
| ☒ On n'a pas constaté des fuites | ☐ On a constaté des fuites |
| ☐ L'installation est approuvée. | ☐ L'installation est désapprouvée. |
| ☐ L'installation peut être utilisée. | ☐ L'installation ne peut pas être utilisée |
| ☐ L'installation est conforme aux prescriptions. | ☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions. |
| ☐ Il est néanmoins nécessaire de remédier le plus vite possible à l' (aux) infraction(s) mentionnée(s). | |
| ☐ Un contrôle supplémentaire après réparation est requis. | |


Pour le Directeur Technique,




Le contrôleur

24E de Jemeffe 7

6929 Ponchesse

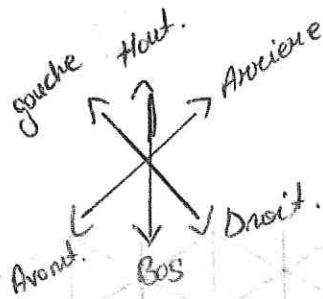

Papier Isométrique

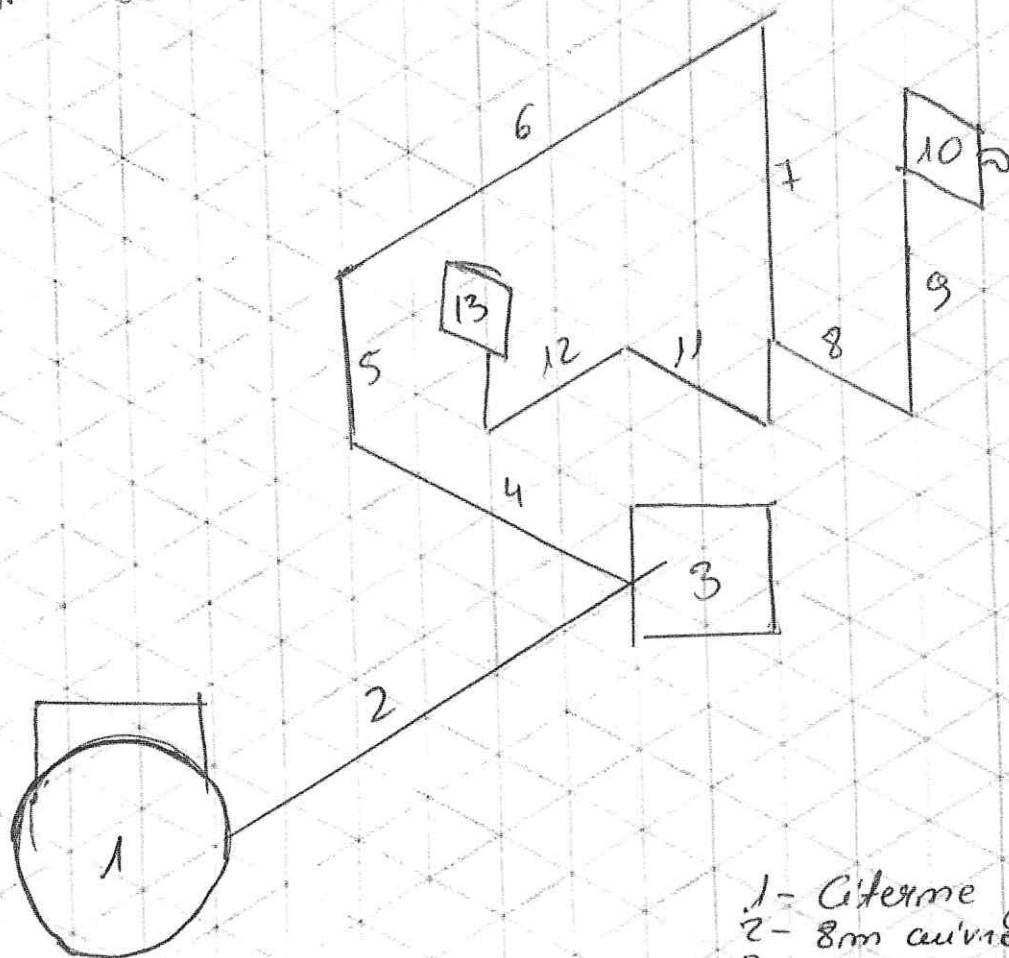

Ruchi Kolec

IVA : BE-1000-883-117

Rue de Stocche 3 8644 Enneton

0478 640843

- 1- Citerne 002
- 2- 8m cuivre 15 ϕ
- 3- coiffe de 2m de détente.
- 4- 2m30 cuivre 22 ϕ
- 5- 1m20 cuivre 22 ϕ
- 6- 4m50 cuivre 22 ϕ
- 7- 2m cuivre 22 ϕ
- 8- 30cm cuivre 22 ϕ
- 9- 80cm cuivre 22 ϕ
- 10- chaudière 24 kW
- 11- 3m 80 cuivre 22 ϕ
- 12- 3m cuivre 22 ϕ
- 13- gazinière

Mathslibres.com

PIJPLEIDINGENATTEST - ATTESTATION DES TUYAUTERIES

VOOR INSTALLATIES GEVOED MET COMMERCIEEL BUTAAN OF PROPaan VOLGENS DE NORME NBN D 51-006 - POUR INSTALLATIONS ALIMENTÉES EN BUTANE OU PROPANE COMMERCIAL SELON LA NORME NBN D 51-006

Reservé à l'installateur de l'installation à gaz

N° registre de circumence

N° TVA

Ref. De la location

Voorbehouden aan de installateur van de gasinstallatie

N° handelsregister

N° BTW

Ref. Locatie

Concerne des installations alimentées en butane ou propane commercial

Attestation des tuyauteries

(selon la norme belge NBN D 51-006)

Date 10-2-18

Le signataire, (nom) KRAHI KOLEC

(prénoms) KOLEC

Résidence Exmetem-sur-Biert

Rue Rue de Stocche 3

Agissant en tant qu'installateur déclare que l'installation dont schéma ci-contre réalise par mes soins et/ou

Rue Rue de jemeffe n° 7

Porcheresse

installateur (nom et/ou société)

Primer - G42

et conforme aux dispositions de la norme belge NBN D 51-006

Signature de l'installateur

Signature de l'exploitant pour la réception de l'installation. Celui-ci s'engage à demander une nouvelle installation pour toute extension future de l'installation

Je certifie schéma (schéma) de l'installation

Setteft installaties gevoed met commercieel butaan of propaan

Pijpleidingenattest

(volgens de Belgische norm NBN D 51-006)

Datum

B. Handelsregister

(Vernamen)

Woning

Straat

Ik verklaar als installateur verklaart dat de installatie waarvan schéma hierboven getekend werd het een die gelegen is te

Straat

te

Uitgevoerd door (naam en/of firma)

Overschikt naar de bepalingen van de Belgische norm NBN D 51-006


Handtekening van de installateur

Handtekening van de exploitant voor het goede beheer van de installatie. Deze verplicht zich ertoe voor een eventuele latere uitbreiding een nieuw attest aan te vragen

Ik certifice schéma (schéma) van de installatie

SCHETS VAN DE INSTALLATIE - SCHÉMA DE L'INSTALLATION

- Maak een schets van de installatie (in isometrisch perspectief)
- Duid de plaats en de identificatie van elk door u geplaatst toestel aan, het soort instellen met merk, type, vermogen
- Duid de werkelijke lengte (L) van elk onderdeel, muten-aansluit, diameter en de gebruikte toebehoren
- Schematisation de l'installation (en perspective isométrique)
- Indication de l'emplacement et de l'identification de chaque appareil placé par vos soins, sorte, type puissance
- Indication de la longueur réelle (L) de chaque tronçon, matériau, diamètre et des accessoires

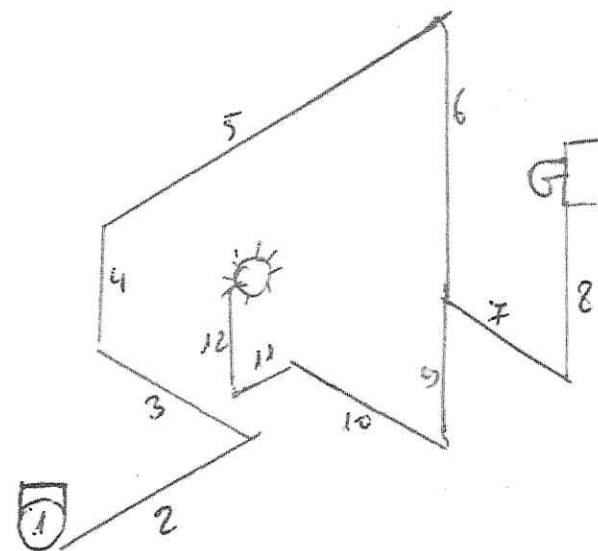

invers ou verso!
