

huizing rijk 40k
11/07/23
on

Activiteit

Datum:

Klant:

Adres:

Garantie omvormer: 10 jaar garantie. Indicatieve opbrengstfactor PV-installatie: 812 kWh/kWp

Open circuitspanning string 1: 240

Aantal panelen string 1: 10

Open circuitspanning string 2:

Aantal panelen string 2:

Open circuitspanning string 3:

Aantal panelen string 3:

Open circuitspanning string 4:

Aantal panelen string 4:

Panelen spanning/ string configuratie

OK / ~~NOK~~

Werkt de omvormer naar behoren

OK / ~~NOK~~

Dak afwerking

OK / ~~NOK~~

Overige afwerking

OK / ~~NOK~~

Aankomst-uur:

Vertrek-uur:

Nummerplaat(en):

Aanwezige techniekers:

Elisei

Bij vroeger vertrek, vertrek-uur achter naam zetten

Opmerkingen:

ilusmart werkt niet omdat de klant een mechanische meter heeft.

Geplaatste materialen:

- ☐ 9.6kWh AC BAT. 3KVA - SN:
- ☒ iLusmart - SN:
- ☐ PIDbox - SN:
- ☒ Omvormer(s) - SN:
- ☐ UTP Kabel 2m:
- ☐ UTP Kabel 10m:
- ☐ UTP Kabel 20m:
- ☐ UTP Splitter:
- ☐ Powerline:
- ☐ Andere:
- ☐ Omvormer verbonden met het internet

Ik verklaar bij deze dat de werken volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd en alles netjes werd afgewerkt en achter gelaten.

Voor akkoord,

Naam plaatter:

Klant

SCHEMA PV-INSTALLATIE

INSTALLATIE-ADRES:

GROEN & RANT 218

3001 HICKLEE

EAN: 541 44.....

HANDTEKENING EIGENAAR:

PO/Enrich

STEMPEL CONTROLE-ORGANISME:

Solarkabel (DC):

- Type: ☒ Cca
☐ Dca
☐ Eca
- Sectie: 6 mm²
- Plaatsingswijze:

Panelen:

- 
 • Aantal: 70

 • Merk: SLAN POWER
 • Type: PG BLK
 • Vermogen: 405 Wp
 • Strings: 1

Omvormer(s):

- Aantal:
 • Merk: SMA
 • Type: SB3.0-1AV41
 • P AC max: VA (totaal)
 • S/N: 3008414727

Voedingskabel (AC):

- Type: ☒ XVB / ☐ VOB / ☐
- Sectie: 3 G 6 mm²
- Plaatsingswijze:

☐ Groenestroomteller:

- ☐ **Productiemeter:**
- Geplaatst: ☐ ja ☐ neen

Productiemeter:

- Geplaatst: ☐ ja ☐ neen
 • Merk:
 • S/N:
 • Klasse: / MID:

Bijkomende differentieel: ☐ ja ☐ neen

- $I_2 = 40 \text{ A} / 120 = 30 \text{ mA}$
☐ 2P / ☒ 4P

Algemene differentieel:

- $I_L = 40 \text{ A} / \Delta I = 300 \text{ mA} / \text{Type A}$
☐ 2P / ☒ 4P

Weerstand R_2 = Ω

I_n teller = 40 A
Spanning = 220


INSTALLATEUR:

VERISOL BVBA
Klaverbladstraat 12
3560 LUMMEN


HANDTEKENING INSTALLATEUR:

Referentie / versie:
Datum: / / 20.....

1. Aarding	
2. Automatische zekering	
3. Bestaande elektrische installatie	
4. Differentieelzekering	
5. aardlekschakelaar	
6. Hoeveelheid kabels	
7. Omvormer	
8. Kabel in buis	
9. Kabel ingewerkt in de muur	
10. Kabel op de muur	
11. Kabel verzinken in de muur	
12. kWh meter	
13. Ondergrondse kabel	
14. Stopcontact	
15. Waterdicht stopcontact	
16. Zekeringkast - verdeelbord	
17. Zonnepaneel	

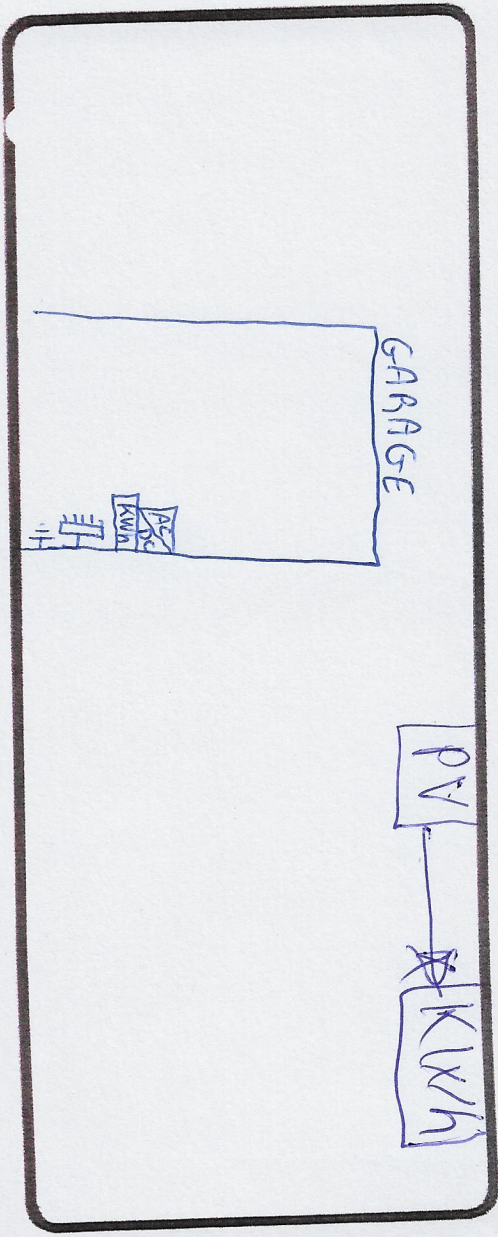

44/46

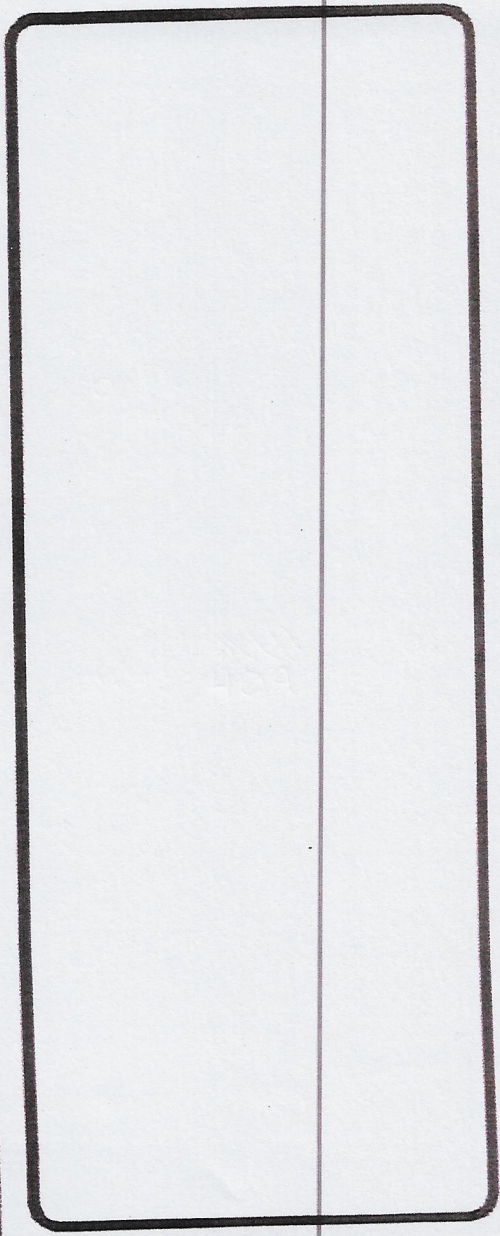

Situatieschema

Klaaromzet

2022-12-25

Klant

FRANCOIS Dieckx

Eenhuur

541448860013058214

Adres

GROENSTRAAT 219

3001 Heverlee

verisol

zonder twiifel de betrouwbaarste

Klaverbladstraat 12

3560 - Lummen

Telefoon: +32 (0)3 29 45 76

info@verisol.be

www.verisol.be
