

Rapport n° : / /
N° client société distributrice :
N° compteur :
Index I :
Index II :

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	Appt 5
Date	
Signature	



Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant : RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / 230 et 276, garde

Complément au rapport n°
Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage / Modification de tension d'alimentation
Type de locaux :
Lieu d'inspection :
Propriété de :
Mandant :
Installateur :
TVA : carte ID : Délivré à : Date :
Inspecteur : Date d'inspection : 20/11/09

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V / 3 x 230 V / 3N 400V Protection max : Commutateur position :
Protection principale : Disj. : Interrupteur / sectionneur :
Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : nombre de conducteurs : diamètre : mm²
Câble de raccordement au réseau : type de câble : nombre de conducteurs : diamètre : mm²
Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : mm² Résistance de dispersion : Ω
Nombre de tableaux : Nombre de circuits terminaux : Résistance d'isolement général : MΩ
Interrupteur différentiel : Général : Supplémentaire :
Description : voir les schémas en annexe

NOTES


La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.
La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

INFRACTIONS


CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.
L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.
Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.
La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 20/12/2009, ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.
L'installation ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

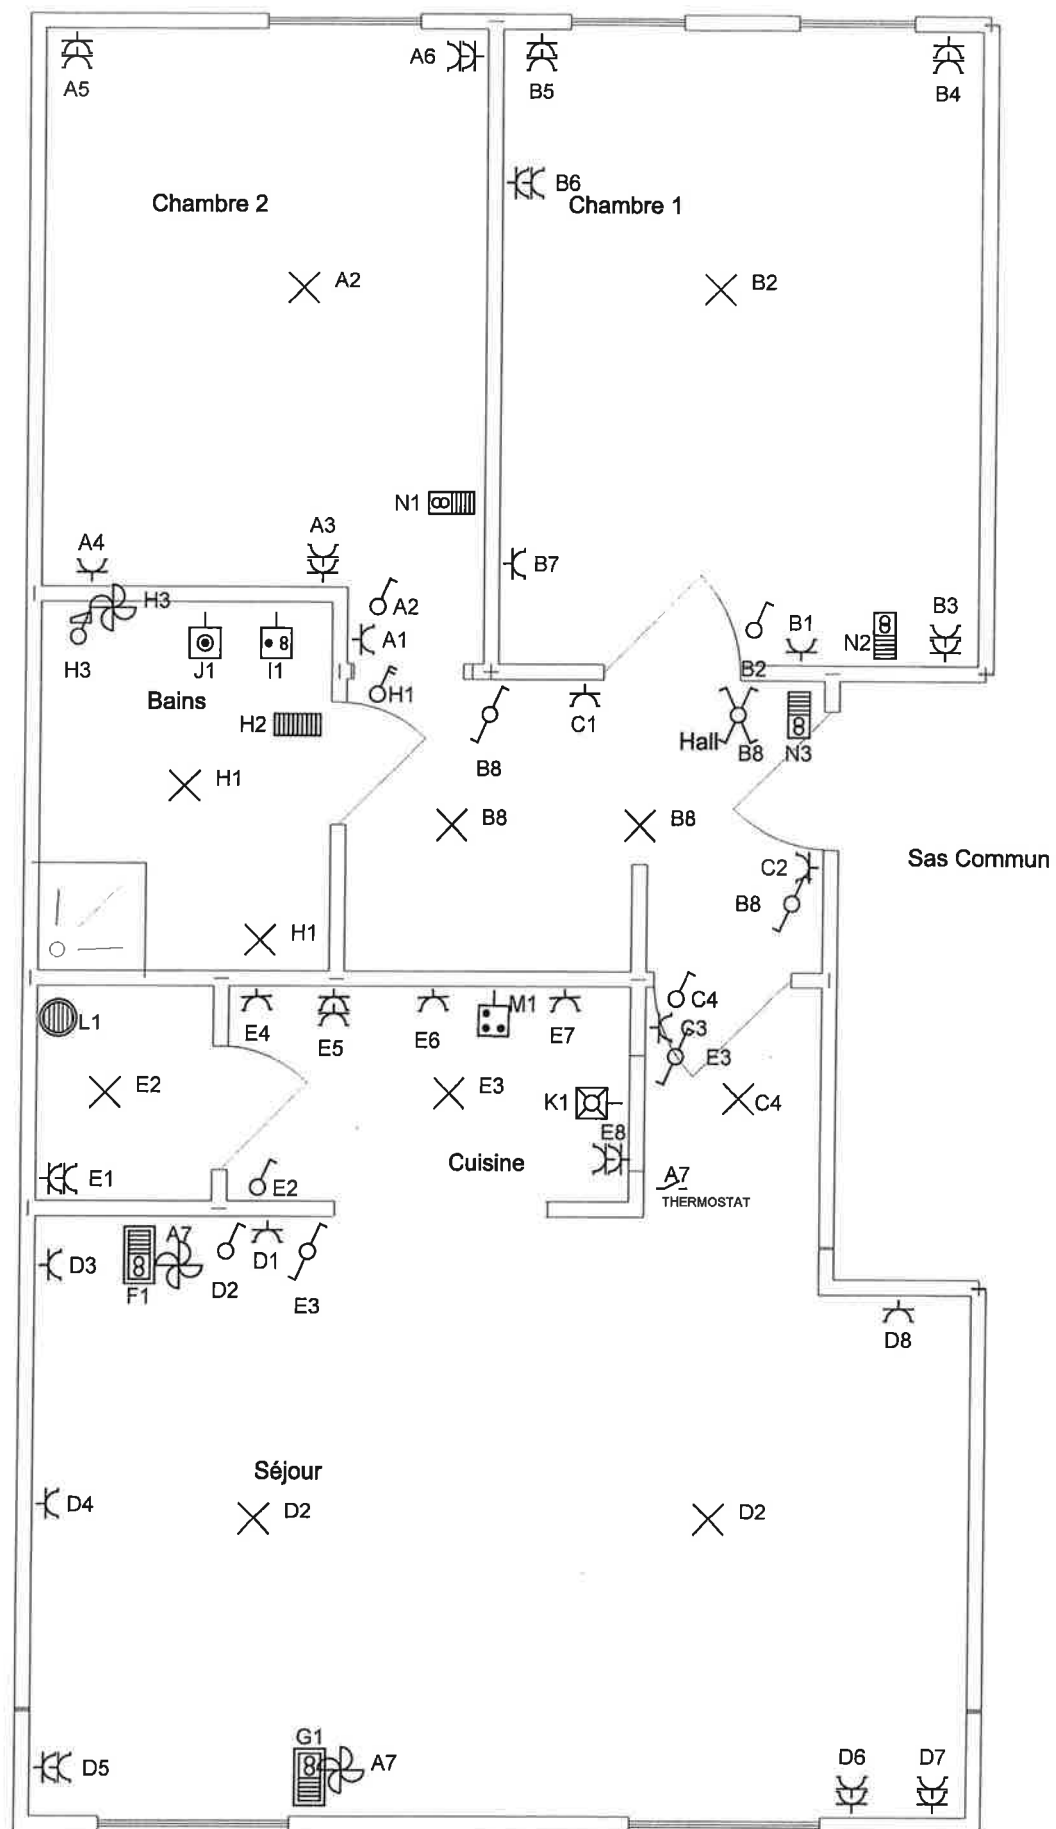

VRANCKX 2eme GAUCHE
Rue de Temploux 12
5190 SPY

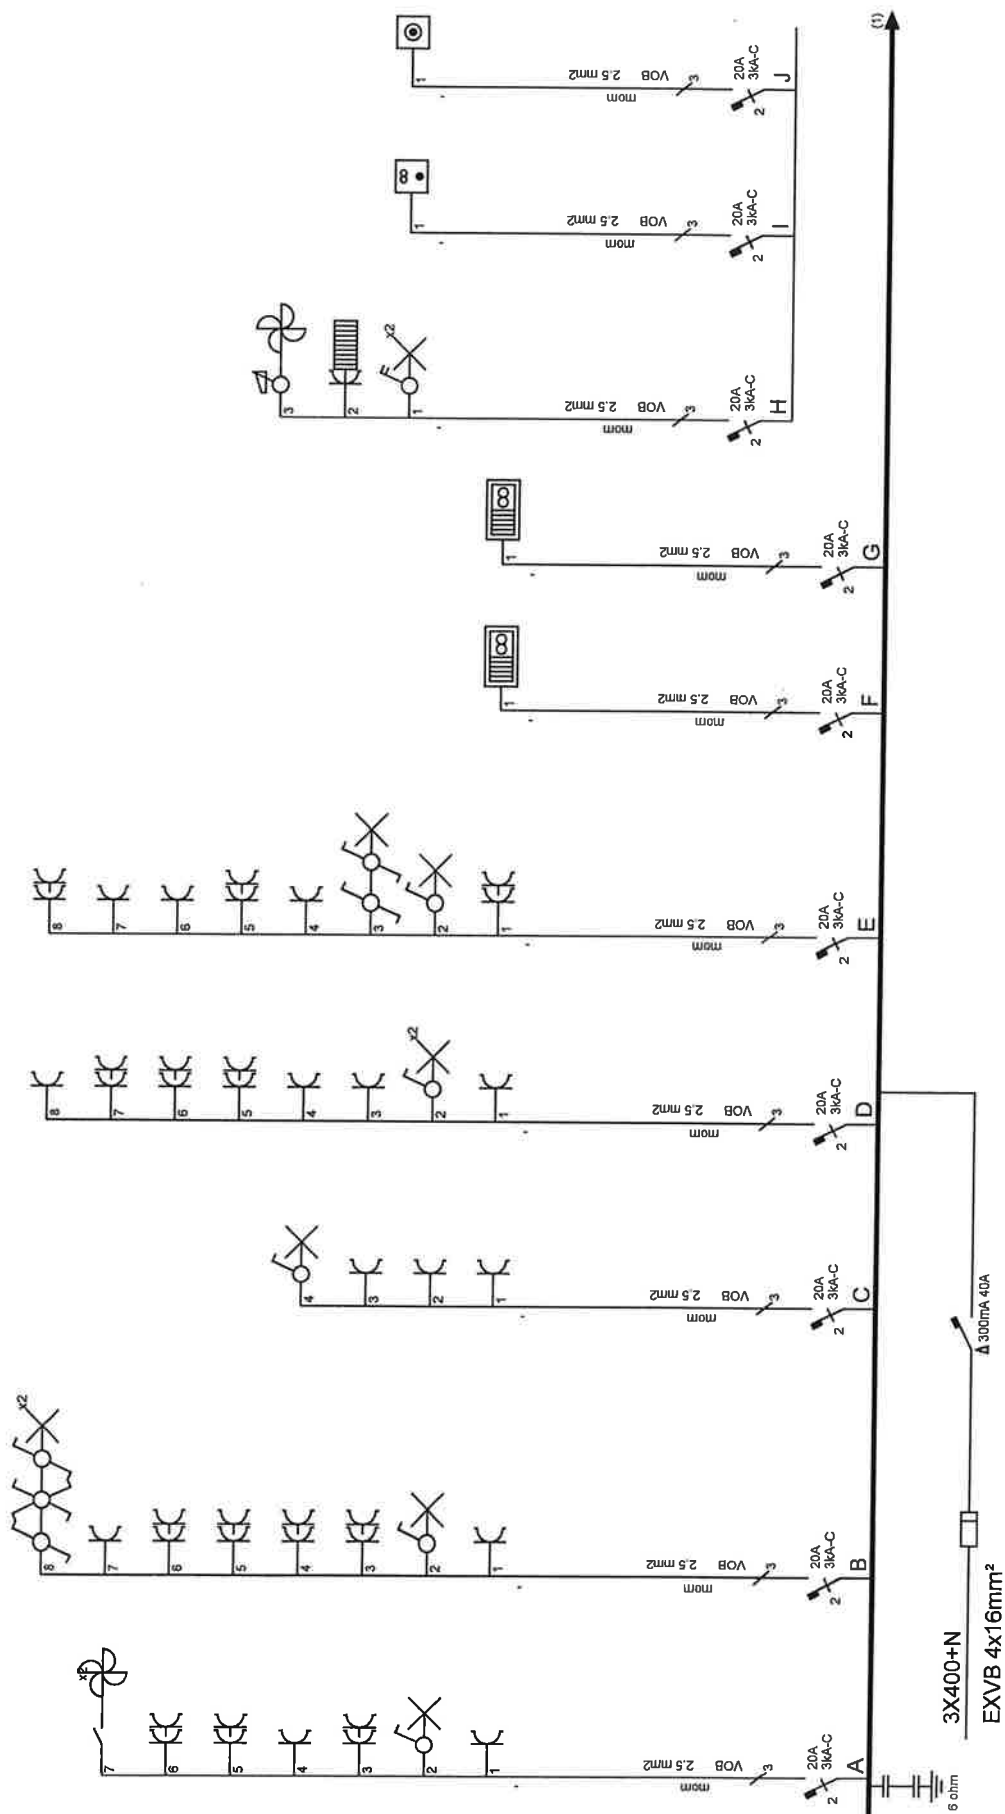

Organisme agréé


.. / .. / 2005

Propriétaire

Vranckx 2EME GAUCHE
rue de templeux 12
5190 SPY

Le responsable

.. / .. / 2005

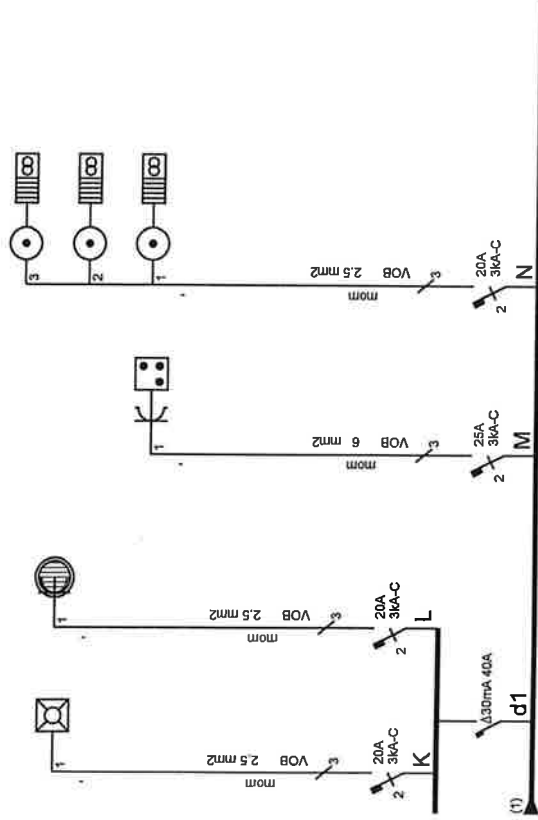

Organisme agréé
.. / .. / 2005

Propriétaire

Vranckx 2EME GAUCHE
rue de templeux 12
5190 SPY

Le responsable
.. / .. / 2005

2ème gauche (Bte 5)

20	20	20	20	20	20	20
Petite chambre Commande Ventillos	Grande chambre (éclairage Hall entrée)		Living	Cuisine	Accu salle à manger	Accu séjour
A	B	C	D	E	F	G

20	20	20	20	20	25	20
Salle de bain	Séchoir	Machine à laver	Lave- vaisselle	Chaque-eau	Cuisinière	Radiateurs chambres
H	I	J	K	L	M	N

40	0,3	40	0,03	Déstage 300 Milli	Déstage 30 Milli	Régulation
----	-----	----	------	-------------------	------------------	------------

2ème gauche (Bte 5)

A Éclairage et prises petite chambre & commande ventillos



UNITÉ INTÉRIEURE

type	2 x RPI-2HG7E	2 x RPI-2SHG7E	2 x RPI-3HG7E	2 x RPI-4HG7E	2 x RPI-5HG7E
Puissance froid	2 x 5,40	2 x 6,35	2 x 7,00	2 x 10,00	2 x 12,50
Puissance chaud	2 x 5,90	2 x 7,60	2 x 8,30	2 x 11,20	2 x 14,00
Puissance chaud à -7°C	2 x 4,3	2 x 5,5	2 x 6,0	2 x 8,5	2 x 10,7
Niveau sonore L _A (1)	34 / 41 / 45	40 / 45 / 47	42 / 45 / 48	48 / 48 / 49	50 / 50 / 51
Débit d'air* (1)	780 / 960	900 / 1140	1080 / 1320	1680 / 1800	1860 / 2100
Débit d'air** (1)	660 / 900 / 960	840 / 1020 / 1140	1080 / 1200 / 1320	1500 / 1680 / 1800	1680 / 1860 / 2100
Pression stat(bas) (1) mmWK	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Pression stat(haut) (1) mmWK	6 / 10 / 12	6 / 10 / 12	6 / 10 / 12	8 / 10 / 12	8 / 10 / 12
Déshumidification (1) l/h	1,6	2,0	2,3	3,4	5,0
Dimensions (HxPxL) (1) mm	274 x 643 x 1074	274 x 643 x 1074	274 x 643 x 1074	274 x 643 x 1464	274 x 643 x 1464
Poids (1) kg	43	45	45	51	56
Alimentation (1)	230V / 1Ph / 50Hz				
Commande (opt)	Cablée ou infrarouge				

* Pression statique basse L/M
 ** Pression statique haute L/M/h
 (1) Par unité intérieure

UNITÉ EXTÉRIEURE

type	RAS-4HG7E	RAS-5HG7E	RAS-5SHG7E	RAS-6HG7E	RAS-8HG7E	RAS-10HG7E
Puissance absorbée froid kW	4,30	5,01	5,80	6,10	8,72	10,95
Puissance absorbée chaud kW	4,05	5,29	5,90	5,85	8,57	10,52
COP (froid/chauffage)	2,60 / 3,16	2,40 / 2,80	2,16 / 2,56	2,30 / 2,70	2,40 / 2,76	2,40 / 2,78
Niveau sonore dB(A)	51	54	54	55	61	61
Débit d'air* m³/h	4200	6180	3600	6600	8100	8100
Dimensions (HxPxL) mm	1240 x 350 x 850	1240 x 350 x 850	555 x 1312 x 835	1240 x 350 x 850	1562 x 875 x 1000	1562 x 875 x 1000
Poids kg	94	105	175	106	230	240
Alimentation	400V / 3Ph / 50Hz					
Intensité nominale A	7,2	8,5	13,5	10,2	15,7	19,4
Cable d'alimentation mm²	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 2,5	5 x 4	5 x 6
Liaison int/ext mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Diamètre des tuyauteries (pouce)	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	1/2 - 1 1/8	1/2 - 1 1/8
Longueur/Dénivélé max. m	50 / 30					
Préchargé pour	10					
Appoint en réfrigérant gr/m	voir documentation technique					
Performances garanties °C	Froid: +15°C DB ~ +43°C DB - Chaud: -10°C NB ~ +15,5°C NB					
Fluide frigorigène	R-407C					
Compresseur	Scroll HITACHI					

PRIX

Prix unité intérieure (ex. TVA)	2 x € 830,00	2 x € 951,00	2 x € 951,00	2 x € 1.083,00	2 x € 1.307,00	2 x € 1.489,00
Prix unité extérieure (ex. TVA)	€ 2.221,00	€ 2.496,00	€ 3.387,00	€ 2.934,00	€ 4.435,00	€ 4.990,00
Prix de l'ensemble (ex. TVA)	€ 3.881,00	€ 4.398,00	€ 5.289,00	€ 5.100,00	€ 7.049,00	€ 7.968,00

- B** Éclairage et prises grande chambre & éclairage hall d'entrée
- C** Prises hall d'entrée & éclairage et prises couloir vers salle à manger
- D** Éclairage et prises living
- E** Éclairage et prises cellier & cuisine
- F** Accu salle à manger
- G** Accu séjour
- H** Salle de bain
- I** Séchoir
- J** Machine à laver
- K** Lave vaisselle
- L** Chauffe-eau
- M** Cuisinière
- N** Radiateurs chambres & radiateur hall d'entrée

- Débit d'air ajustable
- Reprise d'air par arrière
- Cadre de fixation gaine de soufflage et reprise d'air
- Redémarrage automatique
- Accès facilité pour la maintenance

RPI-2/2.5/3/3.5/4/5/6HG7E



- Autodiagnostic
- Chauffage garanti jusqu'à -10°C température extérieure
- Compresseur Scroll HTACH



RASC-5.0HG7E

RAS-8/10HG7E

RAS-4/5/6HG7E



- Commande câblée multi-fonctions
- Autodiagnostic
- Sonde température
- Programmation 24h
- Commande câblée simplifiée
- on / off
- Télécommande sans fil
- Choix du mode de fonctionnement
- Vitesse réglable du ventilateur
- simplifiée

PC-P1HE

PC-P3H


PC-LH3A




Le système Twin HTACH permet une meilleure répartition d'air dans les locaux de grande surface, en utilisant deux unités intérieures, raccordées à seulement une unité extérieure, tout en limitant le nombre des groupes extérieurs.



Montage Twin
Economies et performances



Raccordement 4D
Souplesse et esthétique



Compresseurs Scroll
Silence et fiabilité



Série G7
Unités nouvelle version avec
encore plus d'atouts

gainaple

RÉVERSIBLE - UTOPIA DUC

