



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Rue Reine Astrid 49/10
B-4100 Bonnelles
TVA: BE 0650 647 987
+32 471 58 07 08 | info@certigreen.be | www.certigreen.be



P.V. N°-TAR-BTD-
25/06/26-4701-CP

Date de visite:
25/06/2026

CONFORME

1^{re} visite

Raison du contrôle

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE EXISTANTE À BASSE OU TRÈS BASSE TENSION
(A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 2.11.2 - 6.5/8.1.2 - 4.2.3.2 - 4.2.4.3 - 5.3.5.2 - 5.4.2.1 - 5.4.3.6 - 5.4.4 - 7.1 - 7.2.5.1)

Objet

Contrôleur	Toni Arnould
Type de bien	Maison
Adresse	7 Rue du Wainage, 6220 Fleurus
Responsable	
Nom complet responsable	
Adresse du responsable	7 Rue du Wainage, 6220 Fleurus
Type de demandeur	
Nom du demandeur	
Numéro de téléphone	
Email	
Photo	



Références réglementaires

Parties d'avant juin '20	- 8.1.2 - Contrôle périodique d'une installation d'oct '81 à mai '20 inclus (ancien RGIE, avec dérogations 8.2.2 possibles)
--------------------------	---

Installation

Tension	3N400V
Protection générale	40 A
Diff. gén. ≤ 300 mA (DDRG)	
Intensité (A)	Sensibilité (mA)
63 A	300 mA

Diff. supplémentaire(s). ≤ 30 mA (DDRS)

Intensité (A)	Sensibilité (mA)
40 A	30 mA
40 A	30 mA

Câble compteur-tableau

Type	Qté	Section (mm ²)
EXVB	4	16 mm ²
Qté tableaux	1	
Qté circuits	20	
Conducteur de terre (entre sectionneur et prise de terre)	16 mm ²	

Mesures

Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	23.0 Ω
Isolement général par rapport à la PDT	45.0 M Ω
Appareil utilisé	MES017 (Fluke 1653B)

Critères de contrôle

Critère	Statut
1 - Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	OK
2 - Isolement général par rapport à la PDT	OK
3 - Continuité de terre	OK
4 - Différentiel(s) général(aux) (DDRG)	OK
5 - Protection contre contacts directs	OK
6 - Protection contre contacts indirects	OK
7 - Appareillage fixe et à poste fixe	OK
8 - Canalisations électriques (fils, peignes, câbles, conduits)	OK
9 - Repérages et/ou schémas unifilaire et de position	OK
17 - Documents, études techniques, analyses de risques	OK
18 - Risques liés à un incendie	OK

Test de différentiel(s)

Test de déclenchement de la (des) protection(s) différentielle(s) effectué par bouton de test et par injection de courant de défaut égal à 2,5 à 2,75 fois la sensibilité de la protection testée.	Oui
--	-----

Bornes amont de la protection différentielle générale scellées ?

Plombage	Oui
----------	-----

Fichiers / Photos

Photos annexes



PDF annexes

Schema Rue du Wainage 7 Lambusart_260626_001445.pdf (voir annexe)

Résultat

✓ CONFORME

Les schémas unifilaires et plans de position joints au rapport ont été contrôlés, datés et signés par l'agent-visiteur et le responsable de l'installation.

Installation conforme au RGIE Livre 1.

Validité :

Installation à faire de nouveau contrôler avant le 25/06/2051, soit 25 An(s) après émission du présent rapport.

Signature(s)

Toni Arnould




Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation, et uniquement sur les installations domestiques concernées par la demande qui nous a été adressée. Aucune modification apportée à l'installation après le passage de l'agent-visiteur n'est prise en compte dans ce rapport. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Toute réclamation est à transmettre à la société par écrit. Il peut être fait appel aux résultats d'inspection via recours au SPF Économie Direction générale de l'Énergie. Toute information contenue dans le présent rapport est confidentielle et ne peut être divulguée qu'au demandeur et au propriétaire. Seul le service du ministère fédéral de l'économie en charge de la surveillance des organismes de contrôle agréé peut avoir accès, à sa demande, à ces informations. En cas de non-conformité persistante à la seconde visite, une copie du rapport est d'office transmise au SPF Économie Direction générale de l'Énergie par CERTIGREEN test.

Obligations du propriétaire (AR du 8/9/19 - Livre 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.5.7.2.b7) 1. Conserver, dans le dossier de l'installation électrique, ce procès-verbal, les plans et toute notice décrivant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils ou canalisations électriques (nous conseillons de placer une copie de ces documents à proximité du tableau électrique principal) - 2. Enseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique - 3. Aviser immédiatement le Ministre des Affaires économiques, Direction générale de l'Énergie de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité - 4. Entretenir ou faire entretenir son installation (tester régulièrement toutes les protections à courant différentiel résiduel via leur bouton de test, resserrer les bornes des tableaux une fois par an, dépoussiérer,...) - 5. Prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions de l'AR du 8/9/19 - Livre 1 soient en tout temps observées - 6. Transmettre au locataire, nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant le dossier de l'installation électrique.

Fichiers / Photos - PDF annexes

□ Schema Rue du Wainage 7 Lambusart_260626_001445.pdf

Document disponible en annexe du rapport PDF

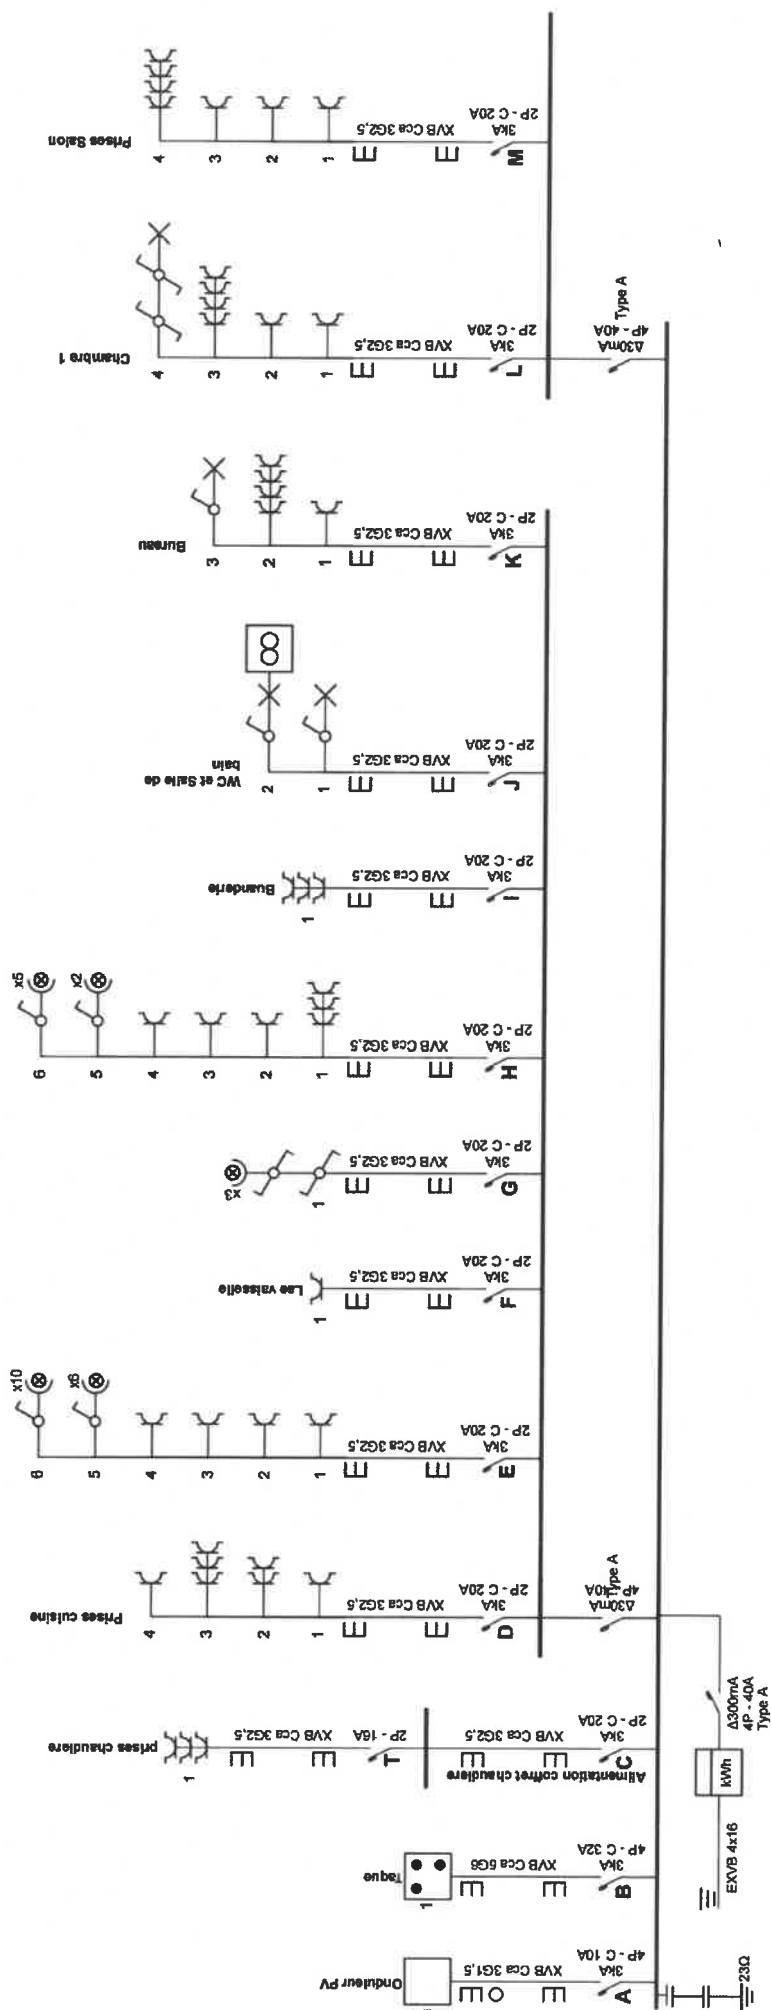



Toni Arnould
 0471/73.76.49

Adresse de l'installation électrique

Installateur


p. 1/6
 Schéma unifilaire
 Date: 25-05-26
 3 x 400V + N - 50Hz

GSM: -
 Tél.: -
 Fax: -
 e-mail: -

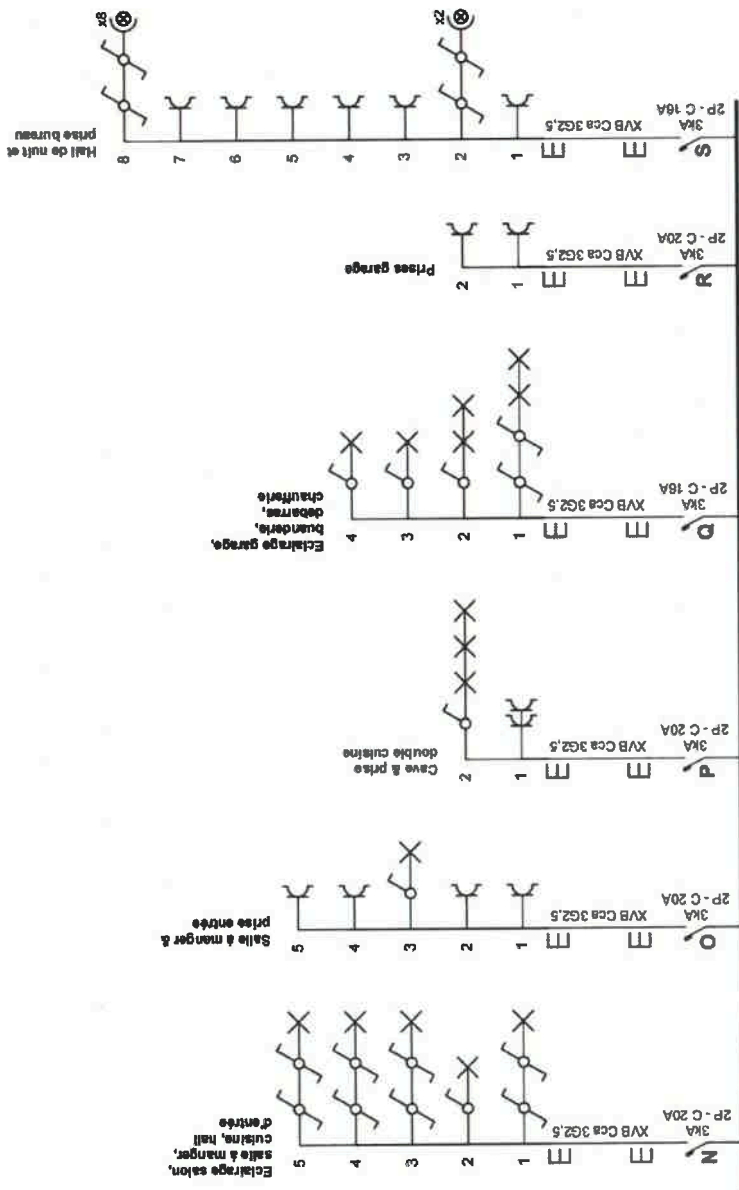

CERTIGREEN
Toni Arnold
0471/73.76.49

Adresse de l'installation électrique 	Installateur 	p. 2/6 Schéma unifilaire Date: 25-06-28 3 x 400V + N - 50Hz
	Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	

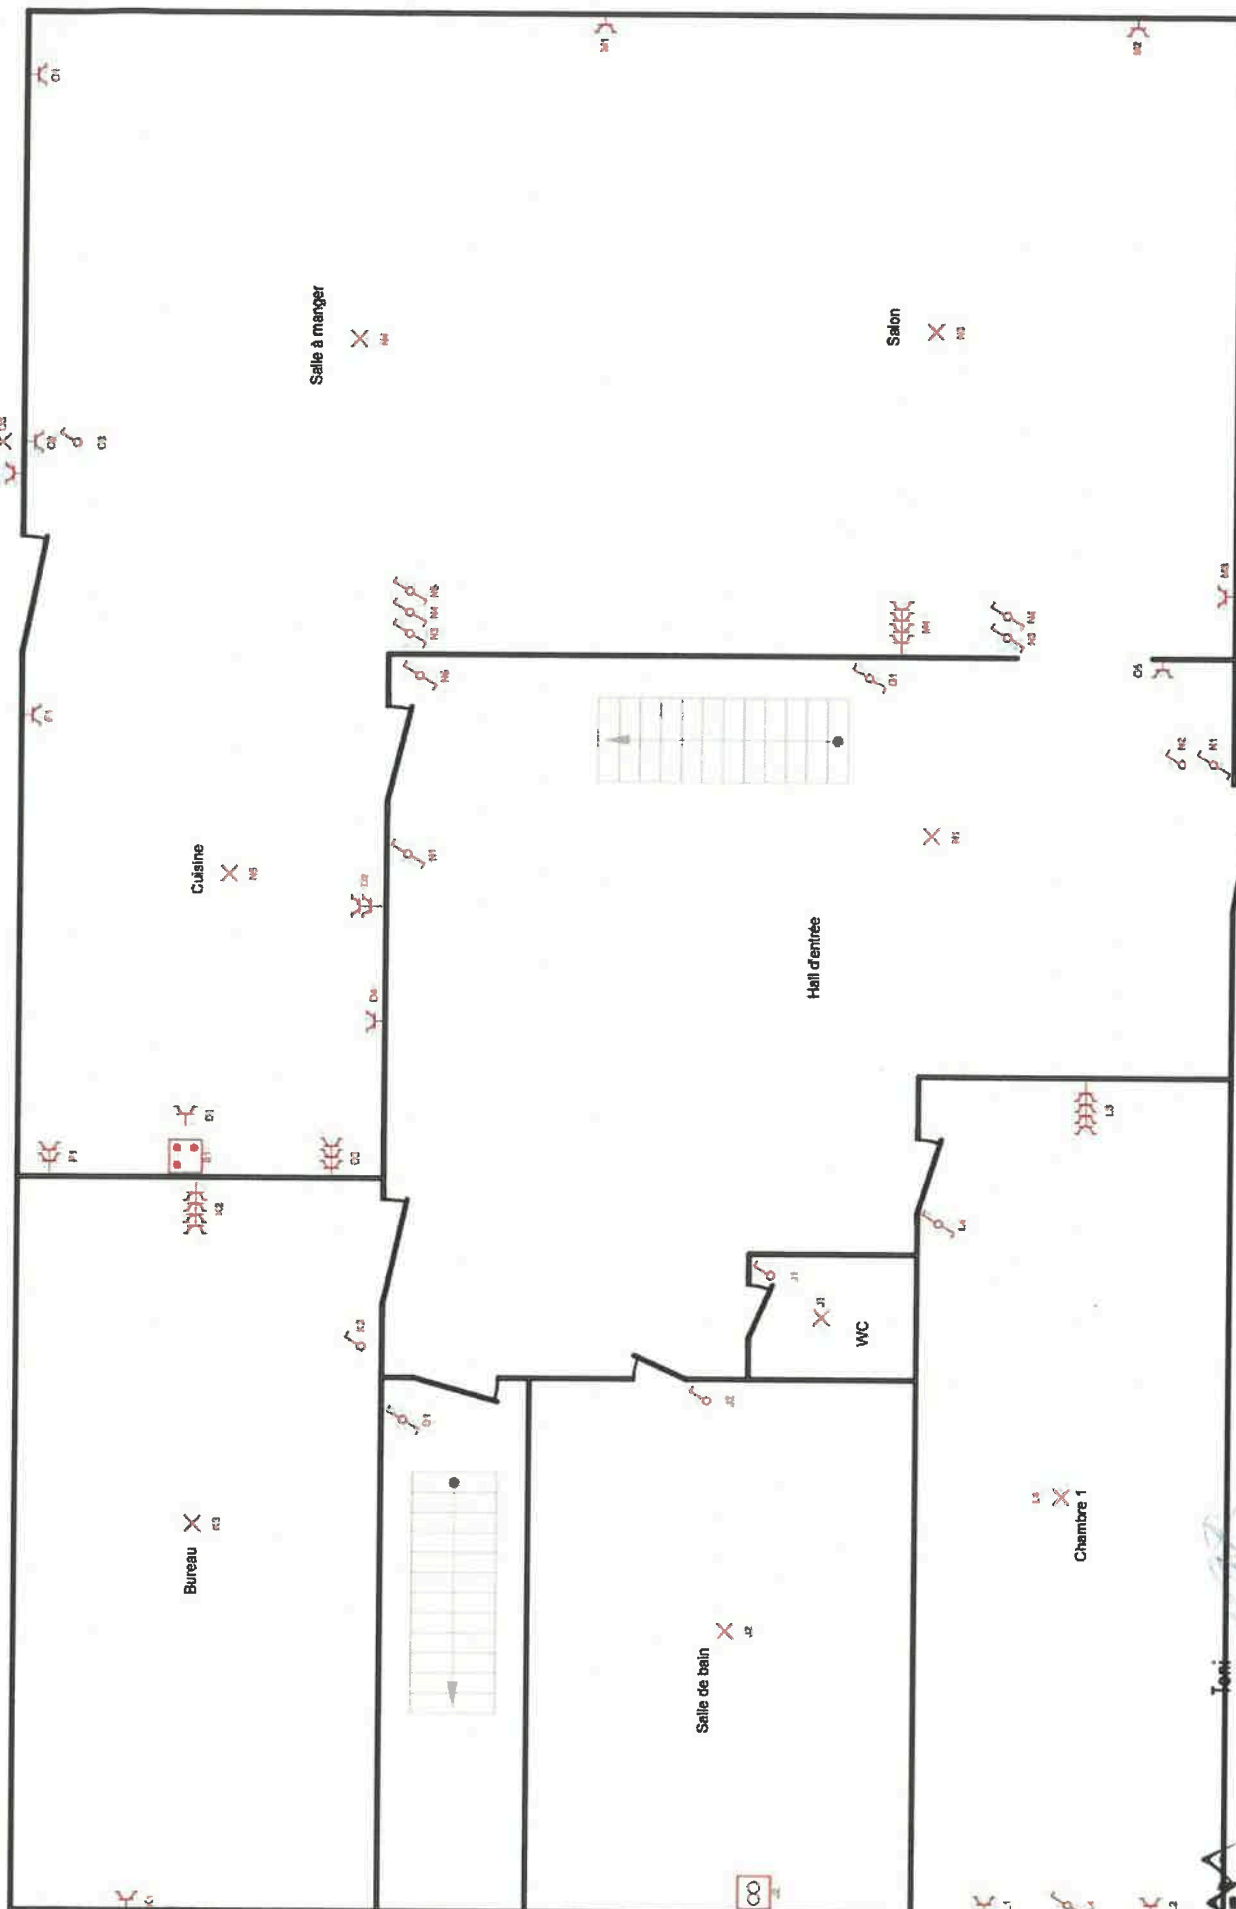

Rez de chaussée
Adresse de l'installation électrique

Installateur

p. 3/6

Schéma de position


Date: 25-08-28

3 x 400V + N ~ 50Hz

Tél: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


CERTIGREEN test
Arnould
0471/73.76.49

Toni

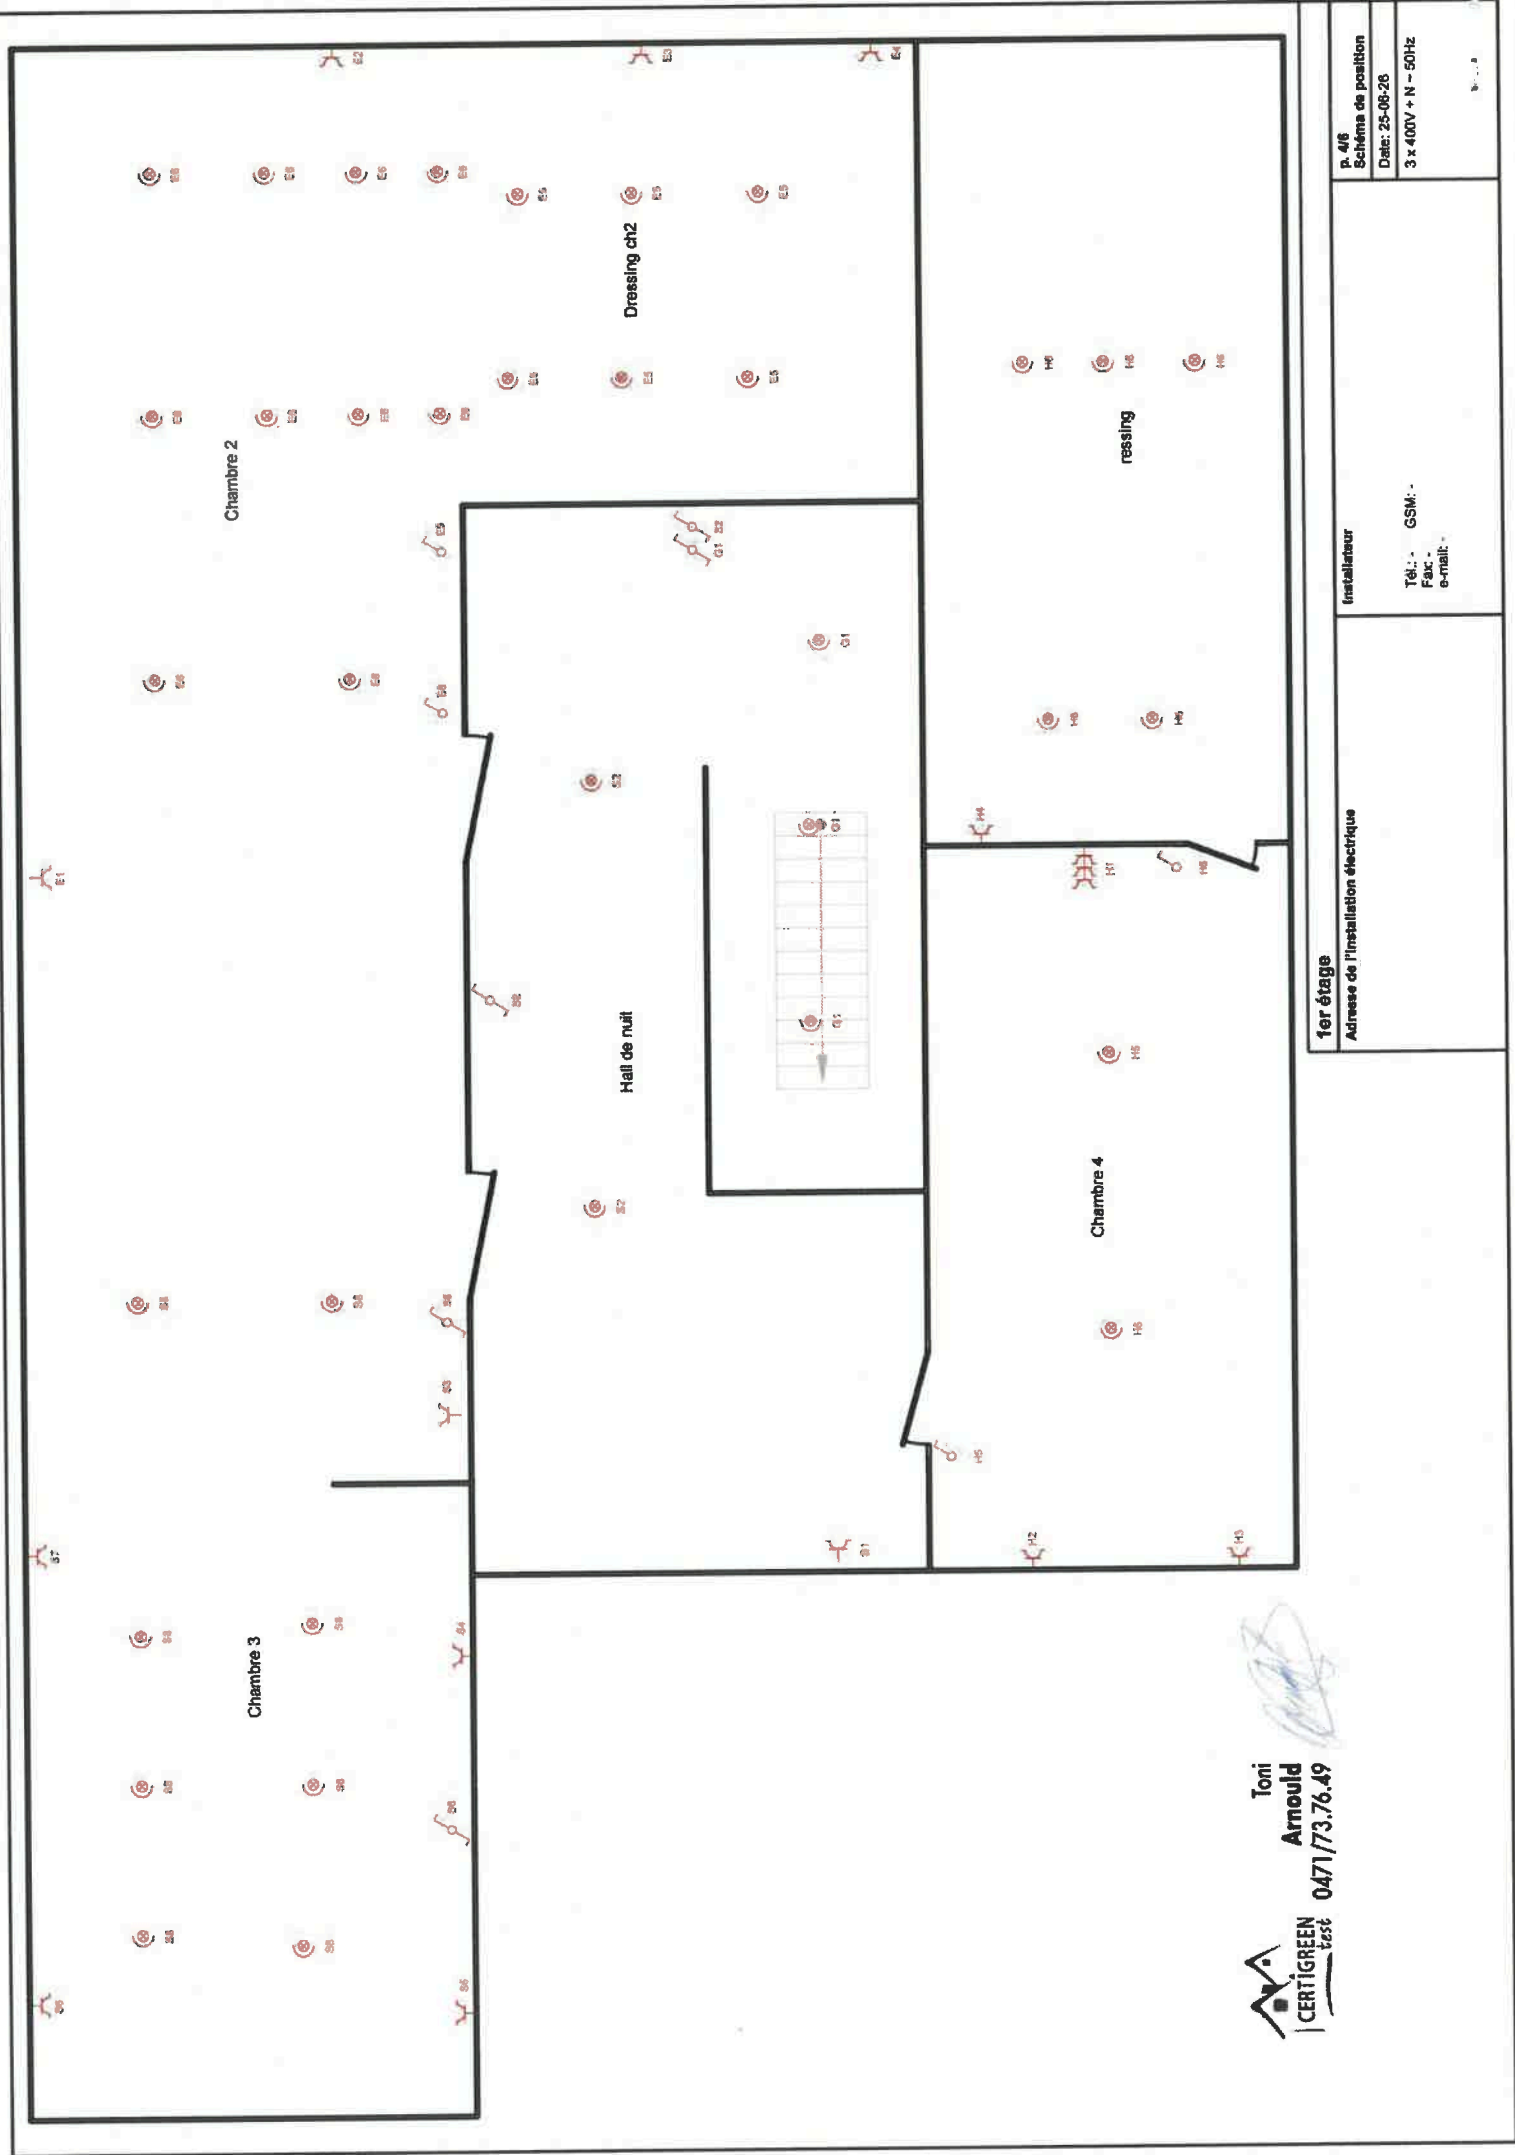

 **Toni Arnould** 0471/73.76.49

1er étage		P. 416	
Adresse de l'installation électrique		Schéma de position	
		Date: 25-08-20	
		3 x 400V - N - 50Hz	
Installateur		Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	

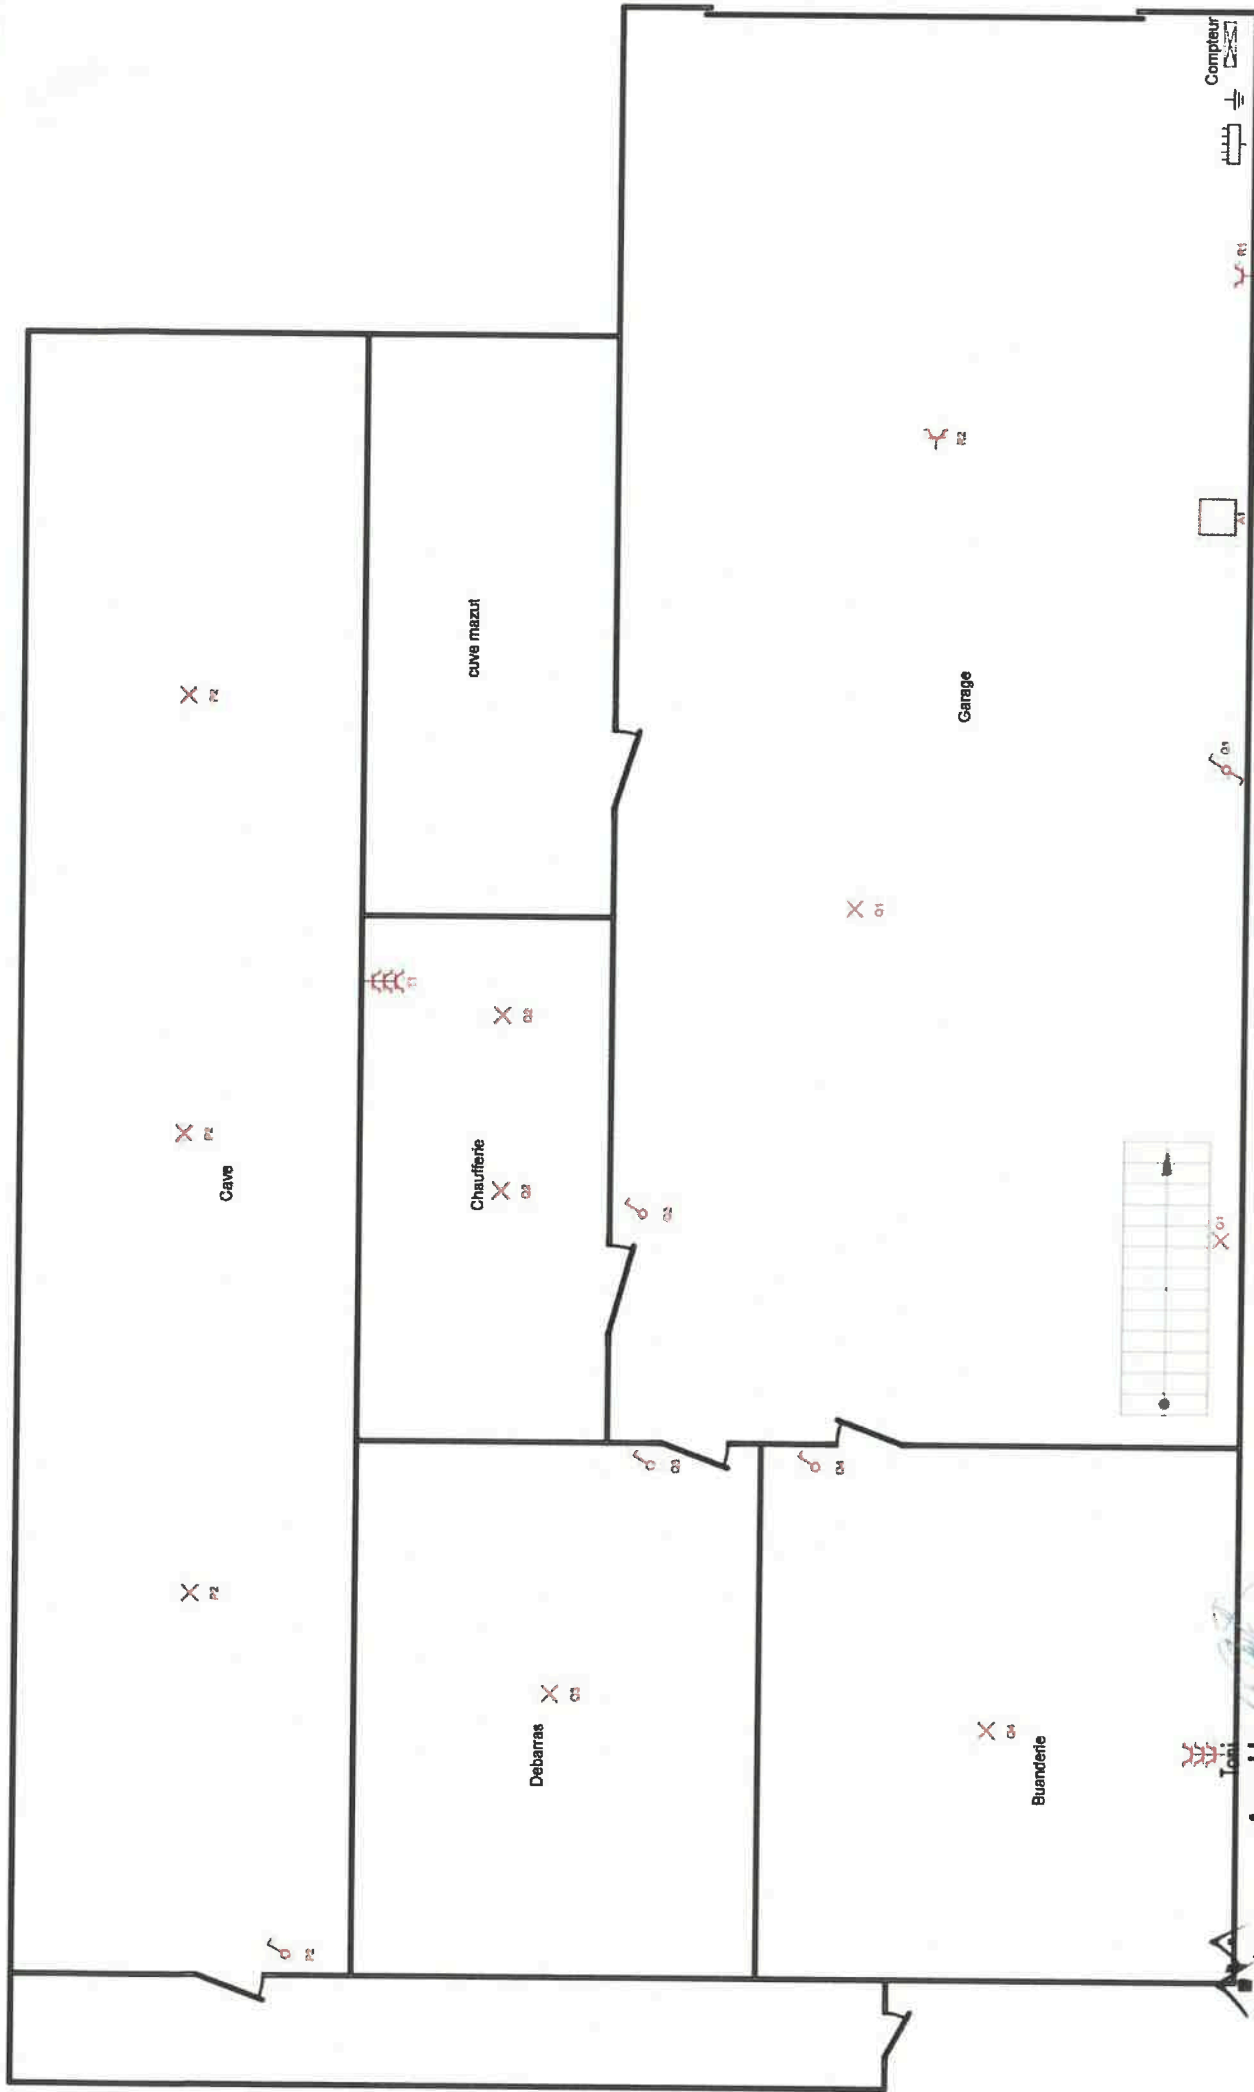

sous sol (cave)

Adresse de l'installation électrique

Installateur

p. 56
Schéma de position
Date: 25-06-28
3 x 400V + N ~ 50Hz

Tél: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

CERTIGREEN
test

Arnould
0471/73.76.49



Toni
Arnould
0471/73.76.49



A:	Onduleur PV
B:	Taque
C:	Alimentation coffret chaudiere
T:	prises chaudiere
D:	Prises cuisine
E:	
F:	Lae vaisselle
G:	
H:	
I:	Buanderie
J:	WC et Salle de bain
K:	Bureau
L:	Chambre 1
M:	Prises Salon
N:	Eclairage salon, salle à manger, cuisine, hall d'entrée
O:	Salle à manger & prise entrée
P:	Cave & prise double cuisine
Q:	Eclairage garage, buanderie, débarras, chaufferie
R:	Prises garage
S:	Hall de nuit et prise bureau

Adresse de l'installation électrique

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 8/6
Liste des circuits
Date: 25-08-26
3 x 400V - N - 50Hz
