



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitationezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

N 018875

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

 Verslag nr.: XXXXXXXXXX Lid nr.: XXXXXXXXXX Aanvrager: Bels

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:



Naam, Voornaam:

Adres:

Post nr. + Stad:

Tel:

D4
Kruitvulinlaan 3
1000 Brussels
Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ Ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaaring	☐ overdracht		☐ Art	☐ Art	☐ ④ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	<u>541448965000043461</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	<u>5252859</u>	Meterstand dag: <u>000055</u> nacht: <u>000056</u>	☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A):	☒ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.:	Meterstand:
	Nominale spanning:	☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ Aardingslus ☐ pen / baar	
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage	Voedingsleiding hoofdbord:	<u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>XVB</u>	☐	
	Algemene differentieelstroominrichting:	<u>63</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden:	<u>1</u>
		Aantal eindstroombanen:	<u>12</u>	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Mateneel	☒ /doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>3</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>18</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen		Visum:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 23-11-2009

• door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker:

Naam:

Aantal bijlagen:

☒ Situatieschema(s): 4Agent nr.: 3303

Datum:


23-11-2009

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingezet te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuwe controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.


Botanique St Pietersstraat - Kruissteunleuven 1000 Brussel

App. 04

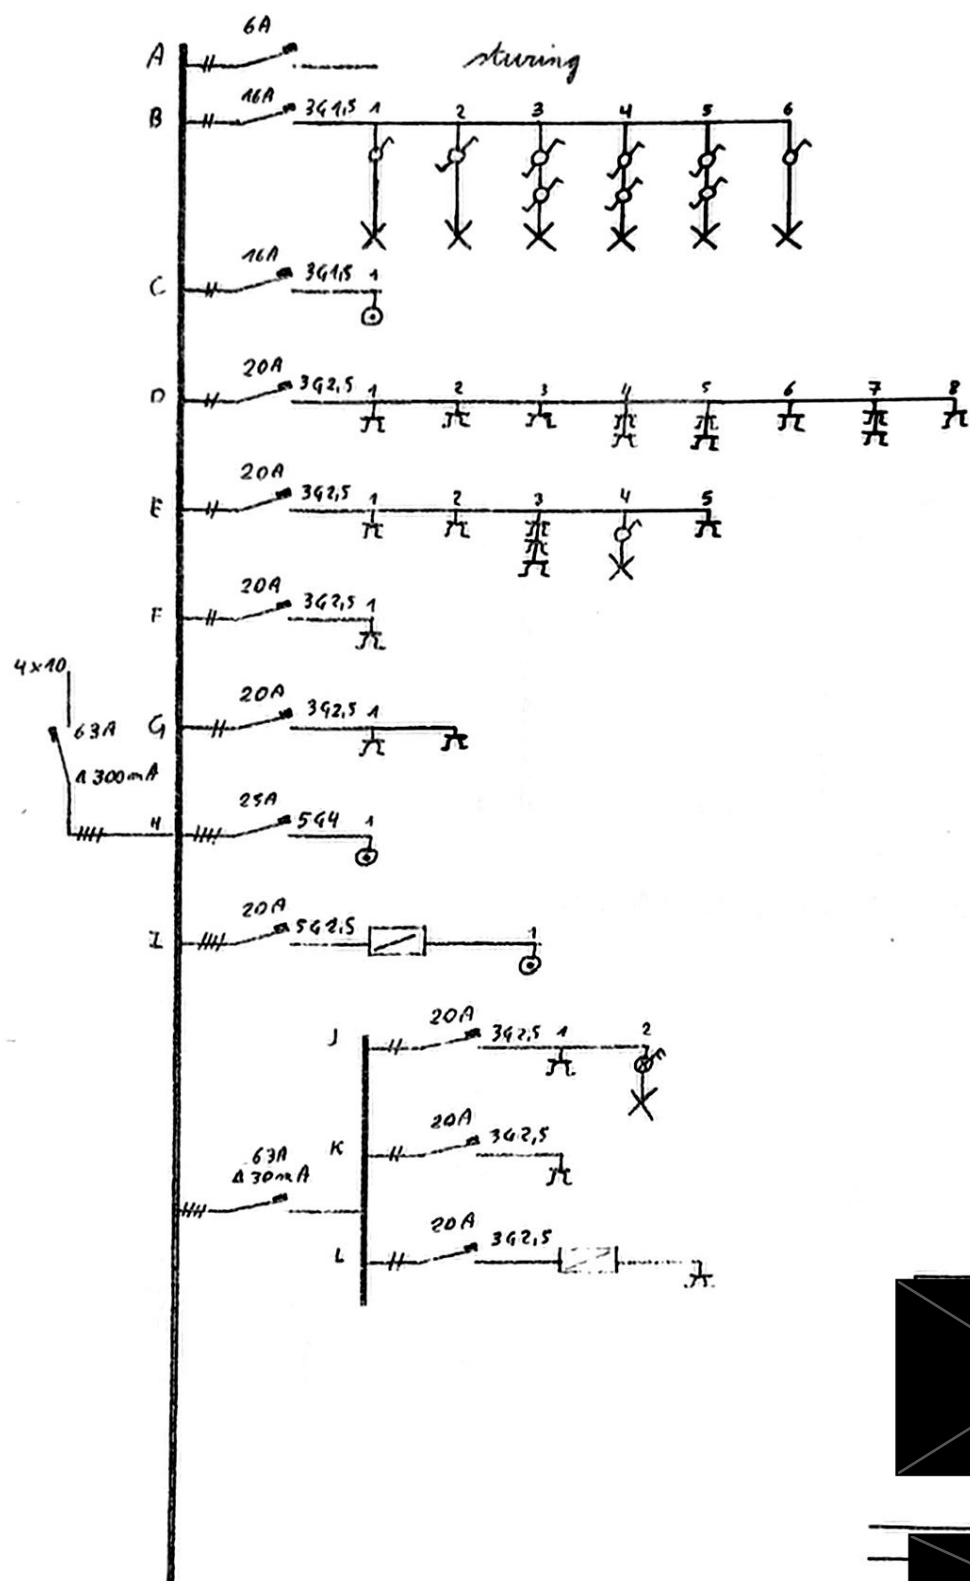

tel.:

1.94

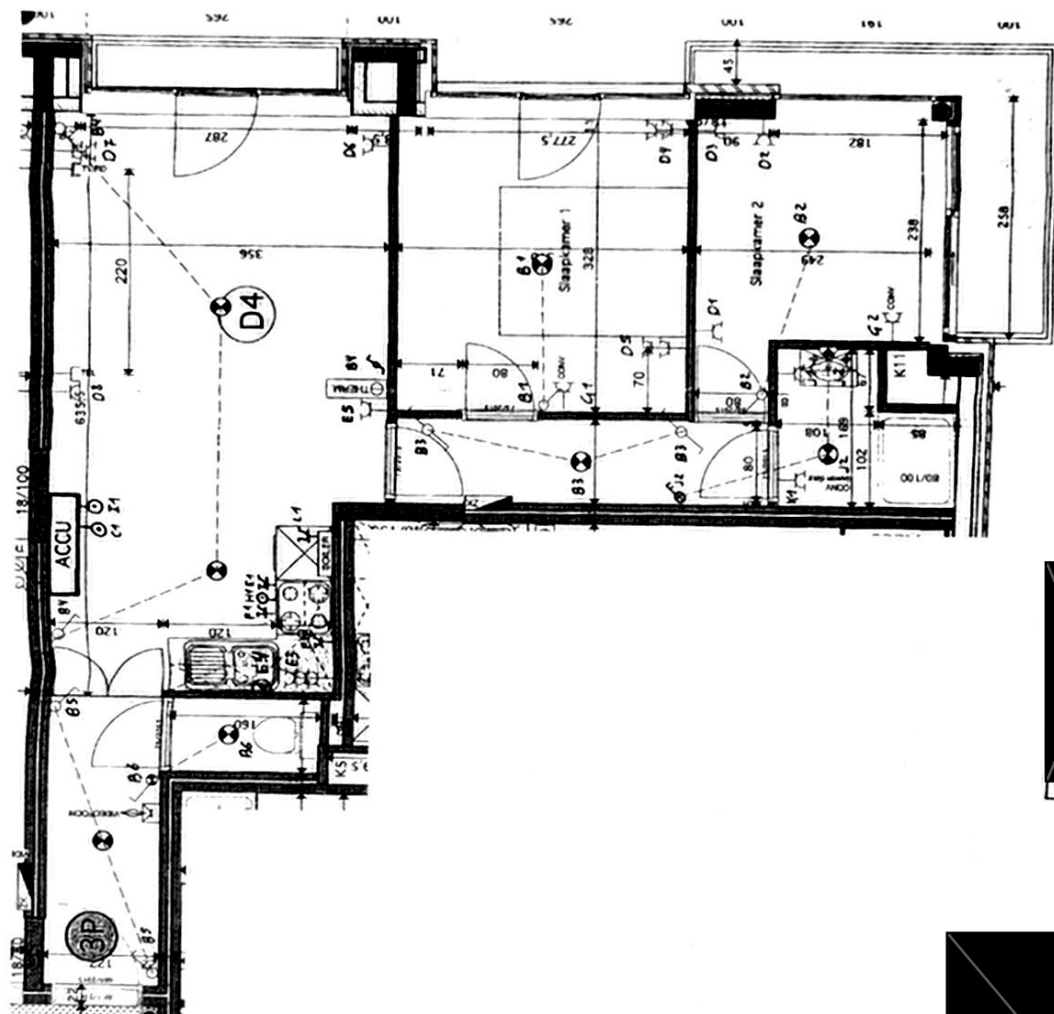

Project:
Appartement:
Eigenaar:
Datum:

