



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 13/04/2023
Étiquette d'identification: Zellik EK1
Marque et type d'appareil de mesure: Metrel ET61557
Date rapport: 13/04/2023

Inspecteur: Kurt De Smedt
N° TVA: BE 0675 686 558
Numéro de serie: 17470016

Mentor:
Référence client:

Installateur: Demir Elec srl

Adresse de l'installation

Rue Breughelpark
Numéro 17
Boîte 24
Postcode 1731
Commune Zellik
Pays Belgique

Propriétaire

Nom Besime Baldemir
Rue Breughelpark
Numéro 17
Boîte 24
Postcode 1731
Commune Zellik
Pays Belgique

Installateur

Nom Demir Elec srl
N° TVA BE 0675 686 558
Numéro de téléphone +32 487 78 96 61
E-mail demir0326@gmail.com

Type : appartement

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

EAN : 541448820057777847

N° compteur : 1SAG1105403716



Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3.

Distributeur: FLUVIUS

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 2

Nombre de circuits: 9

Prise de terre: Electrode verticale enterrée

Ri général: 80,8 MΩ

RE: 16,78 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits		Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1		C	32		2	6
8		C	20		2	2,5
Contrôle visuel (général)	OK		Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK		schéma en annexe par Aceg asbl NA			
Liaisons équipotentielle	en attente		Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK		Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 17 Les équipotentielles principales sont en attente de raccordement.

nota/note 2 Aucune infraction .

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 13/4/2048
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre annexe: 5

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Kurt De Smedt

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.


Qualité


- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 13/4/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.






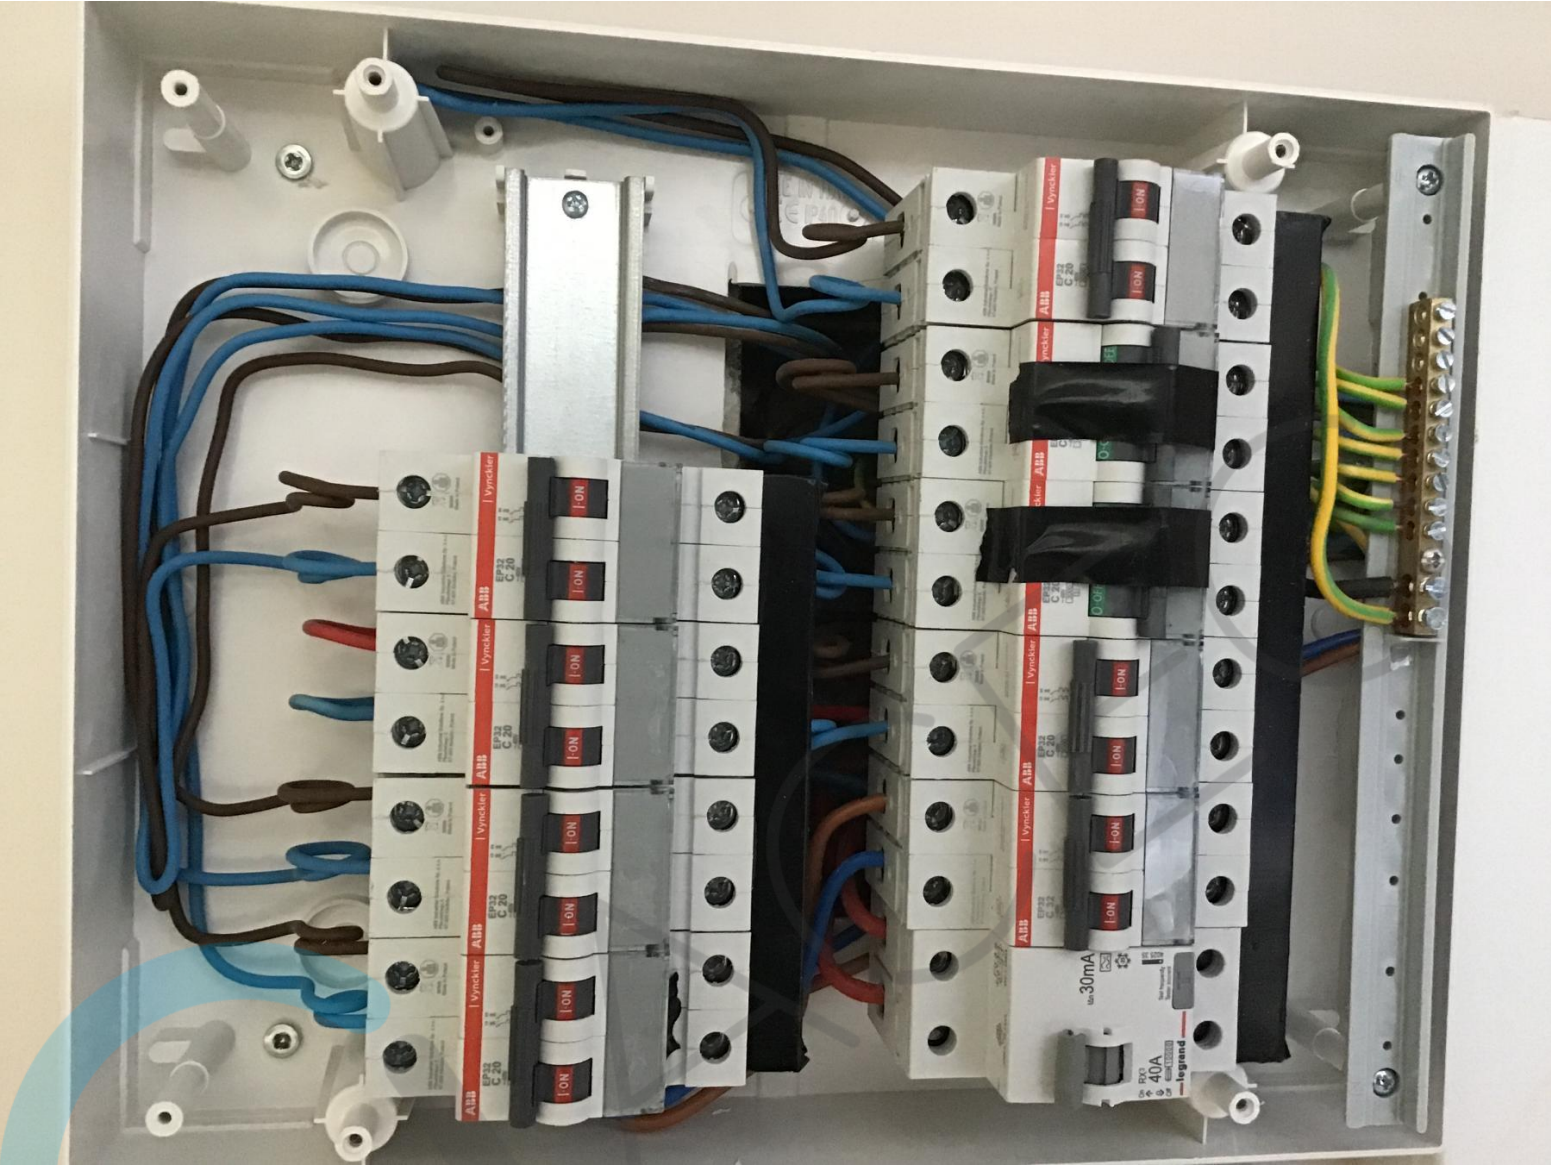

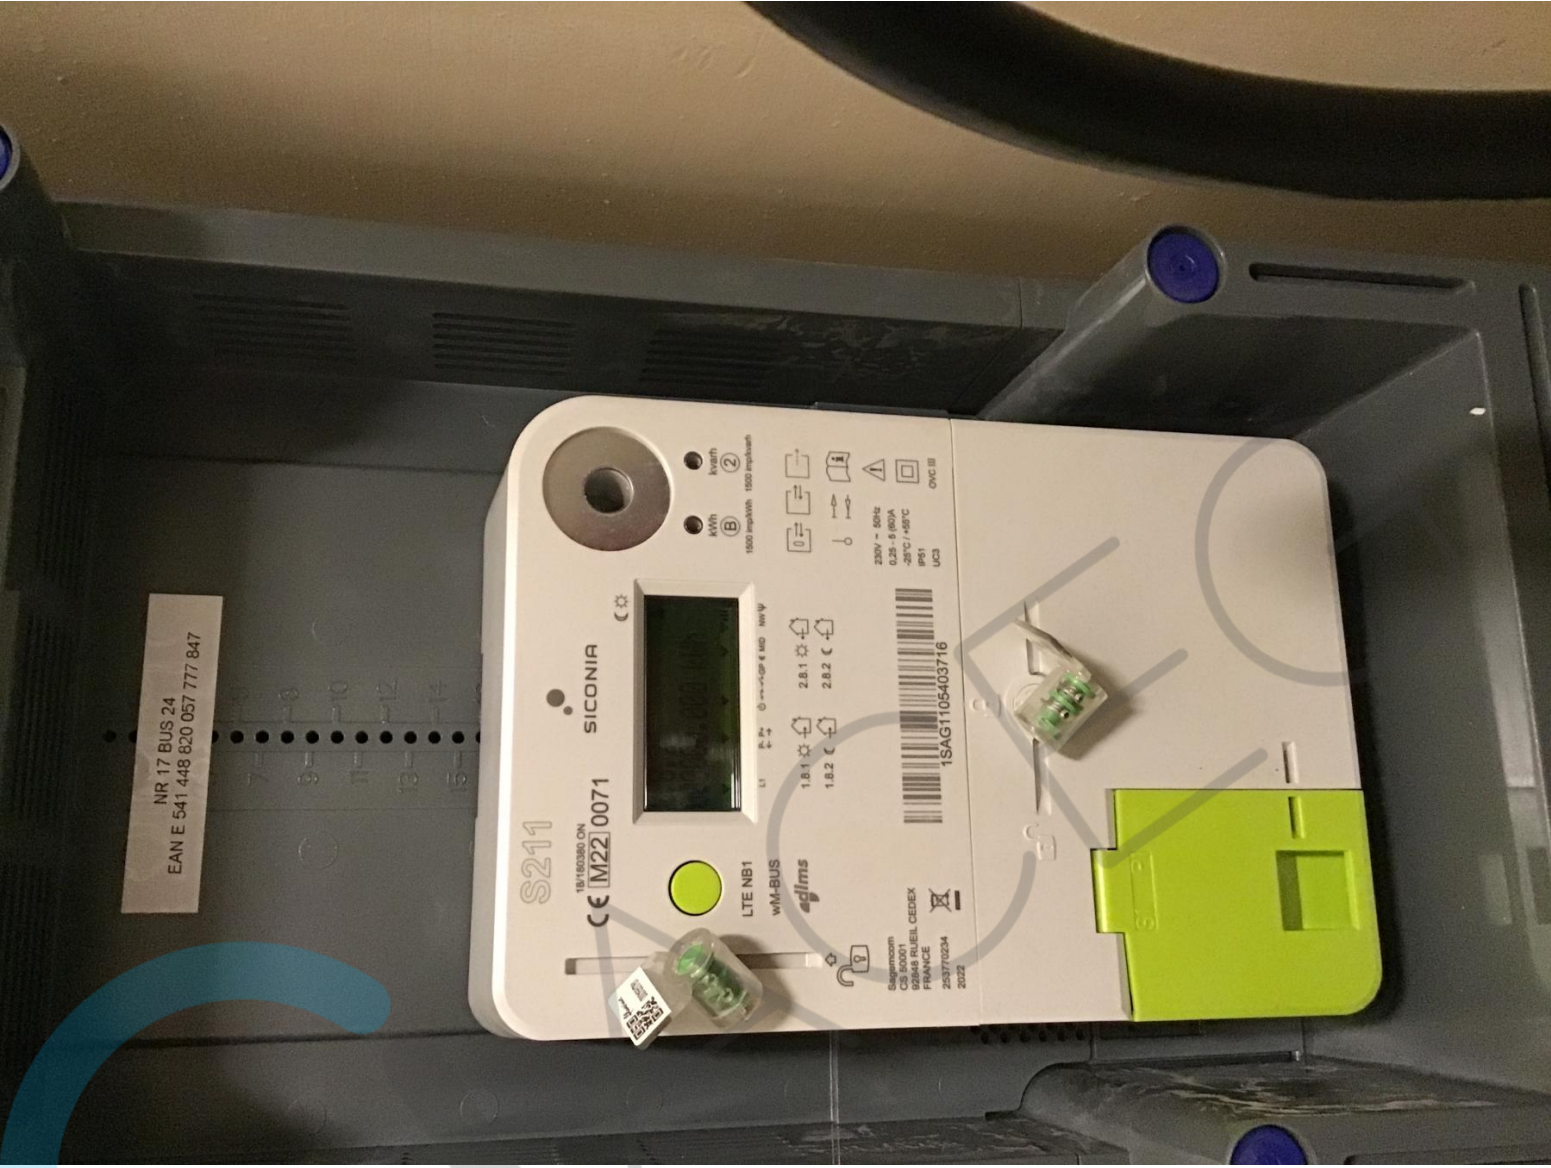

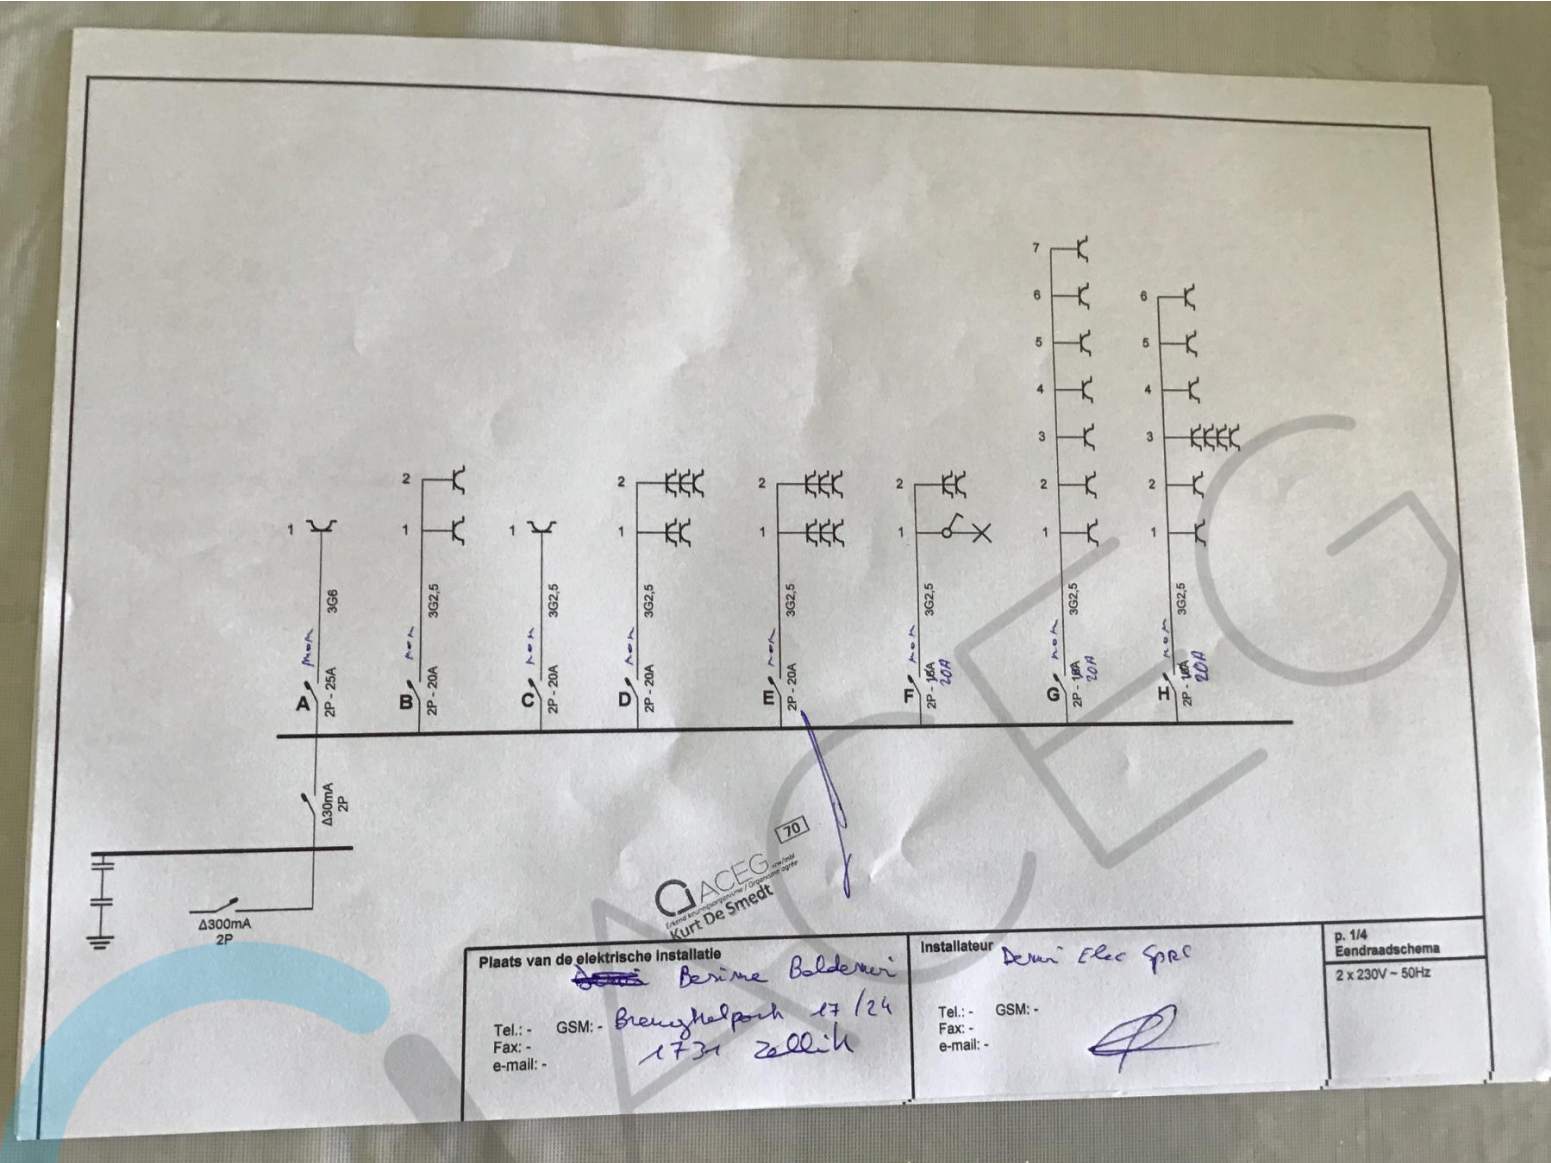

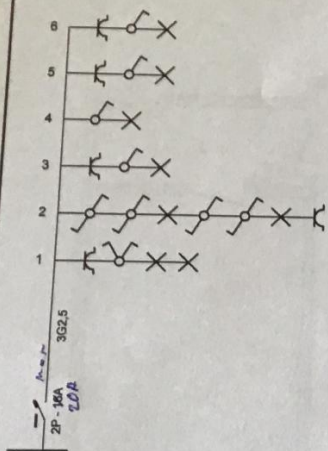

QACEG installatie
Kurt De Smedt

Plaats van de elektrische installatie

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

