

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Oost-Vlaanderen, Industriepark - Zwijnaarde 3B, 9052 ZWIJNAARDE
T: 09 252 45 45, E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0472-160531-02

Datum van het onderzoek: 31/05/2016

Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE: VAN MIEGHEM
KOBEN GEERTSSTRAAT 87 BUS 1
9120 BEVEREN-WAAS

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: VAN MIEGHEM
Adres: KOBEN GEERTSSTRAAT 87 BUS 1
9120 BEVEREN-WAAS

INSTALLATEUR:

Adres:


BTW of IK:

EAN:

Teller nr.

10124700

Index:

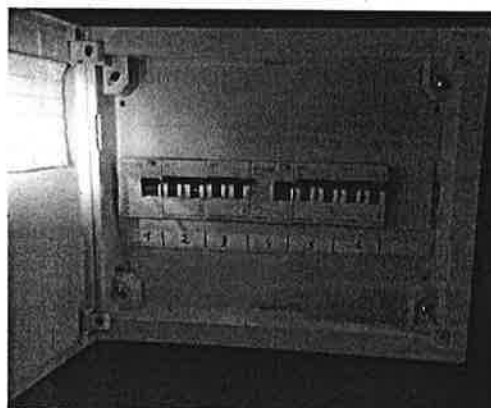

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Verkoop wooneenheid /	Type der Lokalen:	Appartement
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie:	Voor & Na 01/10/81
Aansluiting spanning:	Mono 230V	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord:	2 x 6 mm ²	Bescherming van de aansluiting:	2 P 32 A
Type van de aardelektrode:	pennen of baren.	Alg. schakelaar: type:	2p 40A/300mA
Aantal borden:	1	Aantal eindstroombanen:	4
Uitwendige invloedsfactoren:		Schema:	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens: AREI art. 276bis,
Aard van het onderzoek: Controlebezoek

METINGEN:

RA: 5,5 Ohm RI tot > 0,5 MOhm

Schema's

