

Klaarverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 138614
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: jeroen@crea-accent.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5801649
Voord. verslagnr.:
Datum: 02/07/2022



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

CREAACCENT
KERKSTRAAT 2
2970 'S GRAVENWEZEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 491 VAN DAMME ERIK
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Eric Willekens Adres: Bredabaan 380 B1.3 2930 Brasschaat
Installateur/verantw. werk: Naam: Crea Accent Adres: Kerkstraat 2 2970 's Gravenwezel B.T.W.: BE0809165189
Adres installatie: ERIC WILLEKENS BREDABAAN 380 B1.3 BRASSCHAAT Private HS-cabine: NEE
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID:
EAN nr.: 541448820053639482 Netbeheerder: - Teller nr.: 1SAG110031 Nachtteller nr.: 1007

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)
Kies een item.

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

Installatiedatum: voor 01/10/81 + voor 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": bj 1999

Datum: 01/07/2022

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/07/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V Max. bevoeling: 40A Hoofdbevoeling: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: Nz mm²
Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk bereikbaarheid: in orde - gemeenschap. aardonderbreker is bereikbaar
Aardelektrode: type: Lus sectie: 35 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 63A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 11

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 2,63 MOhm Spreidingsweerstand: 1,45 Ohm
Testknop diff.schak.: In orde Controle foutlus: In orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde
Bescherming tegen overstroom: In orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: In orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,




Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf



Goedkeuring van plan iv keuring

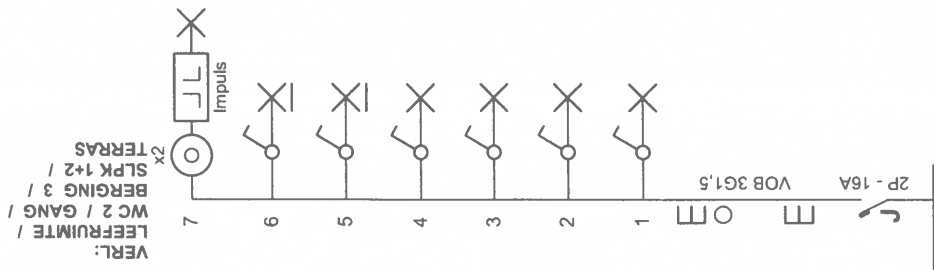


Plaats van de elektrische installatie
ERIC WILLEKENS
BREDABAAN 380
BRASSCHAAT

Installateur
Crea-Accent B.V.B.A.
Kerkstraat 2
2970 s'Gravenwezel
Tel.: 03 425 64 12 GSM: 0472 25 52 57
e-mail: jeroen@crea-accent.be
BTW BE 0809.165.189



p. 2/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Goedgekeurd door plan ivt keuring

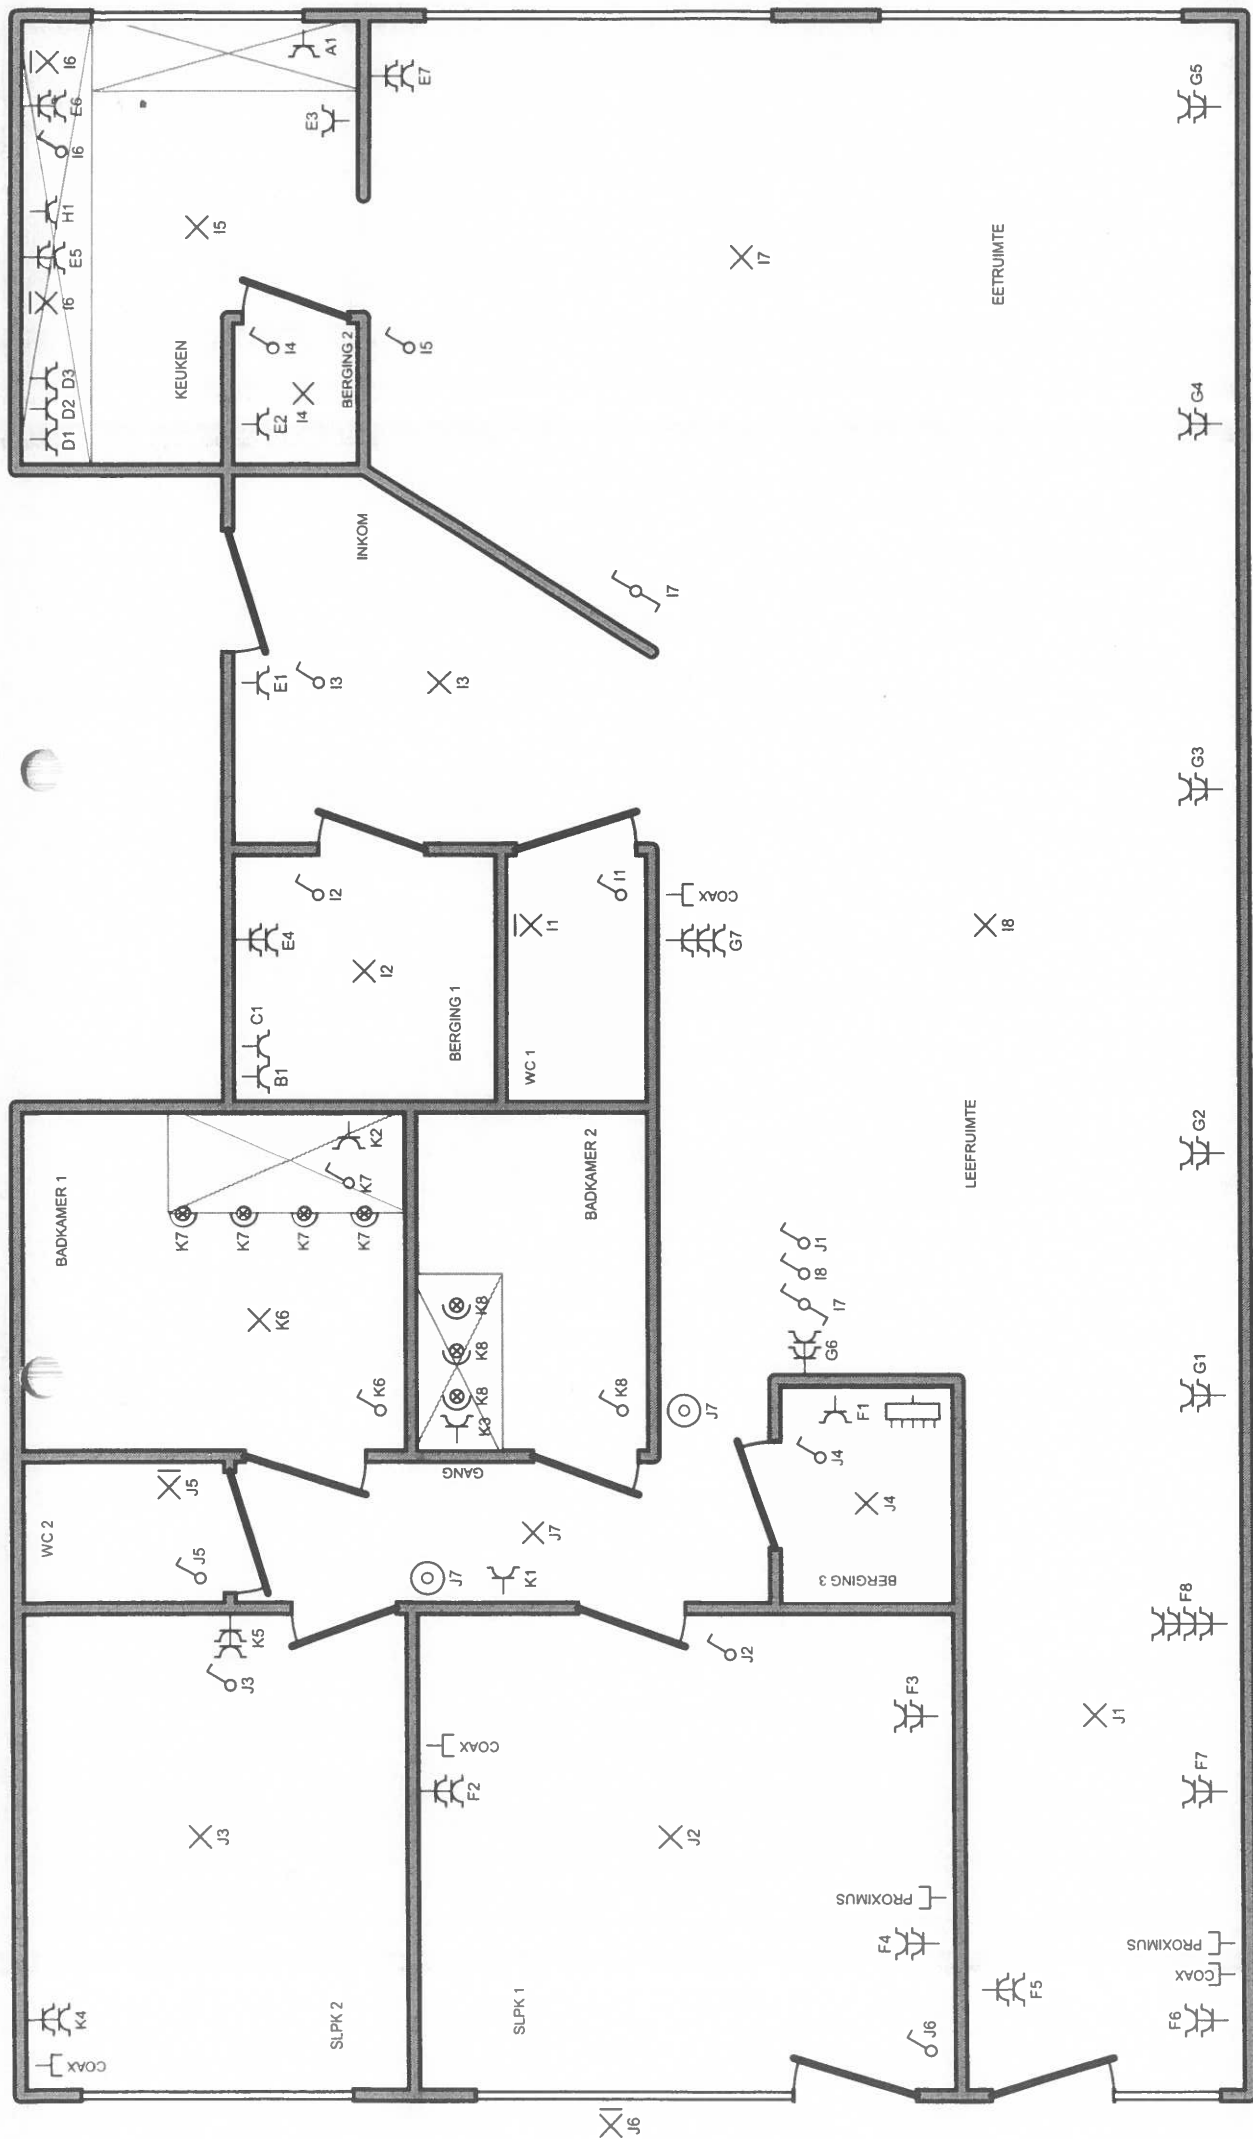

Plaats van de elektrische installatie

ERIC WILLEKENS
BREDABAAN 380
BRASSCHAAT

Installateur

Crea-Accent B.V.B.A.
Kerkstraat 2
2970 s'Gravenwezel
Tel.: 03 425 64 12 GSM: 0472 25 52 57
e-mail: jeroen@crea-accent.be
BTW BE 0809.165.189



Crea Accent

p. 3/4 Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Goedgekeurde plan IV keuring

A VAATWASSER

B WASMACHIEN

C DROOGKAST

K VERL+STOPC :
SLPK 2 /
GANG /
BADK 1+2

D STOPC :
IJSKAST /
DIEPVRIES /
COMBIOVEN

E STOPC :
BERGING 1+2 /
INKOM /
KEUKEN /
EETRUIMTE

F STOPC :
LEEFRUIMTE /
BERGING 3 /
SLPK 1

G STOPC :
EETRUIMTE /
LEEFRUIMTE

H KOOKPLAAT

I VERL :
WC 1 / INKOM /
BERGING 1+2 /
KEUKEN /
EETRUIMTE /
LEEFRUIMTE

J

VERL :
LEEFRUIMTE /
WC 2 / GANG /
BERGING 3 /
SLPK 1+2 /
TERRAS

Plaats van de elektrische installatie

ERIC WILLEKENS
BREDABAAN 380
BRASSCHAAT

Installateur

Crea-Accent B.V.B.A.
Kerkstraat 2
2970 s'Gravenwezel
Tel.: 03 425 64 12 GSM: 0472 25 52 57
e-mail: jeroen@crea-accent.be
BTW BE 0809.165.189



Crea Accent


Goedgekeurde plan IV Keuring

p. 4/4
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz
