

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 14/06/2021 **Date d'émission du rapport:** 14/06/2021
Rapport N°: 0002-210614-05

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen

Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles

T: 064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0002

Identification des tiers:

Client: VANDENDRIESSCHE PIERRE

Adresse: RUE PIERRE MODESTE 2 BIS, 6470 MONTBLIART

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: Résidence D 'Ospenne

Adresse: RUE DE LA FAGNE 6, 6460 CHIMAY

Responsable des travaux: VANDENDRIESSCHE PIERRE

Adresse: RUE PIERRE MODESTE 2 BIS, 6470 MONTBLIART

Numéro de TVA: 0662203261

Identification de l'installation électrique:

Nom: Résidence D 'Ospenne

Adresse: RUE DE LA FAGNE 6, 6460 CHIMAY

Code EAN:

Numéro compteur: placé

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: appartement et gîtes

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: XVB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 5

Valeur nominale de la protection du branchement: 30A

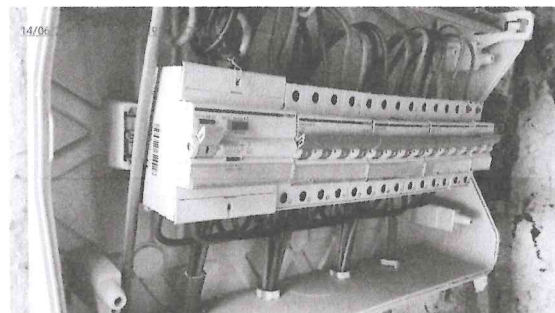
Type de coupure générale: 63A 0,3A IV S , A

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 37 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 63 A 300 mA typage A et S , circuit(s) protégé(s): Voir schémas

**Résultats du contrôle:****Mesures et essais:**

Résistance de dispersion de la prise de terre: 24 et 26 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 5 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 14/06/2046
 - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.





Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0002 p.o. du directeur technique

14/06/21 22:35

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum



N° Rapport: 0002-210614-05

3 / 4



N° Rapport: 0002-210614-05

4 / 4

