

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr: 52.224

Date du contrôle: 05-09-2024	Agent-visiteur: Emin Avci	De datum van opstelling: 09-09-2024 20:23:48
Plaats van het onderzoek: Nazarethsesteenweg 63 - 9800 Deinze België	Aard onderzoek: Controlebezoek (Livre 1 6.5)	Volgend controlebezoek: 05-09-2049
Installatietester:	TI-09/5306041	

Opdrachtgever

Naam	PEB Certi
Adres	Blaisantvest 105 -, 9000 Gent Belgique
Telefoon	+32 2 466 45 66 +32 485 47 47 20
Email	epc.certi@gmail.com

Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Identificatie van de elektrische installatie

Adres van de installatie	Nazarethsesteenweg 63 - 9800 Deinze België
Gebouw	Huis
Eigenaar	Eigenaar Nazarethsesteenweg 63 - 9800 Deinze
Adres van de eigenaar	
Fundamenten	vóór 81
Datum van de uitvoering van de installatie	Vanaf 81

Gegevens verdeler

DNB	Fluvius
Nummer teller	1sag3200072484
EAN code	
Meter/bord verbinding	XVB 4X10
Net spanning	3 x 400 V + N
Maximum beveiliging	25 A 4P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Onderzoek

Schema's OK

Equipotentiale verbindingen OK

Beschrijving van de installatie

Zie schema

Aantal verdeelborden	2
Hoofd differentiëlschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Prise de terre	Aardingspen
Prise de terre	5
Isolatiemeting ($M\Omega$)	3


Besluit

BESLUIT : VOLDOET

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema(s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.


Handtekening van de inspecteur

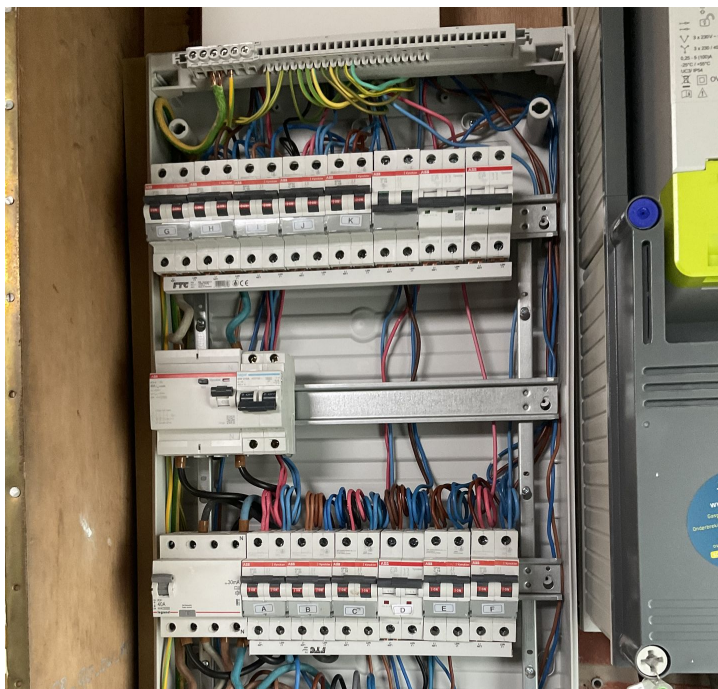

Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

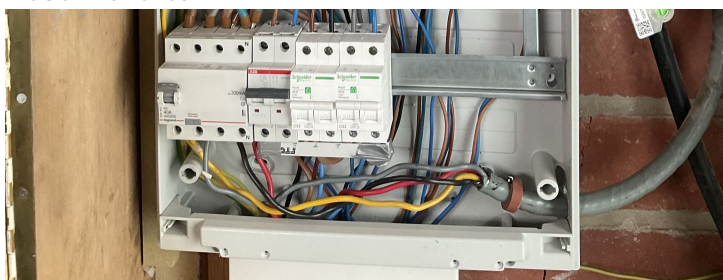

Verdeelbord 1

Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2
De schema's van de elektrische installatie zijn op het tijdstip van de inspectie aanwezig en werden ter plaatse gecontroleerd. Deze moeten opnieuw worden getoond bij de volgende (her)inspectie.	RDE3
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6
Deze inspectie heeft alleen betrekking op het bewoonbare gedeelte van het gebouw.	RDE10

Bewoordingen	Foto
--------------	------
