

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0483-180326-03 Datum van het onderzoek : 26/03/2018
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : GUARAGNA
CAMILLE HUYSMANSLAAN 31/9-3e
2020 ANTWERPEN

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : GUARAGNA
Adres : CAMILLE HUYSMANSLAAN 31/9-3e
2020 ANTWERPEN

OPDRACHTGEVER : GUARAGNA
Adres : CAMILLE HUYSMANSLAAN 31/9-3e
2020 ANTWERPEN

INSTALLATEUR :
Adres :

BTW of IK :

EAN : Teller nr. 46'024'765 Index :



ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering: Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Voor & Na 01/10/81
Aansluiting spanning : 3x230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 6 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	aut 40 A
Type van de aardelektrode: Baren	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen :	8
Uitwendige invloedsfactoren :	Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 276,
Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 29 Ohm RI tot >10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 Herkeuring van verslag 0483-161116-02, aardingsweerstand overgenomen.

Besluit De installatie is conform.
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/03/2043 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0483 BEN VERVOORT

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - de controle van de foutkussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 26/03/2043.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.



Doc. nr. TICK_18/0029374	Datum van aanvraag 23/03/18	Aangemaakt door ANTCW	Agent 0483
Klantnummer K09785867	Datum en uur van controle 26/03/18, 11:00	Vermoedelijke duur 1 uur	Verslagnr. 0483-180326-03

COÖRDINATEN OPDRACHTGEVER:

NAAM : GUARAGNA
 PLAATS : 2020 ANTWERPEN
 STRAAT : CAMILLE HUYSMANSLAAN 31/9-3e
 TEL/GSM : 03 239 65 46 OF 0499 46 93 09
 FAX :
 BTW-nummer :
 Referentie klant :

PLAATS VAN ONDERZOEK:

NAAM : GUARAGNA
 PLAATS : 2020 ANTWERPEN
 ADRES : CAMILLE HUYSMANSLAAN 31/9-3e
 TEL/GSM : 03 239 65 46 OF 0499 46 93 09
 CONTACTPERS. :

AARD CONTROLE:

Elektriciteitskeuring laagspanningsinstallatie, volgens werkinstructie 10IE006

Onderstaande prijs is berekend op basis van de ons bekende gegevens op het moment van de planning.
De agent-onderzoeker bepaalt de uiteindelijke prijs op basis van de reële gegevens op het moment van de keuring.

	Excl. BTW	Incl. BTW
Indicatieve prijs Herkeuring: 20 Kringen	€ 109,69	€ 132,72
Te factureren bedrag	€ 109,69	€ 132,72
Nr. ontvangstbewijs	697342	

Betaalwijze: Bancontact

BIJKOMENDE INLICHTINGEN:

HERKEURING VAN 0483-161116-02

Annulatie reden:

Bij annulatie door klant is een schadevergoeding van 100,-€ verschuldigd, zie art 3.4 algemene voorwaarden BTV.

Verslag afgegeven aan:

Ondergetekende opdrachtgever, verklaart hiermee opdracht gegeven te hebben aan BTV om over te gaan tot het onderzoek en de corresponderende kosten verbonden aan deze door BTV uitgevoerde diensten aan BTV te betalen. BTV bezorgt de opdrachtgever een factuur. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de algemene factuur- en betalingsvoorwaarden van BTV zoals deze voorkomen op de keerzijde van de factuur en die tevens zijn vermeld op www.btvcontrol.be. Keuringsverslagen worden slechts bezorgd na betaling van de factuur. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Aldus opgemaakt te ANTWERPEN op datum van 26/03/18


ONDERGETEKENDE,

Naam, voornaam giuliana guaragna

Handtekening



Bord woning 3 x 230 Volt

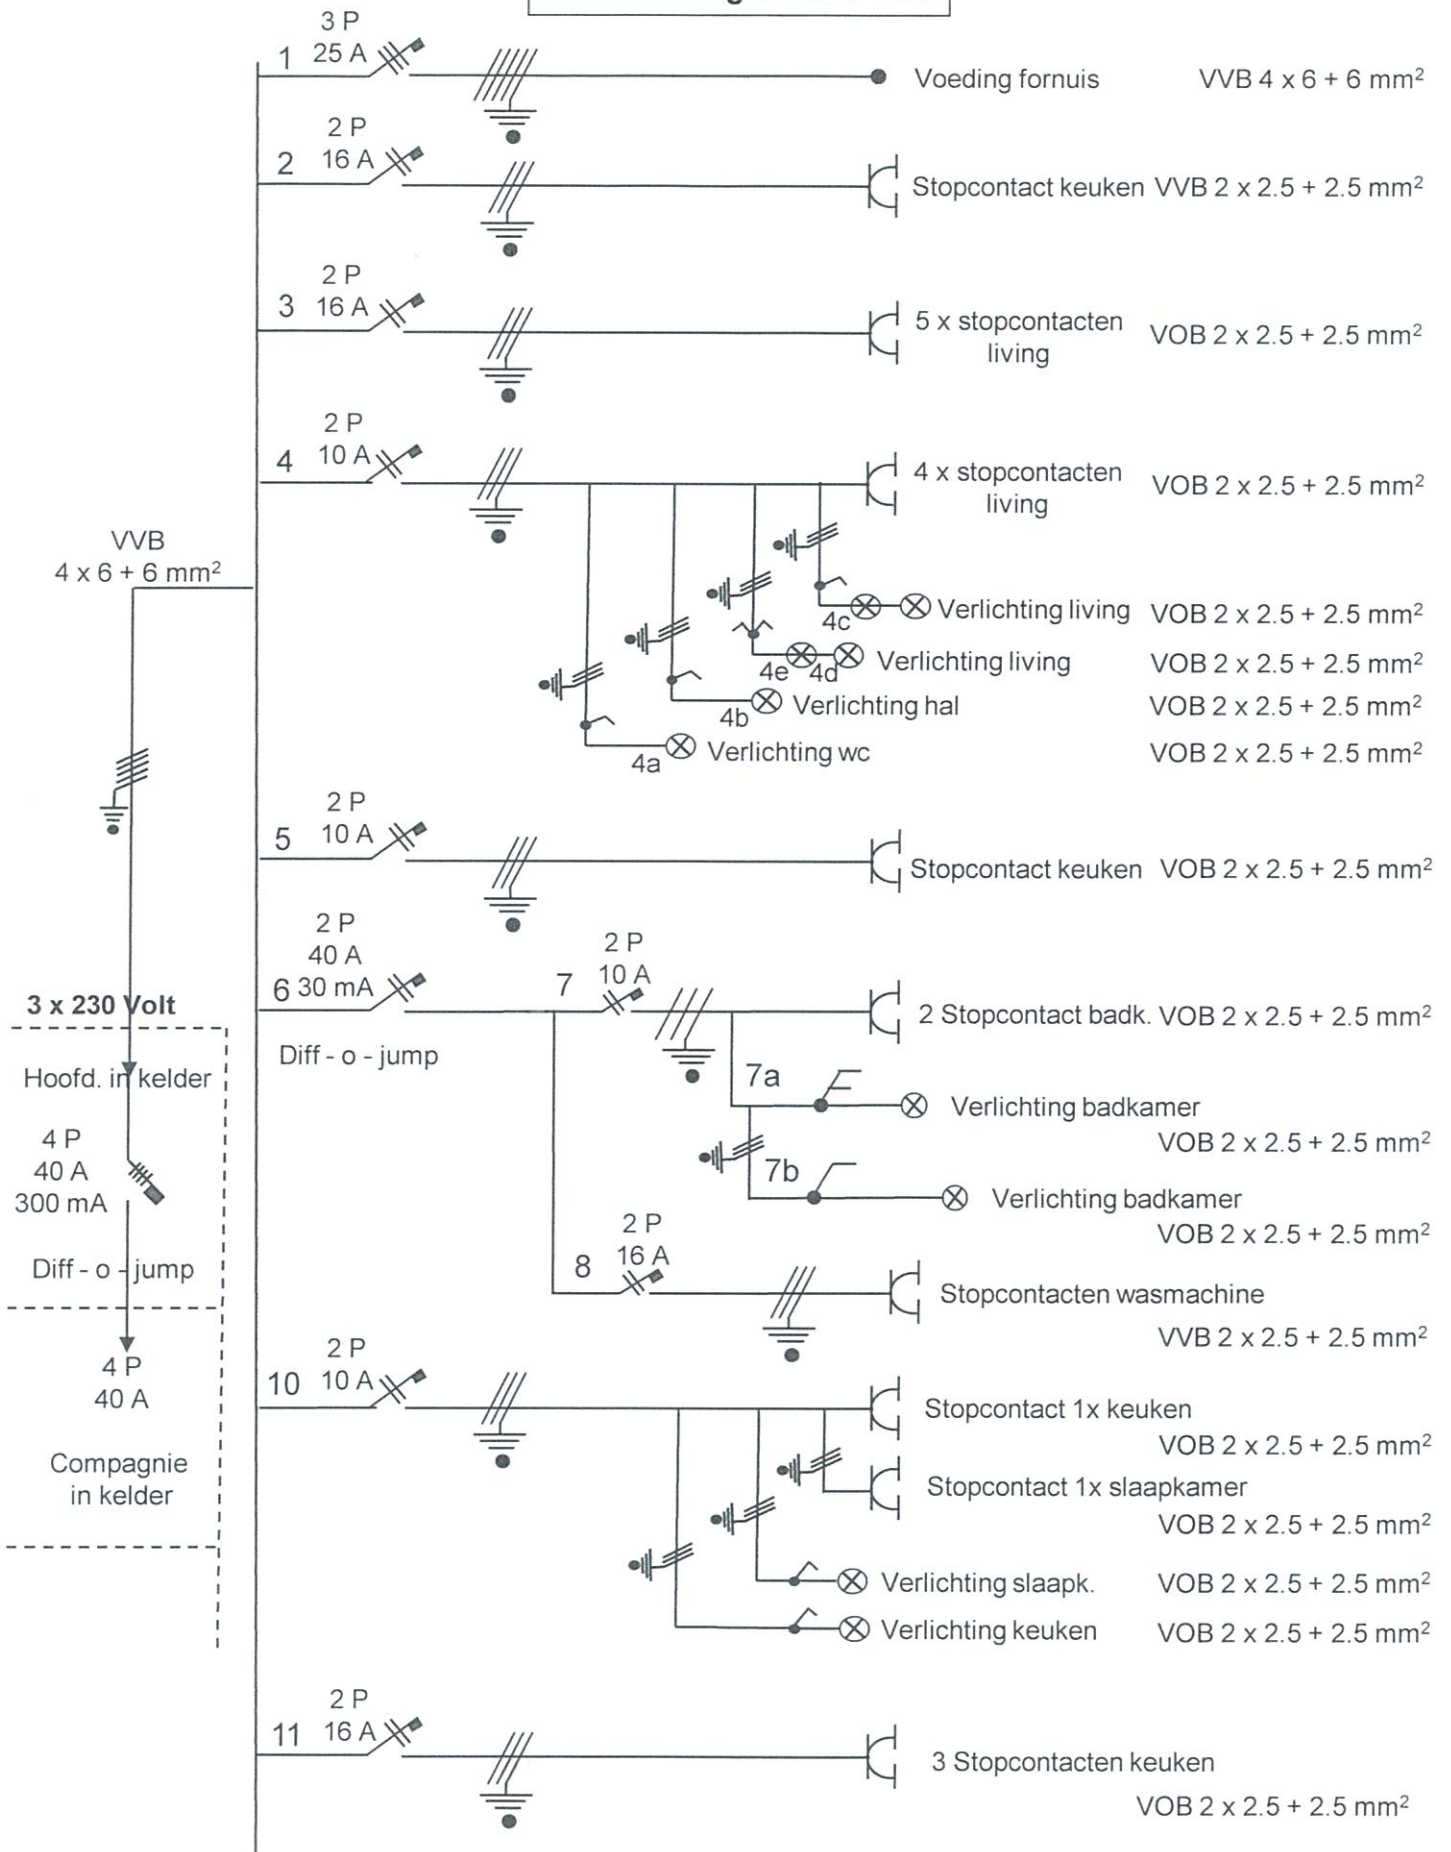

0783-180326-03

Ben Verwoort
BTV



1

Fornuis

2

Bovenste stopcontact keuken

3

Living - Rechts

4

Living – Links & Verlichting + Hal + Wc

5

Stopcontact boven fornuis in keuken

6

Diff – O - Jump

7

Badkamer

8

Onderste stopcontact keuken (wasmachine)

10

Slaapkamer + Verlichting keuken + 1 Stopcontact

11

Stopcontact keuken – Links (microgolfoven)
+ 2 stopcontacten naast ijskast
