



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 16/05/2024

Inspecteur: Michael De Landsheer

Mentor:

Installateur: B-Tec

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0674 812 172

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serienummer: 19481257

Datum verslag: 16/05/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Molenhoek
Huisnummer 1
Busnummer A
Postcode 9340
Gemeente Smetlede
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Molenhoek
Huisnummer 1
Busnummer A
Postcode 9340
Gemeente Smetlede
Land België

Installateur

Naam B-Tec
BTW nr. BE 0674 812 172
Telefoonnummer +32 477 18 72 23
E-mail elektriciteitswerken.btec@gmail.com

Type : andere

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr. :

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 3

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1000 MΩ
RE: 11,61 Ω

OK
OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	NVT	NVT
BESCHRIJVING INSTALLATIE							
Aantal kringen		Curve	Bescherming IN (A)	(andere)		P	Sectie (mm²)
1		C	20			2	2,5
Visueel nazicht (algemeen)	OK		Directe aanraking	OK		Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK		schema in bijlage door Aceg vzw		NA		
Equipotentiale verbindingen	OK		Doorsnede geleiders	OK			
Continuïteit	OK		Verlichting / toestellen	NVT			
Uitwendige invloeden	OK						

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT


- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 16/5/2025
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG
De inspecteur Michael De Landsheer

De werknemer,

Michael De Landsheer
ACEG VZW-#117

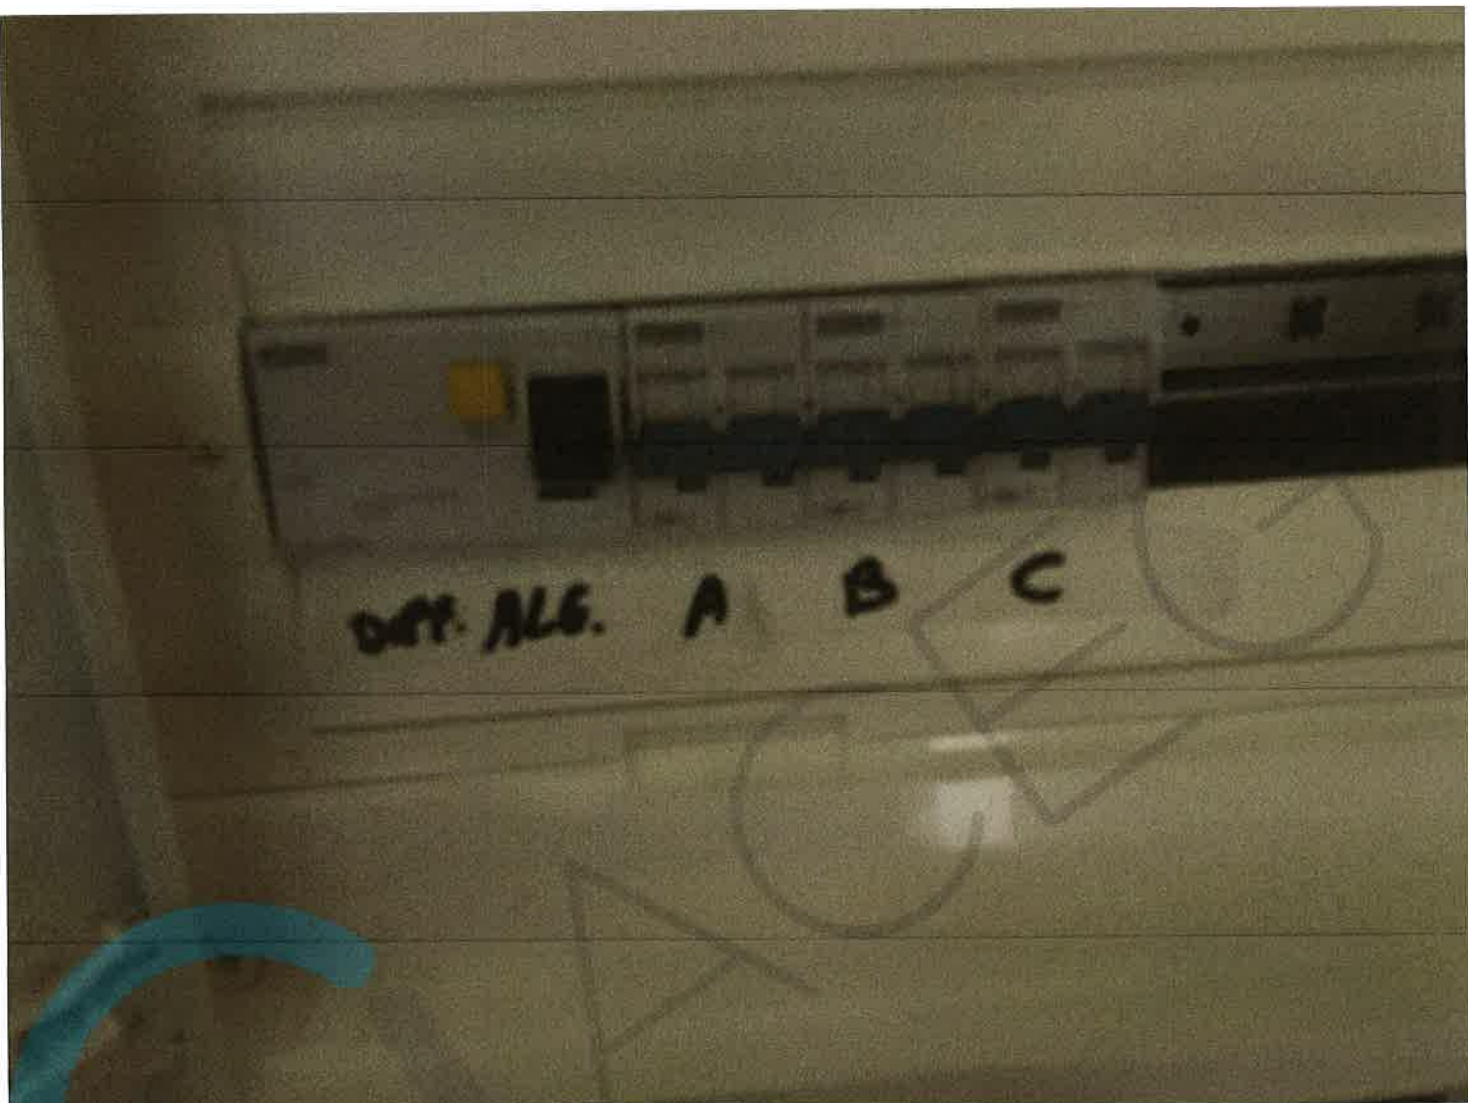

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/5/2025	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



