



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 17/09/2021
Verslagnummer: 0346-210917-01

Uitgiftedatum verslag: 17/09/2021

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0346

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: MARIEN IVO
Adres: ZODIAKSTRAAT 15, 2500 LIER
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: MARIEN IVO
Adres: ZODIAKSTRAAT 15, 2500 LIER
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: /
Adres: ,
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: MARIEN IVO
Adres: ZODIAKSTRAAT 15, 2500 LIER
EAN- code:
Nummer teller: Nog te plaatsen
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 Elektriciteit living, salon, fietsenstalling nog te plaatsen.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.




Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Onbekend
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A
 Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 19 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

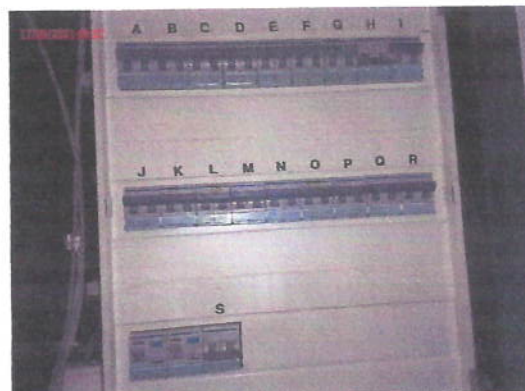

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 18,3 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 1 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 Het begin van de werken van de elektrische installatie is gestart vóór 1 juni 2020, zie document nr. M1O gedateerd op 17-09-2021

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 17/09/2046
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



