

Opdracht: 101167
Klant / Bedrijf: Stefan Dai Construct(SRL)
ID Extern:

Klantnr.: 00096435
Adres: Rue Provinciale 131, 1301 Wavre
Voorl.verslagnr.: 20260009940

Contactpersoon:
BTW: BE0740435048
Uitgiftedatum: 2026-10-24
SO/26007140
VERTAALD EXEMPLAAR

Verslagnr: **20260011366-V.1**

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Nieuwe installatie

Plaats van onderzoek: Piercostraat n°37 3400 Landen -

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.

Inspectiedatum: 30-09-2026

Inspecteur: Alexandre LE LOUARN

Eigenaar: Inconnu

Cont.Pers.:

Documenten van referentie:

Periodiciteit: 25 jaar indien conform, anders Lokaal: Woning
onmiddellijk (voor de ingebruikname).

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname

Volgende controle op: **30-09-2051**

Installateur: Stefan Dai Construct(SRL)

B.T.W.: BE0740435048

tel.:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS

EAN nr.: Non disponible/N.V.T

Teller: 1LGZ0568031717

Dienstspanning: 2x230V

I max. aansluiting: 40A

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: XVB

Type stroom: Wisselspanning

Bescherming van de hoofdaansluiting: 4P40A

Aantal geleiders: 4

Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Beschrijving installatie:

☒ zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig de schema's en plannen in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

Foutlus controleren: in orde

Aardelektrode:

Type: lus

Algemene continuïteit: in orde

Materiaal: in orde

Diff.algemene schak.: 2p 40A/300mA

Differentieelbeveiligingen: 5 x [2p/ 40A/ 30mA Type A]

Nog niet

geplaatst:

Aantal borden: 1

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene isolatieweerstand: 5 Mohm

Doorsnede: 35 mm²

Spreadingswaarde: 12,55 Ohm

Type: Type A

Aantal circuits: 35

Onveilige / beschadigde toestand van vaste stationaire apparatuur vastgesteld: in orde
Overstroombeveiligingsinrichting geschikt voor de doorsnede van het circuit:

Gevaarlijke verplaatsbare machine met vaste standplaats: N.V.T.

CONCLUSIE



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

OPMERKING

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar gestandaardiseerde inbreuken

N12() - Het onderzoek beperkt zich enkel tot de bereikbare en zichtbare delen van de elektrische installatie. Inspectbelgium is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken.

N04() - Deze controle heeft uitsluitend betrekking op het nieuwe LS-gedeelte van de elektrische installatie. Het bestaand gedeelte maakt geen deel uit van het onderzoek.

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ADVIES/OPMERKINGEN:


Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:

- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Volgens de onderafdeling 3.1.2.1. van het Boek 1 is het belangrijk te herinneren:

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

SCHEMA UNIFILAIRE
TD MAISON

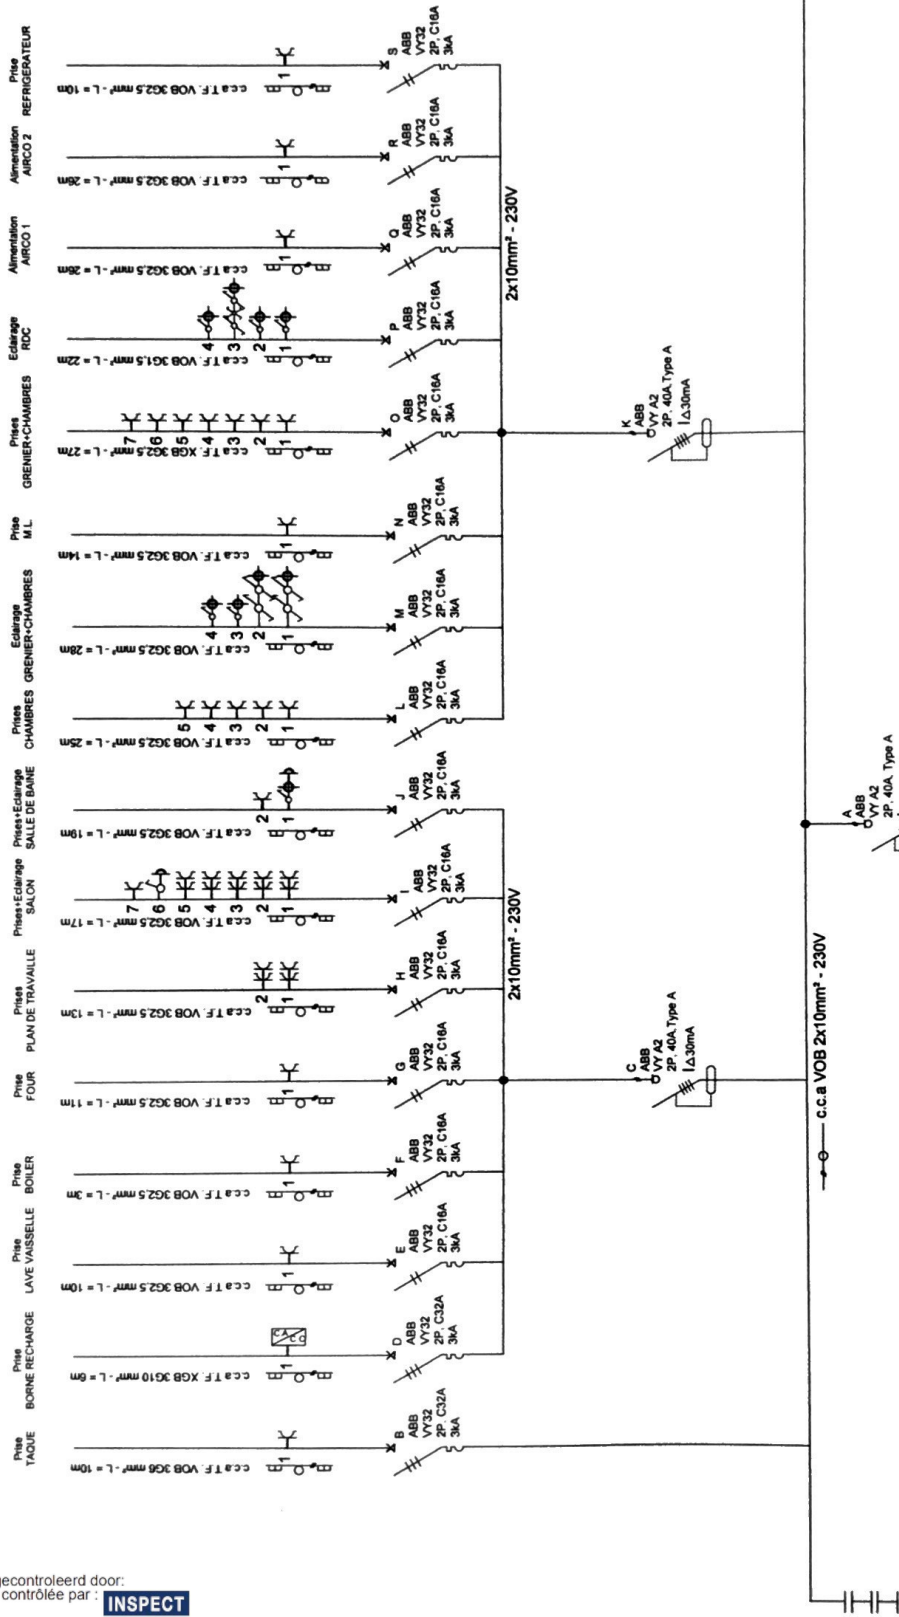

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : **INSPECT**
BELGIUM

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 880 460 - 010 280 577

Inspecteur : **Alexandre LE LOUARN**
Handtekening / Signature :

[Handwritten signature]

Plan AS-BUILD

WERF/CHANTIER/CLIENT

KEURING/CONTROLE


INSTALLATEUR

NAAM/NOM :
STRAAT/RUE : Piercostraat 37
GEMEEN/COMMUNE : 3401 Landen
HANDTEK/SIGNATAIRE :

NAAM/NOM :
STRAAT/RUE : Piercostraat 37
GEMEEN/COMMUNE : 3401 Landen
HANDTEK/SIGNATAIRE :

ORGANIS :
NAAM/NOM :
DATUM/DATE :
HANDTEK/SIGN :

NAAM/NOM :
BTWIVA :
DATUM/DATE :
HANDTEK/SIGN :

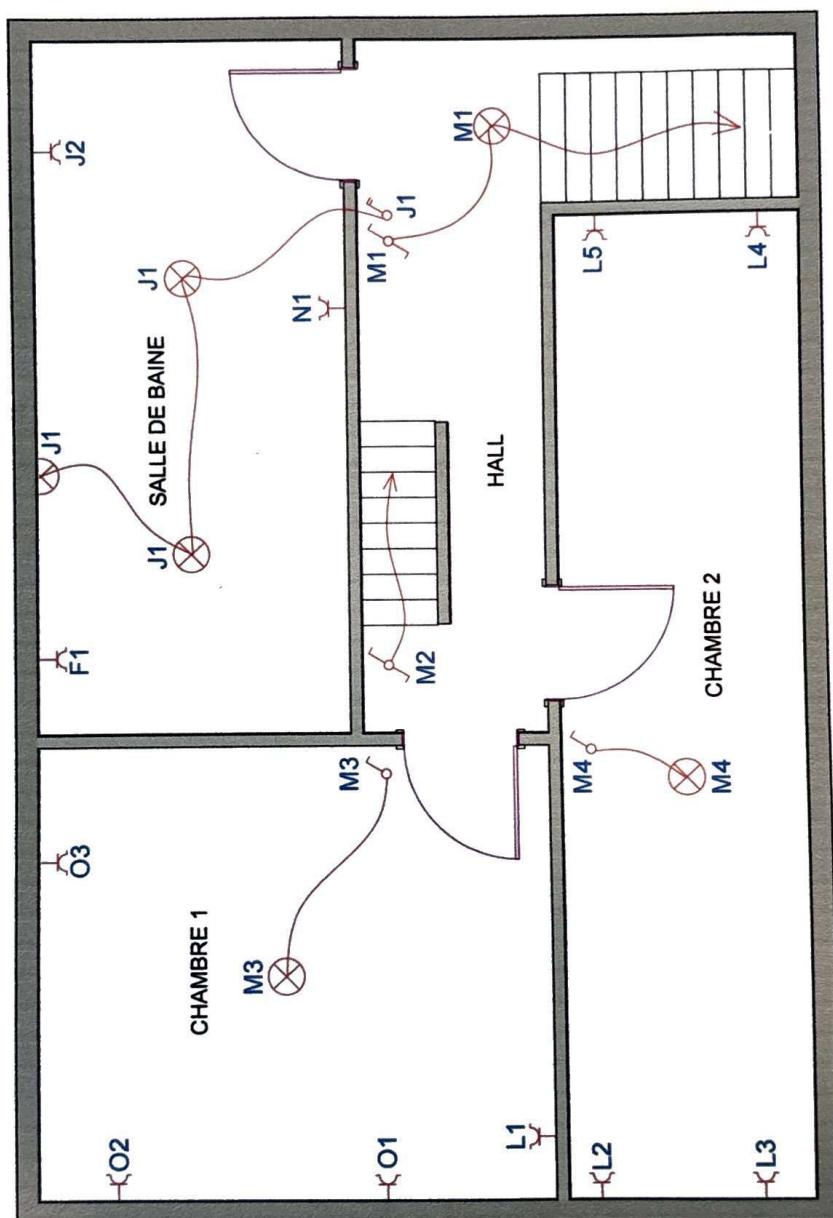

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : 

INSPECT
BELGIUM

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577

Inspecteur : Alexandre LE LOUARN

Handtekening / Signature :

Signing / Signature :

Plan AS-BUILD	2026.505	WERF/CHANTIER/CLIENT	NAAMNOM : - STRAAT/TRUE : Piercostraat 37 GEMEENSCOMMUNE : 3401 Londen HANDTEKENSIGNAIRE :	KEURING/CONTROLE	ORGANIS : NAAMNOM : DATUM/DATE : HANDTEK/SIGN :	INSTALLATEUR	NAAMNOM : BTW/TVA : DATUM/DATE : HANDTEK/SIGN :

