


 J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW Externe Dienst voor Technische Controles ☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86 ☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87 e-mail info@vanhemelen.org BTW BE 0422.507.353	Aanvraagnr. 3763 Ref. verslag RAP EH/20101030-9C	Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270) ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271) ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276) ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)					
Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	HAEMELS-DEWIT	Voornaam		Postnr	2900		
Adres	H. GEERTSSTRAAT 25	Gemeente	SCHOTEN				
Installateur	GEENS EL CO	Gemeente	ST-KAT-WAVER				
BTW-nummer	BE- 0460909554						
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	_/_/_/____				
Plaats van onderzoek	HAEMELS DEWIT/BLOK 1 – APP 1 ^{STE} LINKS	Postnr.	2860				
Adres	EIKENLEI 64 BUS 5	Gemeente	BRECHT				
EAN-code	541448860009286560	Elektriciteitsverdelers	netmanagement				
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid						
Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen					
U_{nom} (V ac/dc)	2X230V	5x2P-AUTOM 16A – 1.5/2.5 mm ²					
Ø voedingskabel (mm²)	4x10 mm ²	9x2P-AUTOM 20A – 2.5 mm ²					
I_{nom} aansluiting (A)	63A	1x2P-AUTOM 32A - 8 mm ²					
Type alg. schakelaar	DIFF.						
Aantal borden	1						
Aantal eindstroombanen	15						
Type aardelektrode	LUS						
Algemene diff.stroom.inr.	63/0.3A						
Bijkomende diff.stroom.inr.	63/0.03A						
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :							
Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01				
Aardspreidingsweerstand :	3 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	5 MΩ	Werking differentieelstroominrichting :	OK /NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)							
GEEN							
Opm. CV-installatie niet afgewerkt							
Verlichtingstoestellen/badmeubels niet aanwezig							
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____/____-____							
Besluit							
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)							
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ____/____/____							
Volgend controlebezoek uiterlijk op:	30/10/2035	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	HUS ERIC (24)		Datum onderzoek:	30/10/2010	

Werf: Haemels - De Wit
 Blok 1 - App. 5
 Eikenlei 62
 BRECHT

Elektriciteitswerken :
 GEENS EL.CO.nv
 Lemanstraat 58
 2860 St.-Kat.-Waver

- Legende:
1. Living
 2. Keuken
 3. Inkom
 4. Toilet
 5. Berging
 6. Slaapkamer 1
 7. Slaapkamer 2
 8. Badkamer
 9. Terras
 10. Kelder

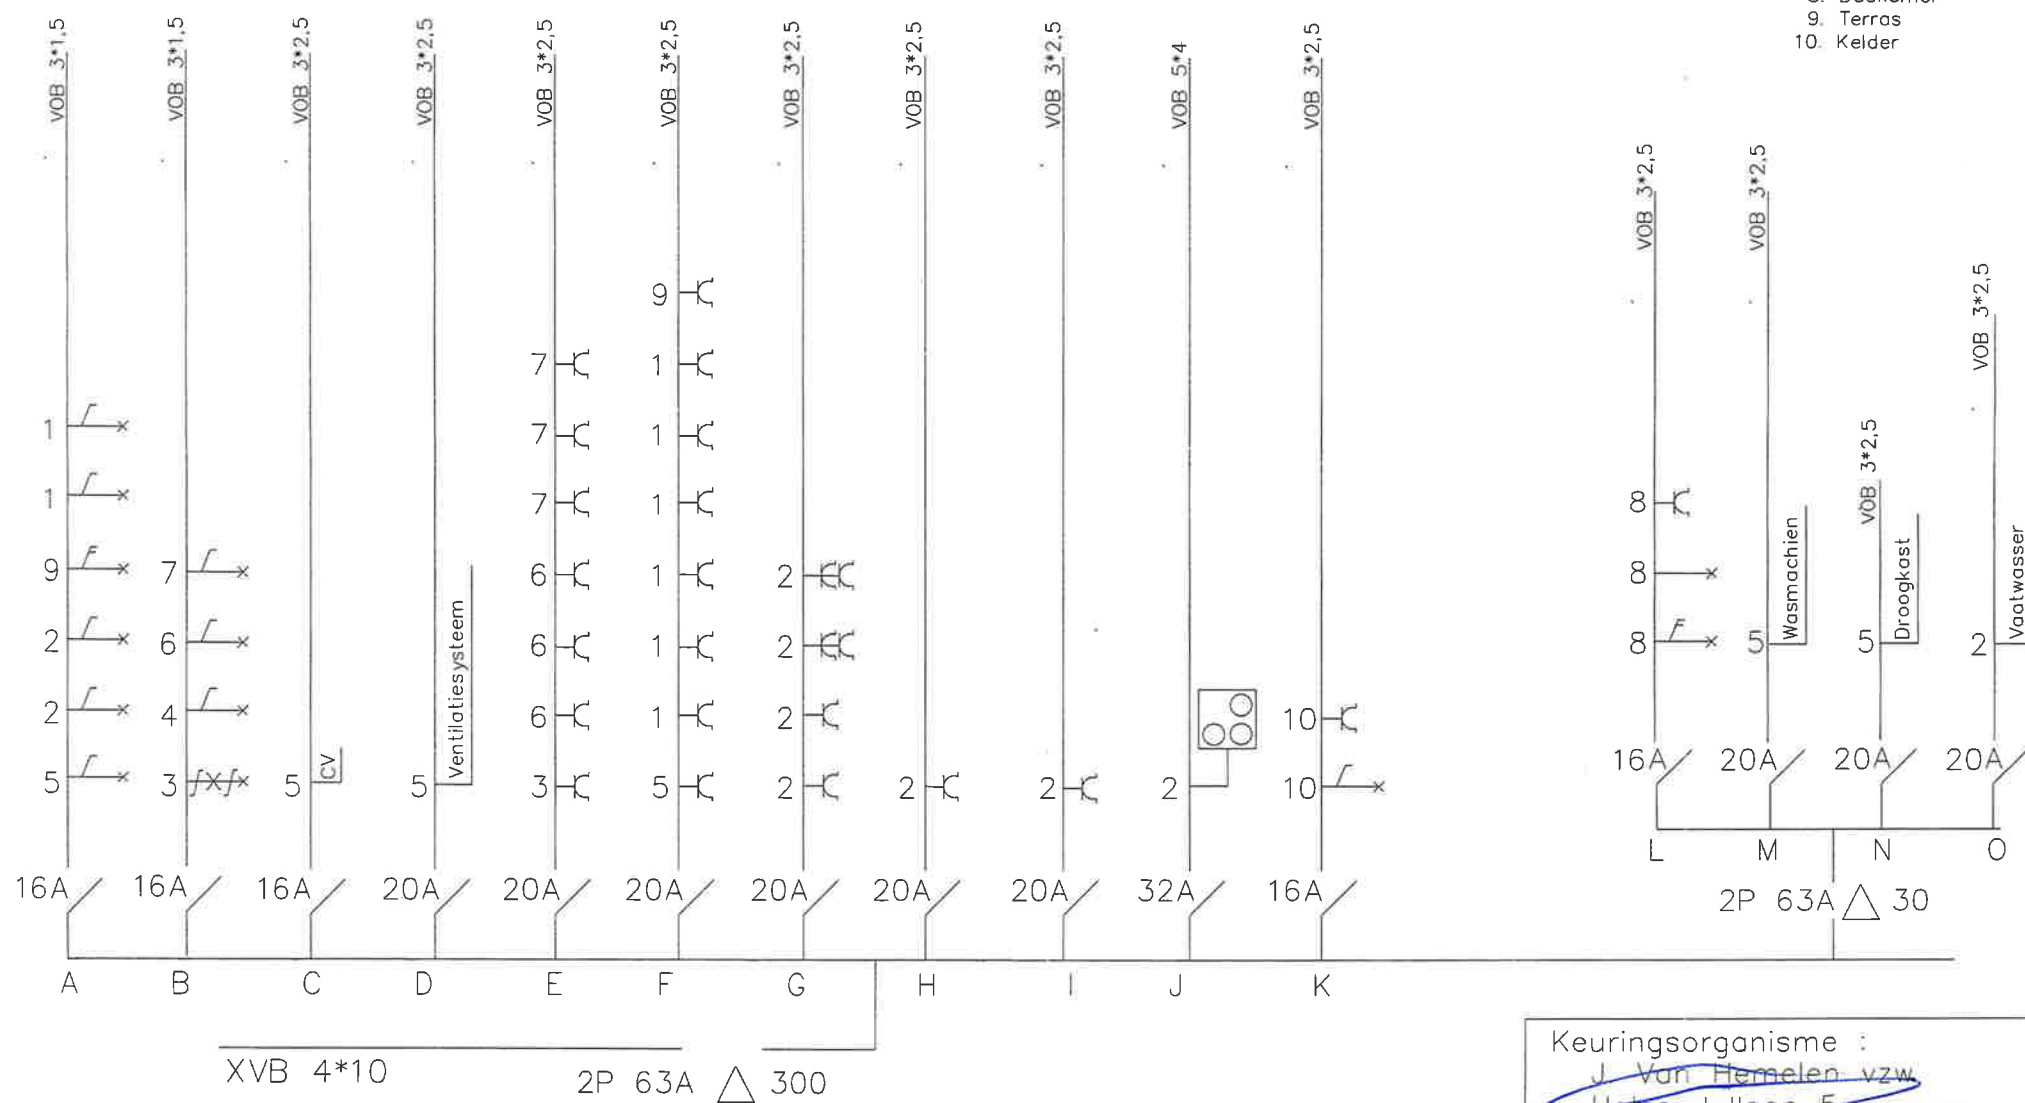

Keuringsorganisme :
 J. Van Hemelen vzw
 Halsendallaan 5
 1852 Alsemberg

Eric Hus 2 bladen 30/10/10

Kelder: σK_1
 θK_1
 $\mp K_2$
