

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 6875
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: marnix@elektro-verschuere.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 4999886-01
Voorl. verslagnr.:
Datum: 22/03/2018

Klant / Opdrachtgever:
VERSCHUERE ELEKTRO
ESSERSTRAAT 12
8550 ZWEVEGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: DE PETTER MATHIAS KLINIEKSTRAAT 13 (LOT 8) ASSENEDE 9960
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 22/03/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2043 Onderzoeker: DEMAEREL BRUNO
Eigendom van: DE PETTER MATHIAS
Installateur: VERSCHUERE ELEKTRO ESSERSTRAAT 128550 ZWEVEGEM
B.T.W.: BE0426590261 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: maatschappij Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 4,6 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 63A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 63A/300mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 1,635 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


N Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

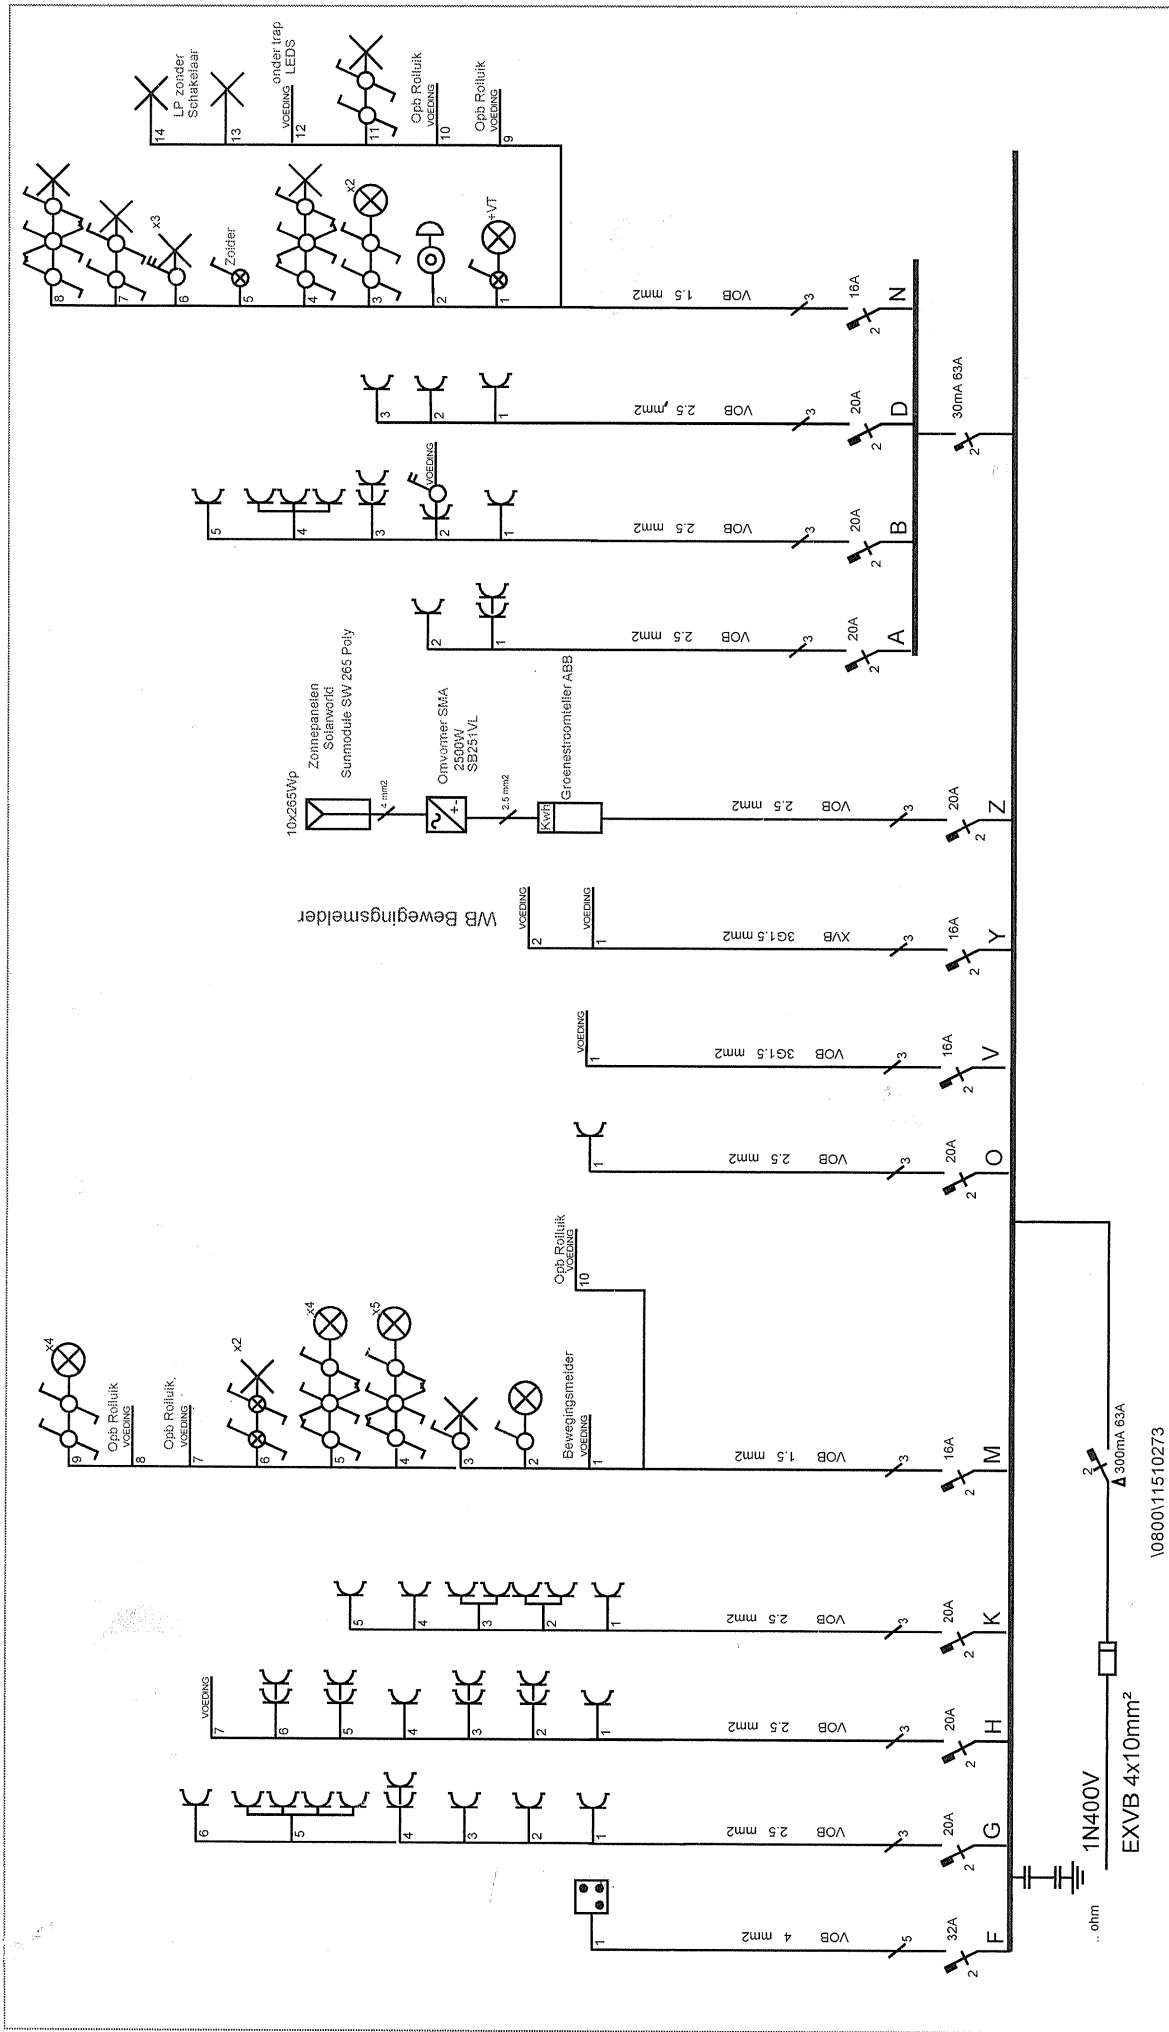


Afgev. erkend organisme 06B / 2018 DEMAEREL PV: 4959306-01 DAT: 22/05/2018	Verantw. uitvoering 24/01/2018	De Petter Matthias Kliniekstraat Nr 13 (Lot 8) 9960 Assenede EAN ?	ELEKTRO VERSCHUERE nv Esserstraat 12 8550 Zwevegem BTW: BE 426.590.261 TEL: 056/71.29.17 FAX: 056/71.26.12
---	--	--	--

CAD 15

**ELEKTRO
VERSCHUERE** nr

Esserstraat 12 8550 Zwevegem
TEL: 056/71.29.17 FAX: 056/71.26.12
BTW: BE 426.590.261

OCB VZW
DEMAEREL
PV: 4999886-2
DAT: 22103176

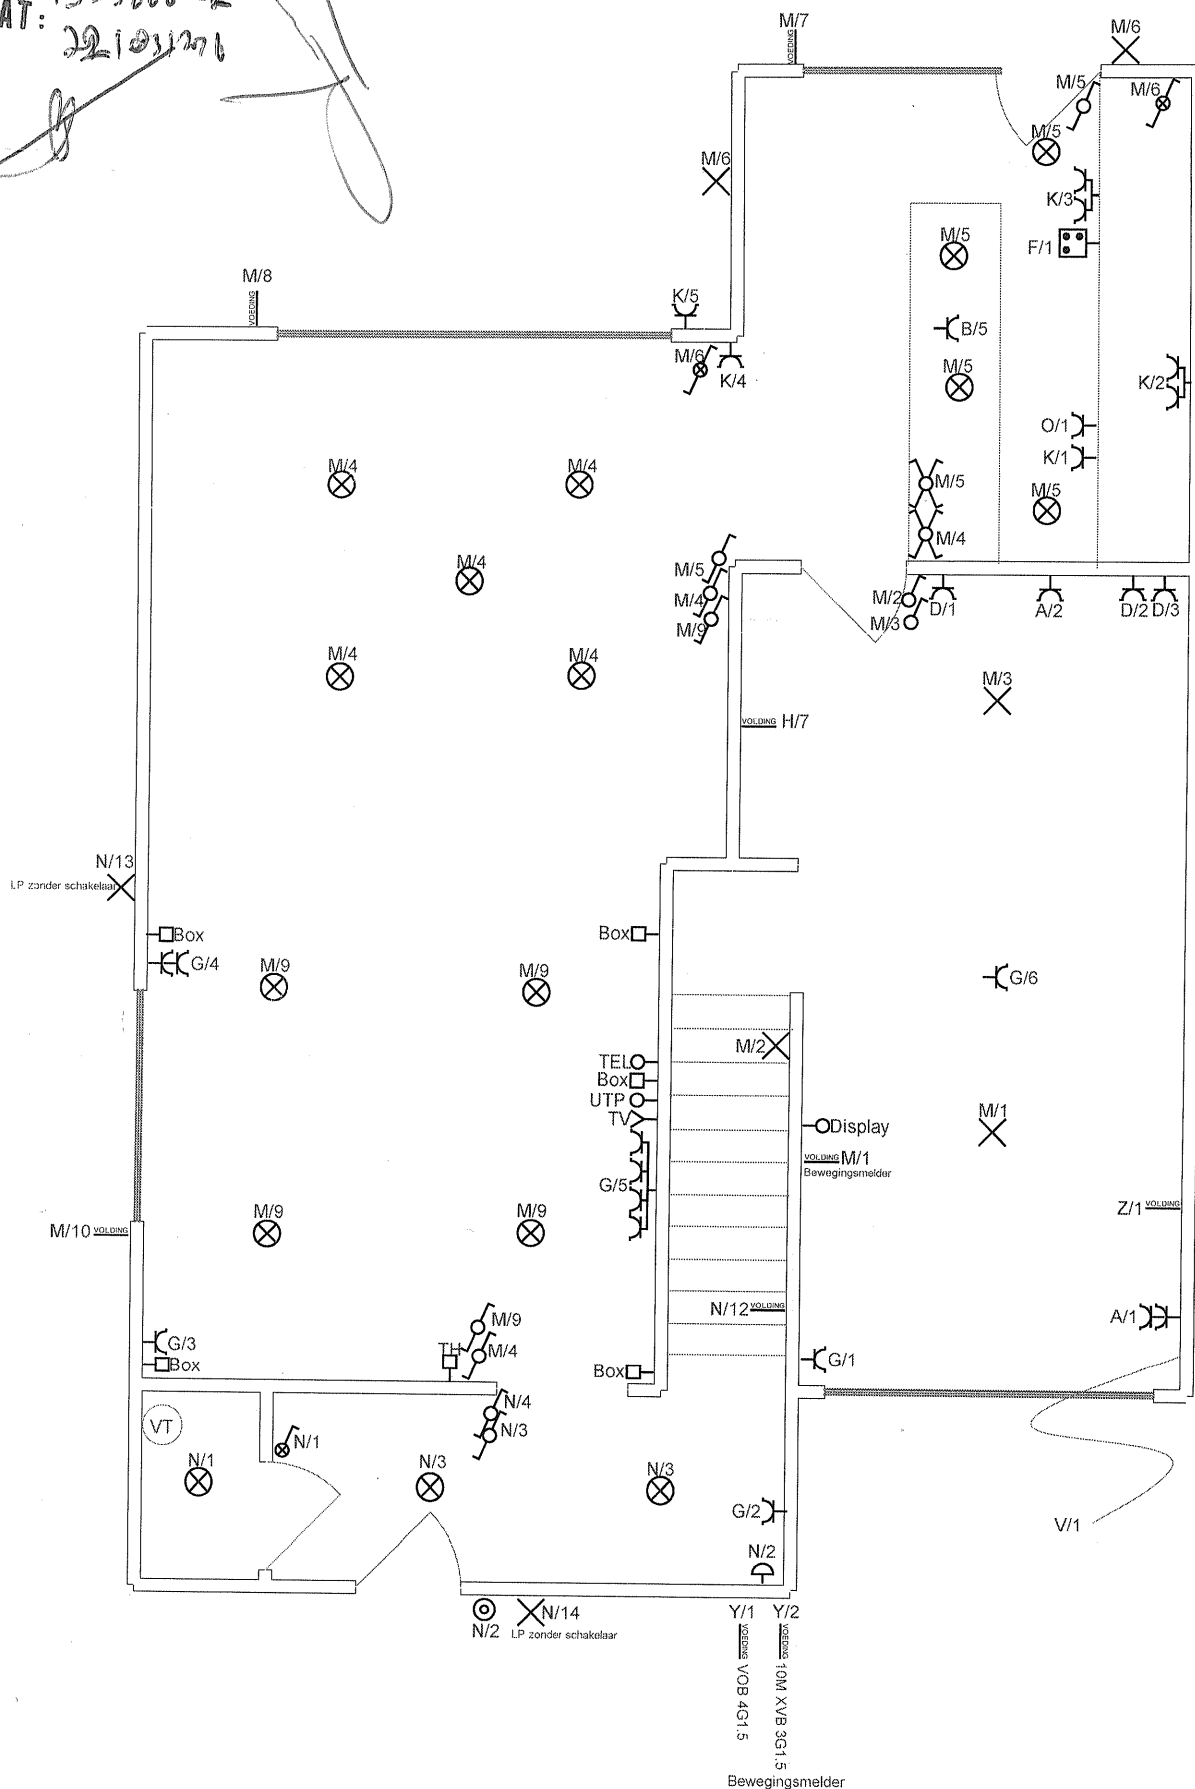

\0800\11510272

CAD 15

OCB VZW
DEMAEREL
PV: 4999886-02
DAT: 22-03-2018

De Petter Matthias

Kliniekstraat Nr 13 (Lot 8)

9960 Assenede

ELEKTRO
VERSCHUERE nv

Esserstraat 12 8550 Zwevegem

TEL: 056/71.29.17 FAX: 056/71.26.12

BTW: BE 426.590.261

