

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 57/2019/80762/01:1

DATUM VAN CONTROLE 25/11/2019 **AGENT** Philip Messiant
ADRES VAN CONTROLE Maria HENriettalei 7 (verdieping 7 TYPE CONTROLE Periodieke keuring (Art. 271)
rechts) - 2018 Antwerpen



> ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie Maria HENriettalei 7 (verdieping 7 rechts) - 2018 Antwerpen
Type van lokalen Wooneenheid (appartement)
Eigenaar Maarten Inghels
Verantwoordelijke voor de werken niet gecommuniceerd
Herhalingsbezoek Certinergie Herkeuring Certinergie

> GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB) IMEA
EAN code niet gecommuniceerd
Nummer teller 43652013
Meterstand dag/nacht 39980/
Type verbinding ondergronds
Voedingskabel hoofdbord VOB 6mm²
Nominale spanning 3x230V - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) 40A

> CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieschema's OK | **Aantal verdeelborden** 3 | **Aantal stroombanen** 18

Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan

De funderingen dateren van	Vóór 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting	ID - 63A - 300mA - type A - test OK
Aarding	Staven	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	ID - 25A - 30mA - type A - test OK
Aardingsweerstand (Ω)	6,9 mli	Dispositief differentieel apparaat	Hoofd - ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Gelijkvormigheid v/d equipotentieel en de PE	OK	Dispositief differentieel	Id 40A 300mA type A test OK
Aardingscontinuïteit	Besluitende	Aansluiting	OK
Foutlus controle	Afdoende	Verlichting/toestellen	OK
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Visuele inspectie v/ vaste &/ mobiele apparaten	OK
		Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK
		Minimum gemeten isolatieweerstand (M Ω)	1,8

BESLUIT : CONFORM

Op de datum **25/11/2019**, elektrische installatie Maria HENriettalei 7 (verdieping 7 rechts) - 2018 Antwerpen is conform bij het algemene reglement op Elektrische installaties.

De controle uitgevoerd door **Certinergie** is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

Eén of meerdere eendraadschema's / situatieschema's zijn gecontroleerd geweest en zijn conform met de installatie.

Zonder belangrijke wijzigingen van de elektrische installatie moet de volgende controle voor **25/11/2044** gebeuren.

Handtekening agent

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 57/2019/80762/01:1

> OPMERKINGEN

- Er moeten verzegelaccessoires voorzien worden voor de hoofddifferentieel.

> PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER VAN HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES :

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan de elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie, te voorzien dat de installatie te allen tijde conform blijft, een nieuwe controleonderzoek te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuken of een deel ervan standhouden moet het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag versturen naar de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

Samengevat, welke acties dienen er genomen te worden indien de elektrische installatie conform is?

1

Lees nadrukkelijk
dit proces-
verbaal

2

In het geval van
uitbreidingen,
belangrijke
veranderingen aan
de installatie, laat
de installatie
opnieuw
controleren

3

Als het
geldigheidstermijn
van het rapport is
verstroken, laat de
installatie opnieuw
controleren

4

Certinergie is tot
uw dienst
0800 82 171



PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 57/2019/80762/01:1

BIJLAGEN

Eendraadschema('s) van de installatie

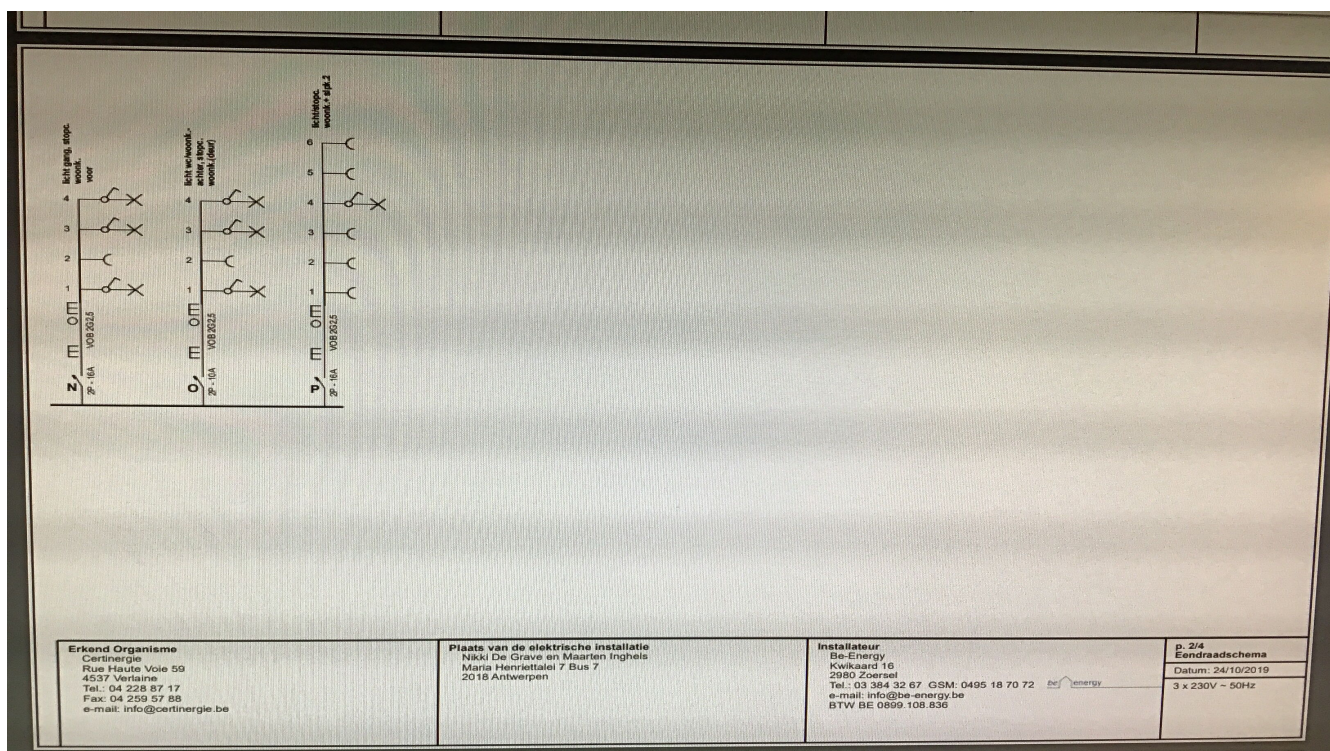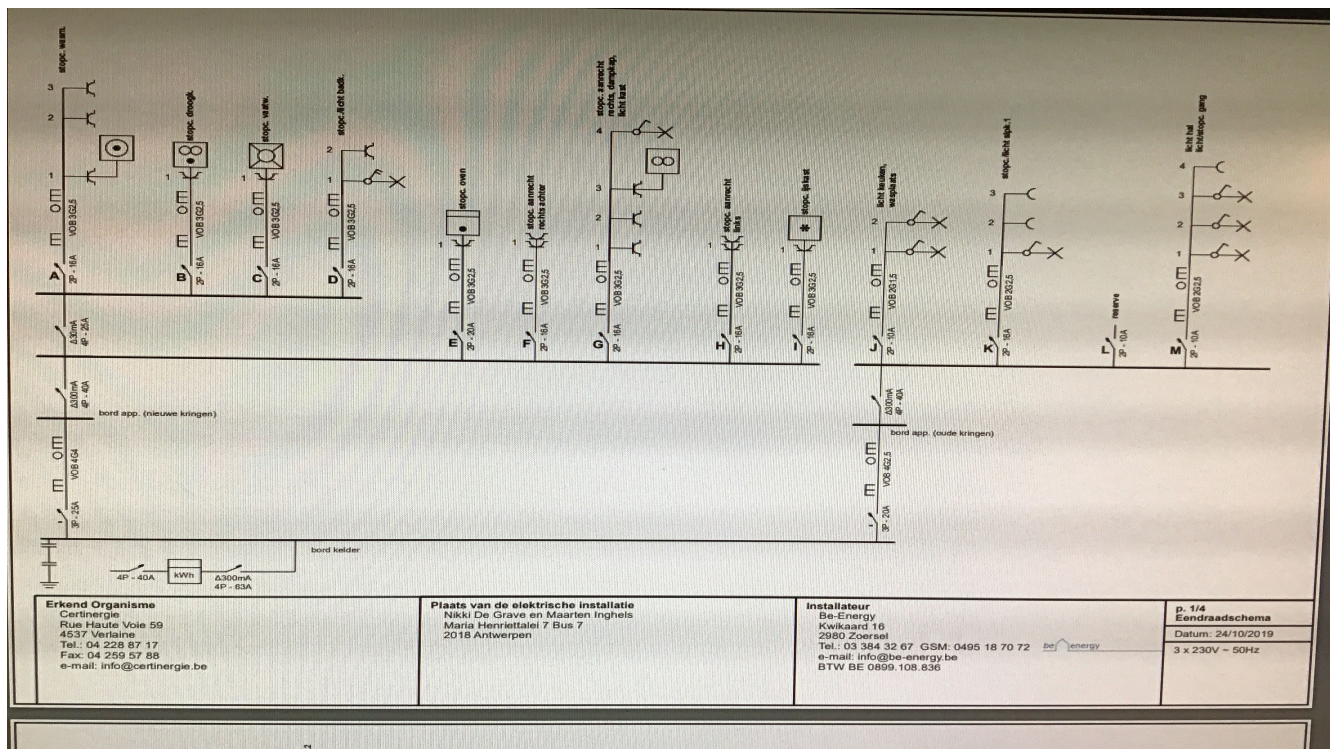

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 57/2019/80762/01:1

> BIJLAGEN

Situatieschema van de installatie

