

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 05/03/2021      Inspecteur: Tom Anthonis      Mentor: -      Installateur: JT Renovation  
ID-label: Algemene delen      B.T.W. nr.: BE 840 192 818      Klantreferentie: -  
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest      Serie Nr.: 18460151  
ET61557

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 503619

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam      Korte Iobroekstraat  
Huisnummer      8  
Busnummer      Aig  
Postcode      2060  
Gemeente      Antwerpen  
Land      België

Naam contactpersoon      Maarten Tonniau  
Telefoon      0497291658  
Gsm nr. (SMS)

Type : gemeensch. delen

EAN : 541448860021003268

#### Eigenaar

Naam      Winvest  
Straatnaam      Korte Iobroekstraat  
Huisnummer      8  
Busnummer      Aig  
Postcode      2060  
Gemeente      Antwerpen  
Land      België

#### Installateur

Naam      JT Renovation  
BTW nr.      BE 840 192 818  
Telefoonnummer      0497291658  
E-mail      maartentoniau@hotmail.com

Teller Nr.: 1SAG1100219058

#### Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS      Spanning: 1N400V      Meter / bord verbinding: 10 mm²      Max beveiliging: 20 A  
Aantal borden: 1      Aantal kringen: 3      Isolatie: 550 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 20.1 Ω

#### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| I <sub>Δ</sub> (mA) | I <sub>n</sub> (A) | I <sub>n</sub> - andere (A) | I <sub>t</sub>   | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300                 | 40                 |                             | 22,5kA2s (3000A) | A    | 3                  | /    | /     |

#### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen              | Curve                                                         | Bescherming IN (A)                                      | (andere)                                                                                | P                               | Sectie (mm²)                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2                           | C                                                             | 16                                                      |                                                                                         | 2                               | 2,5                                                           |
| 1                           | C                                                             | 20                                                      |                                                                                         | 2                               | 2,5                                                           |
| Visueel nazicht (algemeen)  | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | Directe aanraking                                       | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK                           | Indirecte aanraking             | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK |
| Aansluitingen               | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | Correcte schema's                                       | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK                           | schema in bijlage door Aceg vzw | <input type="checkbox"/>                                      |
| Equipotentiale verbindingen | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | niet van toepassing <input type="radio"/> in afwachting |                                                                                         |                                 |                                                               |
| Continuïteit                | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | Verlichting / toestellen                                | <input type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK <input checked="" type="radio"/> NVT |                                 |                                                               |

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

Nota: Opruimen ongebruikte kabels kelder na wegpompen pompen van water.

#### BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 5/3/2046
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n).

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Tom Anthonis


*Tom Anthonis*


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.



- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
  - Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
  - Elk ongeval overkomen van personen en te weten, rechteerks of onrechtterks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
- Kwaliteit**
- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
  - De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be 02 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866 481


| Stappenplan voor een installatie die conform is:                               |                                                                                                       |                                                          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                   | Stap 4                                                      |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 5/3/2046 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |

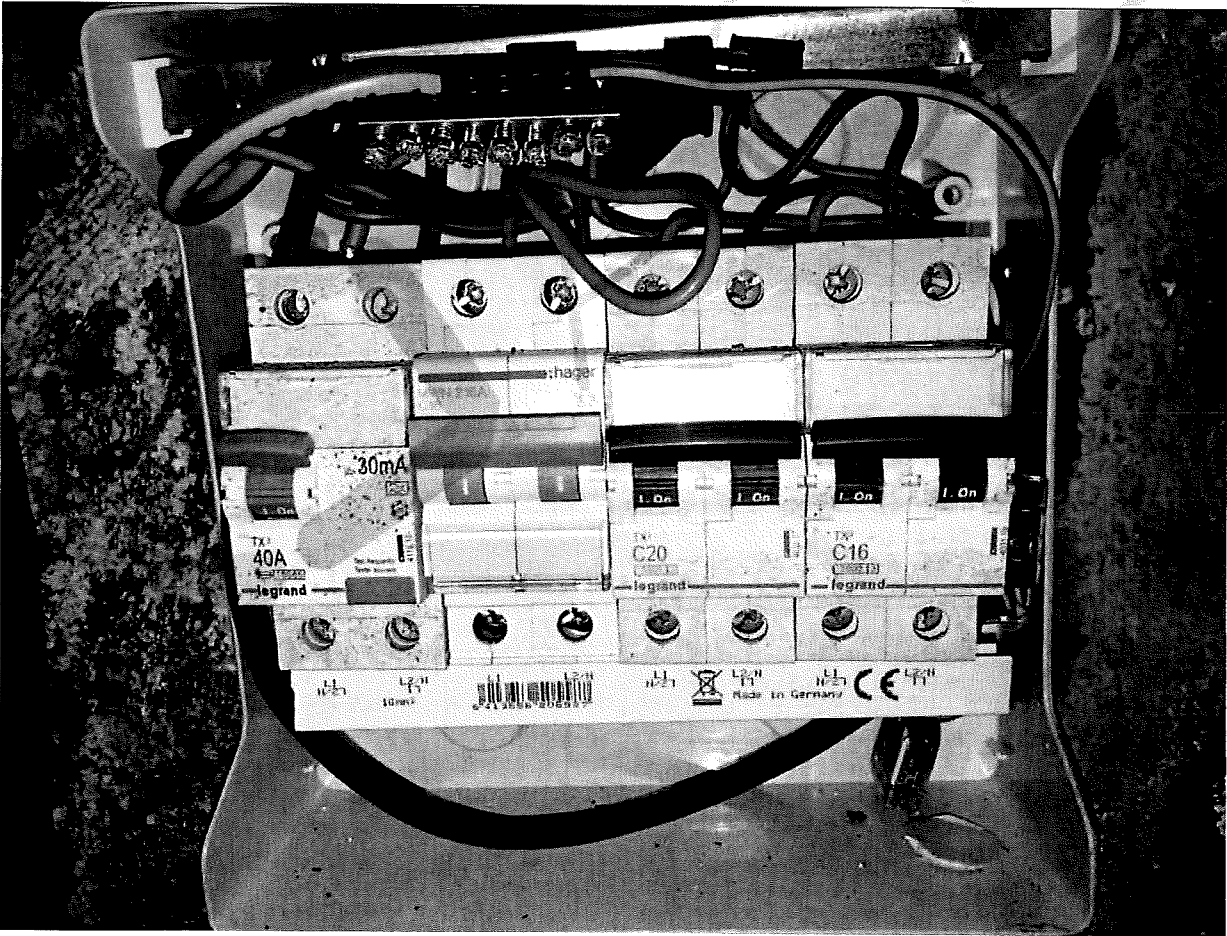


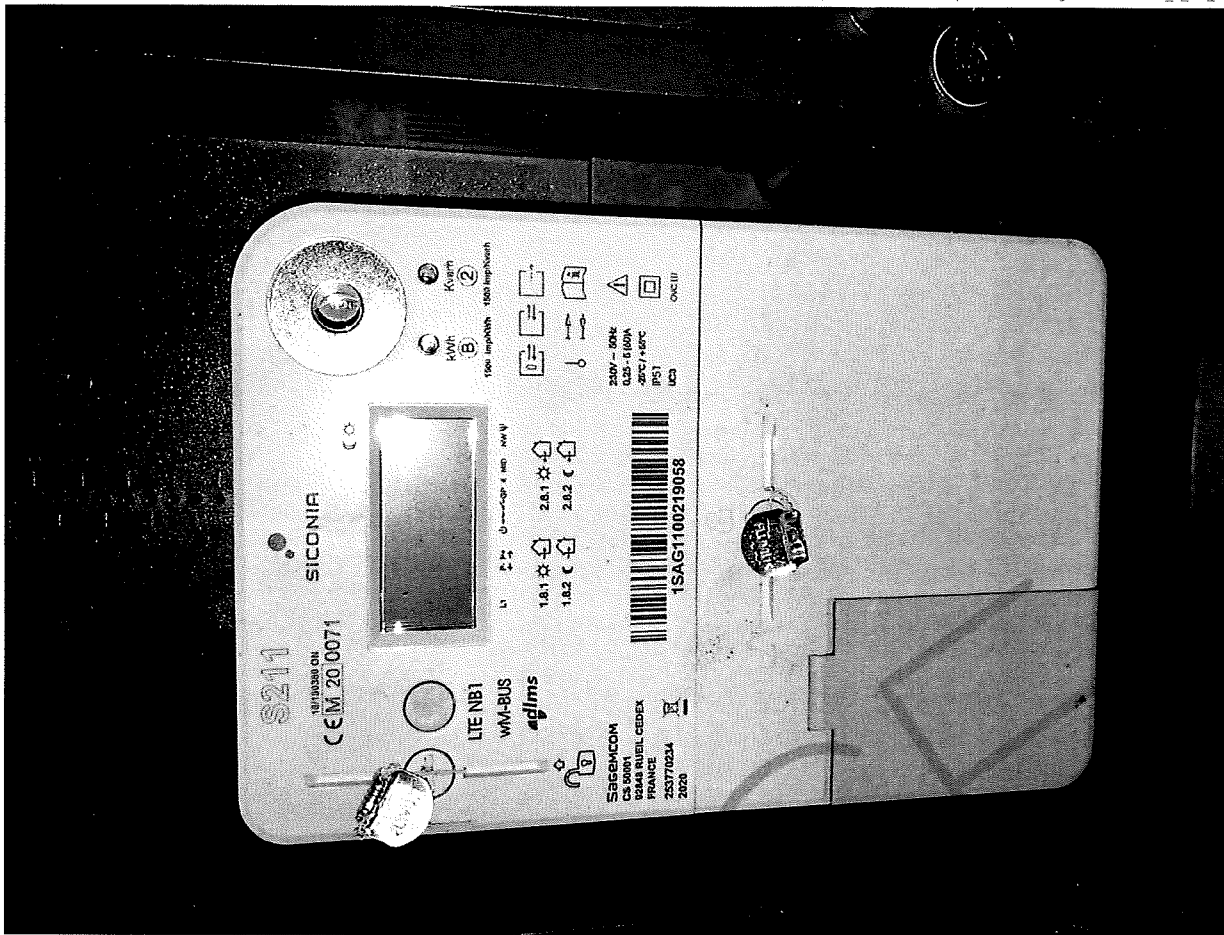

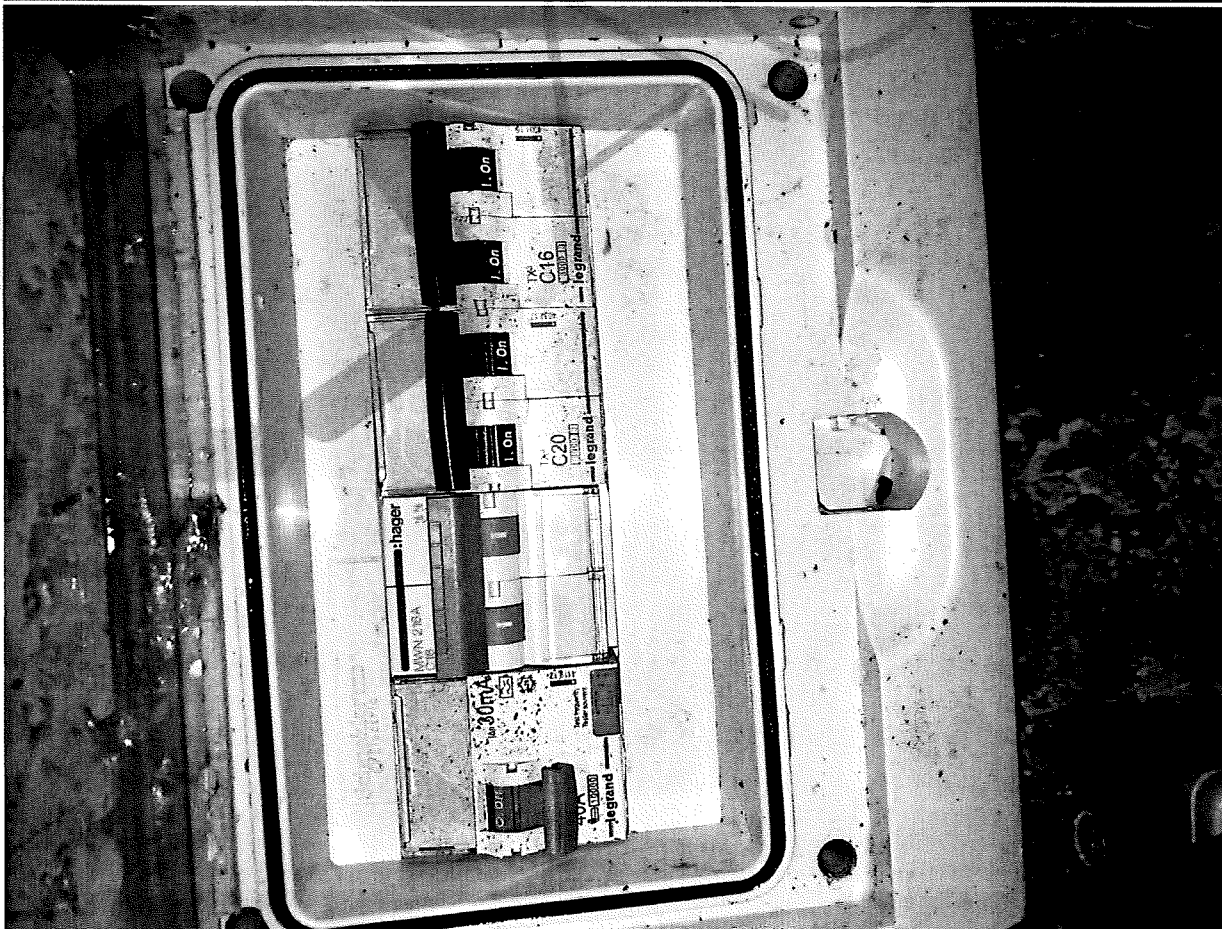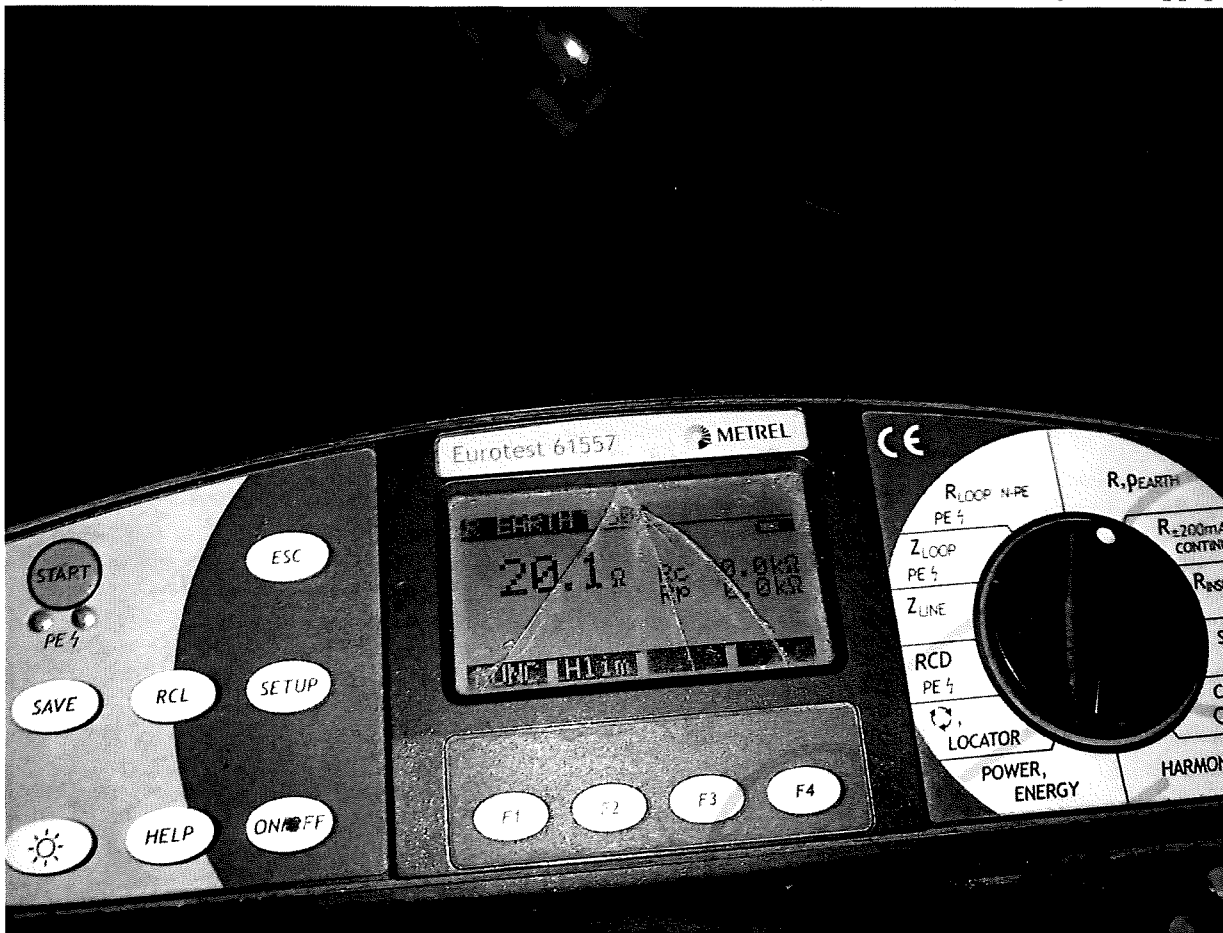

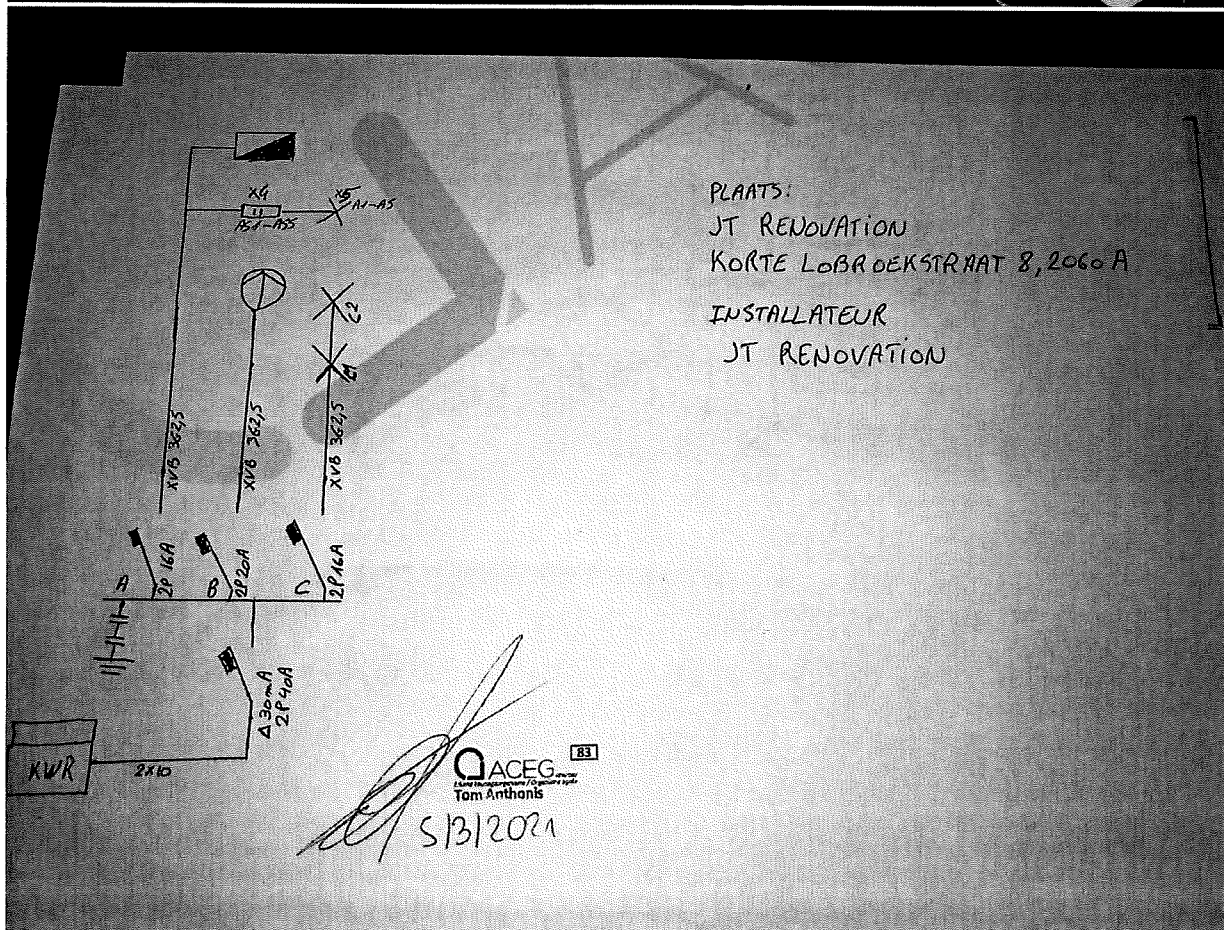

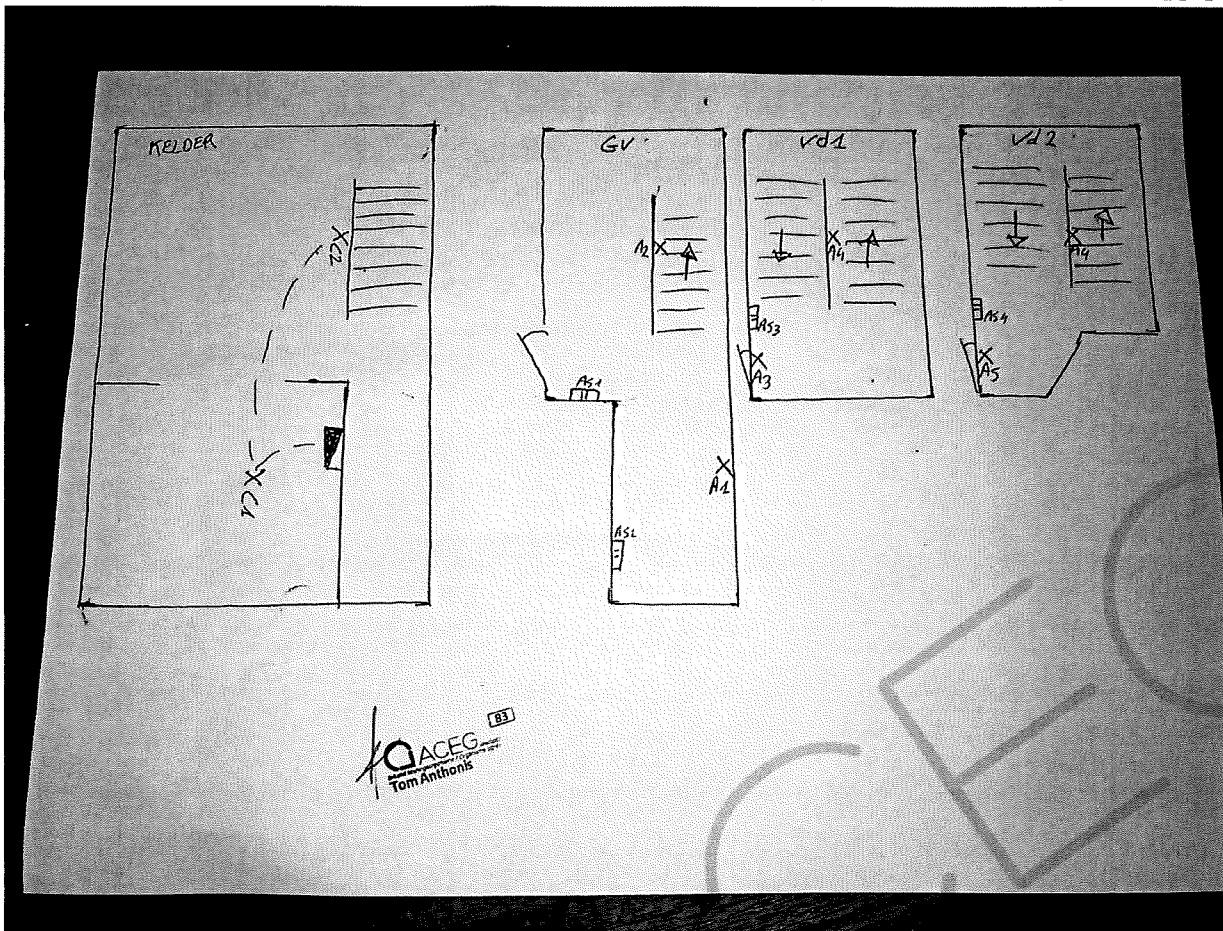

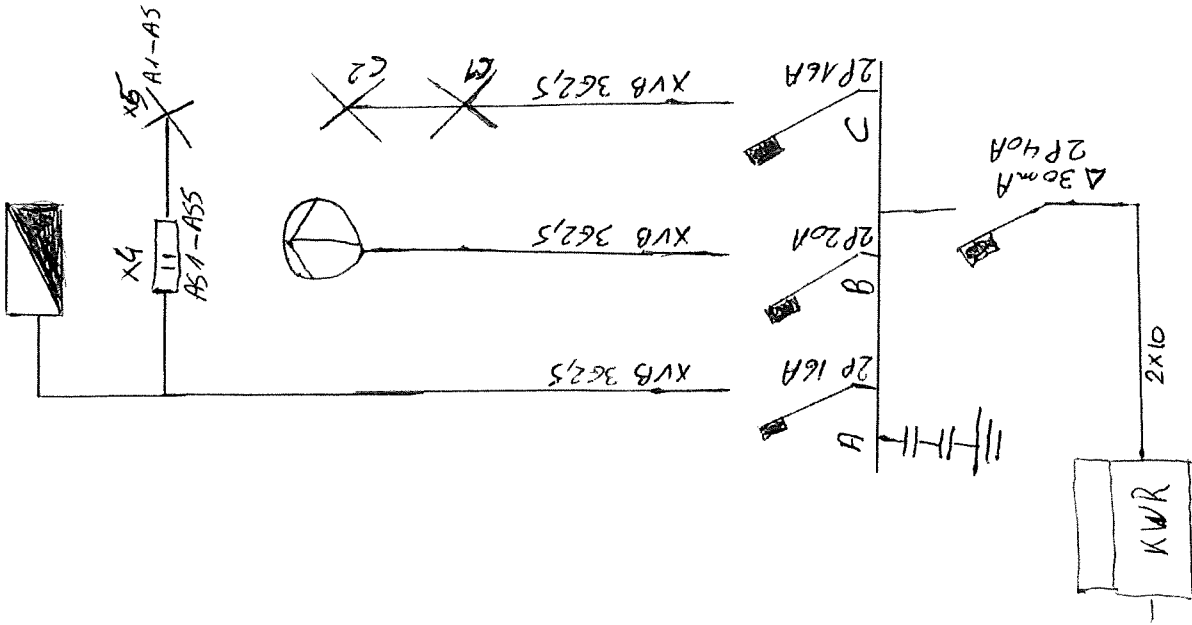

PLAATS:


JT RENOVATION

KORTE LOBBROEKSTRAAT 8, 2060 A

GEHEVE DELEN

INSTALLATEUR

JT RENOVATION

  
**ACEG** 83  
 Gereguleerd elektricien / Gereguleerd elektricien  
 Tom Anthonis  
 5/3/2021

