

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

Ad

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°:	Demandeur: <i>Suzi Elie</i>
------------------	-----------------------------

Responsable des travaux:		Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: <i>J. M. Elie</i>	Nom, Prénom: <i>Sowaco</i>	<i>général Jean Diermann SA</i> <i>Erindee 4367</i>	
<i>S. H. M. A. Val</i>	Adresse:		
N° carte d'identité:	CP + Commune:		
N° TVA: BE	Tél: <i>064/555155</i>		

Bases de l'examen:  Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)				☐ RGPT	☐	
 Art 270	☒ mise en usage	☐ modification	☐ extension	 Art 86	☐ Art 271bis	 Unité d'habitation
	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	 Unité de travail domestique
☐ Art 271	☐ périodique	☐ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	 Parties communes
☐ Art 276	☐ renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		☐ Art	☐ Art	 Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:																	
Données distributeur	EAN															☒ EAN non communiqué	☐ Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°: <u>3113213</u> Index jour: <u>1,6</u> nuit: <u>0</u> ☐ Compt. kWh exclusif nuit:																
	Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ n°: Index nuit:																
Données installation	Conçue pour U _N : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐														Type de prise de terre:		
	Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets																
	Câble d'alimentation tableau principal: <u>4</u> X <u>16</u> mm² - Type: ☐																
Description installation ☐ Voir annexe(s)	☒ Dispositif diff. gén.: <u>63 A / 30</u> mA Nombre de tableaux: <u>1</u> Nombre de circuits terminaux: <u>16</u>																
	<u>Pai / la ce jour, 16 circuits à section protection</u>																
	<u>de 16 mm².</u>																

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts Dir.
 ☒ Contacts Indir.
 ☒ Montage
 ☒ Appareils
 ☒ Matériel
 ☒ I>/section
 ☒ Schémas
 ☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: Ω
 ☒ Isolement général: $10 \text{ M}\Omega$
 ☒ Continuité de terre
 ☐ Test dispositif diff.
 Le dispositif différentiel général:
 ☐ était plombé
 ☒ a été plombé
 ☐ n'a pas été plombé
 ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation ☐ Néant	Meurt Meurt épuisé principale et nept Meurt	Visa GRD:
Infractions Installation existante ☐ Néant	Circuits kcl Pommeau photovoltaïque et pompe à chaleur gas fait objet de notre reception BT	Mandataire GRD: Nom:
Remarques ☐ Néant		Visa:

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

Agent visiteur:

Nom: Monneux Agent n°: 0532 Date: 21.4.09
Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: 2 ☒ Schéma(s) unifilaire(s): 2 8

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
 (**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: 16532 /

F 053314

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

A3

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur: J.M. Sloc

Responsable des travaux:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: J.M. Sloc	Nom, Prénom: SOWACO	
N° carte d'identité:	Adresse: Rue de la Digue 10	
N° TVA: BE	CP + Commune: 1300 Melle	
	Tél: 064 / 555155	

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐			
☒ Art 270	☒ mise en usage	☐ modification	☐ extension
☐ Art 271	☐ mobile	☐ temporaire	
☐ Art 276	☐ périodique	☐ contrôle	☐
☐ Art 276bis	☐ vente d'une unité d'habitation		
☐ Art 86	☐ Art 271bis	☐ Unité d'habitation	
☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique	
☐ Art 88	☐ Art	☐ Parties communes	
☐ Art	☐ Art	☐ Unité de travail	

Données générales de l'installation électrique:	
Données distributeur	Données installation
Compt. kWh n°: 91138113	Compt. kWh exclusif nuit: n°: Index nuit: 1
Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	Type de prise de terre: ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets
Conçue pour U _N : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Câble d'alimentation tableau principal: 4 X 16 mm² - Type: 1
Dispositif diff. gén.: 63 A / 30 mA	Nombre de tableaux: 1
Description installation: Voir annexe(s)	

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:	
☒ Contacts Dir.	☒ Contacts Indir.
☒ Montage	☒ Appareils
☒ Matériel	☒ I>/section
☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 3 Ω	☒ Isolement général: 1 MΩ
☒ Continuité de terre	☐ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé	

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)	
Infractions	Visa GRD:
Nouvelle installation	
☐ Néant	
Infractions	Mandataire GRD:
Installation existante	Nom:
☐ Néant	
Remarques	Visa:
☐ Néant	

Conclusion(s):

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.

☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 28/04/09 (*)

• par le même organisme de contrôle (**)

(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: M. Sloc Agent n°: 0532 Date: 28/04/09


Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: ☒ Schéma(s) unifilaire(s): ☐

Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



SPRL Sun Elec LW
Rue de Mons, 67
7120 Estinnes-Au-Yal
T: (+32) 064/55 51 55
F: (+32) 064/55 51 56
Sunelec.lw@skynet.be


Détail du tableau:

Client:


SOWACO
Appartement n 1
Crisnée.

A	Chambre 1 + Dressing	J	Chauffage
B	Chambre 2 + Chambre 3	K	Pompe à chaleur
C	WC + Hall + Buanderie	L	Panneau Photovoltaïque
D	Cuisine	M	Salle de bain
E	Four	N	Lave-vaisselle
F	Salon + Salle à manger	O	Boiler + Pompe à eau
G	Taque	P	Machine à laver
H	Chauffage	Q	Séchoir
I	Chauffage		


SOWACO. Schéma d'implantation Appartement n°1

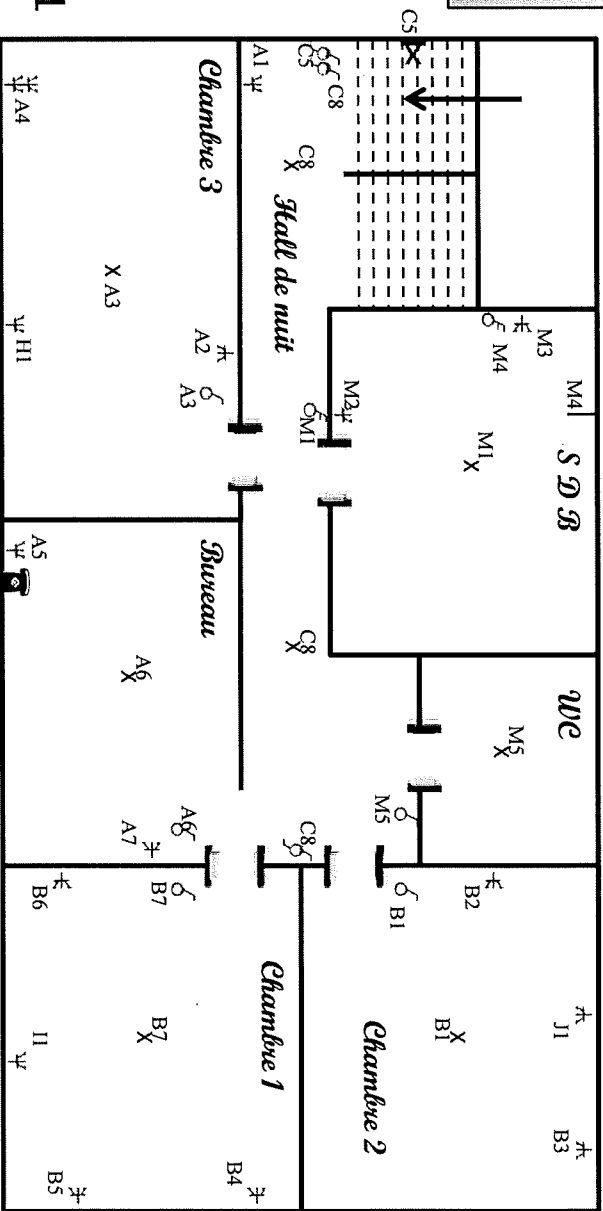

Niveau +1

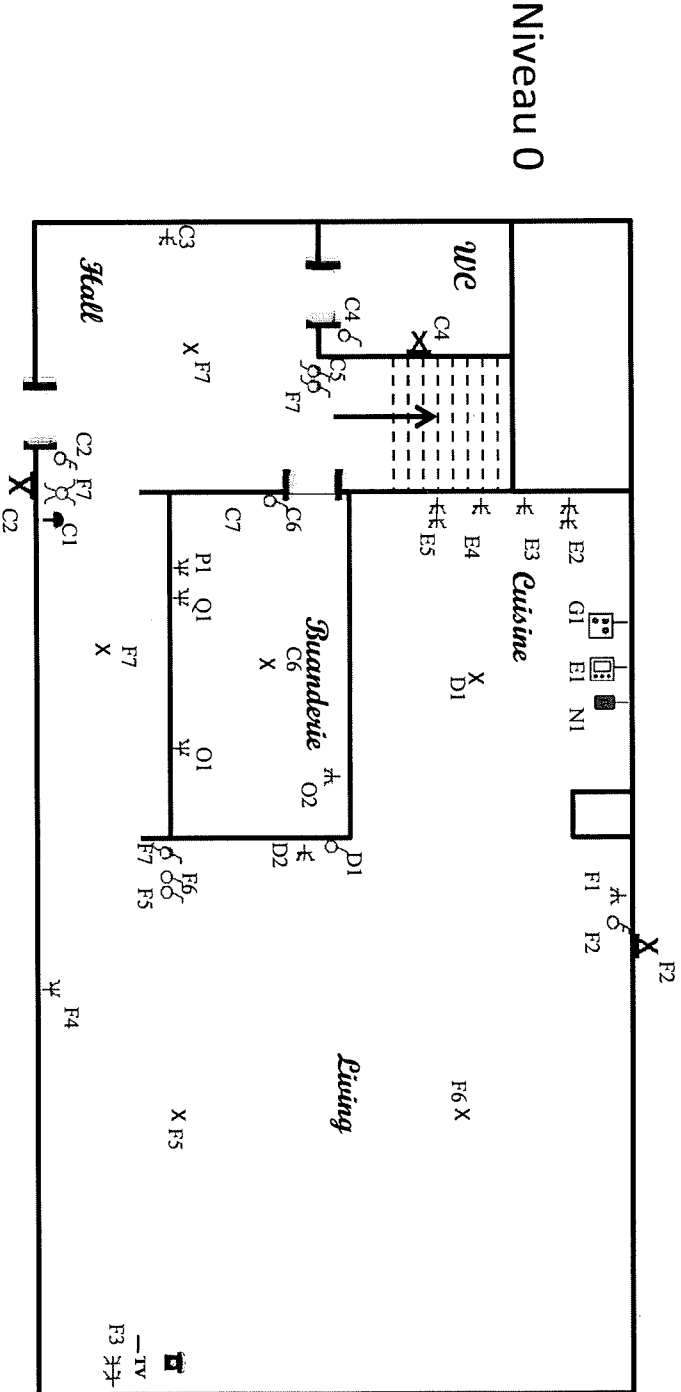

Niveau 0



Sun

ELEC

SPRL Sun Elec LW

Rue de Mons, 67


7120 Estinnes-Au-Vall


T: (+32) 064/55 51 55

F: (+32) 064/55 51 56

Sunelec.lw@skynet.be

Sowaco - Crisnée
Schéma unifilaire
Appart. N°1

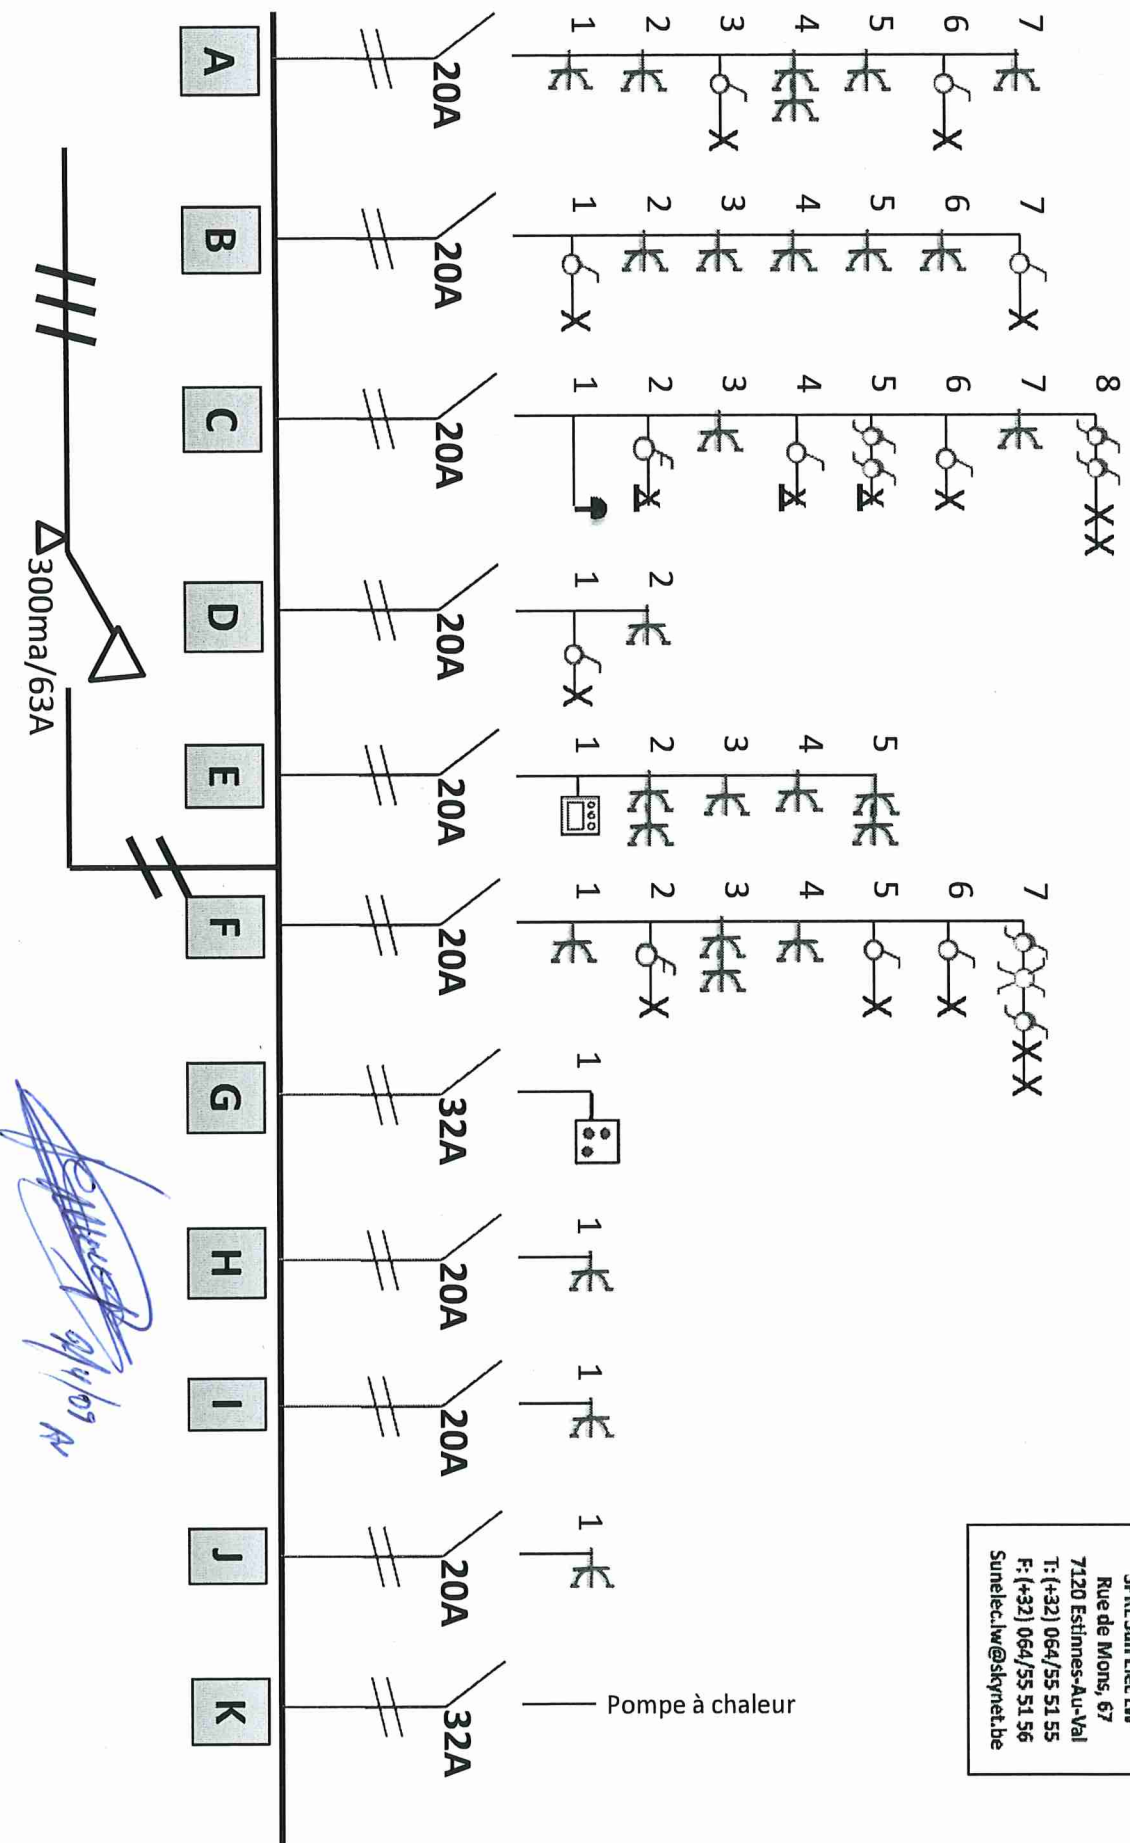




Sun
ELEC

SPRL Sun Elec LW
Rue de Mons, 67
7120 Estinnes-Au-Val
T: (+32) 064/55 51 55
F: (+32) 064/55 51 56
Sunelec.lw@skynet.be

Sowaco - Crisnée
Schéma unifilaire
Appart. N°1 (suite)

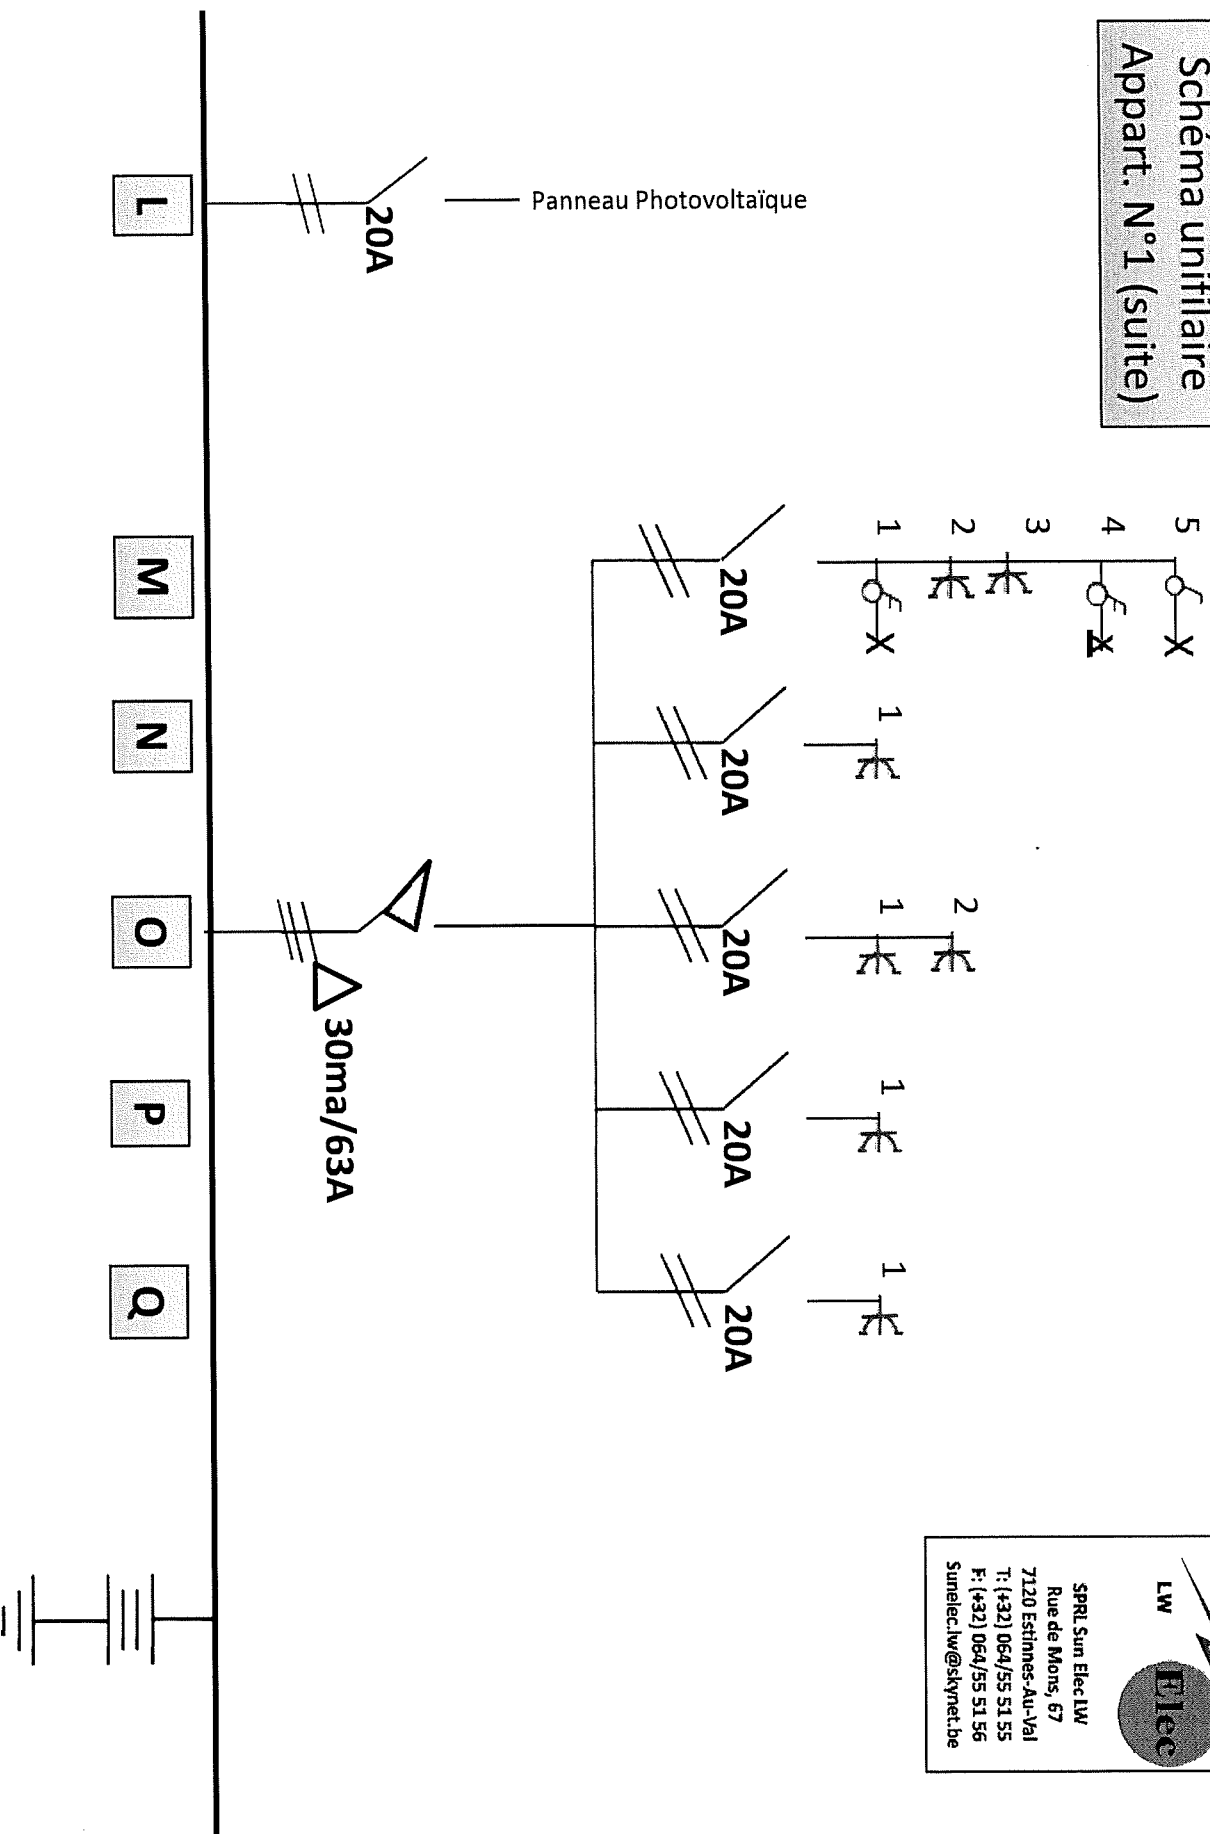

Sun
Elec
LW

SPRL Sun Elec LW
Rue de Mons, 67
7120 Esthimes-Au-Yal
T: (+32) 064/55 51 55
F: (+32) 064/55 51 56
Sun@elec.lw@skynet.be
