



ASBL SOCOTEL
Société de Contrôles Belges & Européens
Organisme de Contrôle Agréé par l'Etat
S.E.C.T. - Engins de levage - Ascenseurs
Installations Electriques

Siege Social & de correspondance: Rue des Badi 7
B-4317 LES WALLETTES
TVA: BE 875 896 340
ING: 340-0864401-72
Tel: 019/32 63 11
Fax: 019/56 71 38
E-Mail: secretariat@socotel.be

Affaire : E05/0201/20141119/03

Date de visite : 19/11/2014

RAPPORT ☒ D'EXAMEN DE CONFORMITE/ ☐ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET TRES BASSE TENSION

Lieu de visite	Responsable des travaux	Proprietaire/Gestionnaire
Nom, Prénom :	Nom, Prénom : MC ELEC	Nom, Prénom :
Rue : Clos Petit Waide 2	Carte ID :	Rue : Clos Petit Waide 2
B-4360 OREYE	Tva : BE0543915226	B-OREYE 4360

1. Conclusion :

- ☒ L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : 19-11-2039 délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- ☐ L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : --/-- Par le même organisme de contrôle.
- ☐ Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas ou, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max.1 an des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

2. Type de contrôle

Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02-☒ 01 ☐ 02

- | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| ☒ Art:270 | ☐ Temporaire | ☒ Mise en usage | ☐ Modification | ☐ Extension | ☒ Art:86 | ☒ Unité d'habitation |
| ☐ Art:271 | | ☐ Périodique | ☐ Contrôle | | ☐ Art:87 | ☐ Unité de travail domestique |
| ☐ Art:276 Renforcement | | | | | ☐ Art:271b | ☐ Partie commune |
| ☐ Art:276b Transfert de propriete | | | | | ☐ Art:278 | ☐ Autre |

3. Données générales de l'installation

Données distributeur => Nom du GRD : TECTEO

- ☒ EAN : Non Communiqué ☐ Compteur non placé

Protection de branchement : 63

- ☒ A/MAX. à placer.

Colonne d'alimentation type : EXVB Section : 4x16

Données installation :

Tension nominale : 230V - Courant nominal max : / A - Type de prise de terre ☐ boucle de terre ☐ piquets ☐ non-visible

Cable d'alimentation tableau principal => type : EXVB - section : 4x10 mm² - Nombre de tableau électrique : 1 - Nombre de circuits électrique : 18

Description installation : ---- 0 si revisite, voir plan suivant rapport : 0

- ☒ Disp.de Sect. Gén : 63 A / 300 mA -

4. Mesures - Tests - Contrôles visuels - Scelle :

- ☒ Contact dir. ☒ Contact Indir. ☒ Montage - ☒ Appareils - ☒ Matériels - ☒ I > section - ☒ Schémas - ☒ Contrôle boucle de défaut
- Résistance de dispersion de la prise de terre : 5,87 Ω / Isolement général : 1,2 M Ω ☒ Continuité de terre ☒ Test de dispositif diff.
- Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé - ☒ a été plombé - ☐ n'a pas été plombé - ☐ n'est pas plombable - ☐ absence de différentiel

5. Infractions :

Infractions: Néant

Remarques: Note: éclairage, sanitaire et cuisine non montés./

inspecteur (Nom et Signature)

Pour SoCoBel ASBL

Mr Didier Lavet

Le demandeur (Signature)

Visa du GRD

TECTEO - RESA

21 NOV. 2014

Division Connections

Ce rapport comporte 0 annexe(s)

RAP/SCB/E02-01

VERSION D-REV 01 - Date d'application 01/10/2013

En vertu de l'article 14 du titre II, chapitre IV, section III du code BET, le présent document devra être fourni au CPPT lors de la prochaine réunion. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de SoCoBel.
Krachtens art. 14 van titel II, hoofdstuk IV, sectie III van de Codex, moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité van Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
De reproductie van dit verslag wordt enkel in zijn geheel en met de schriftelijke goedkeuring van SoCoBel toegestaan





asbl SOCOTEL
Société de Contrôles Belges & Européens
Organisme de Contrôle Agréé par l'Etat
S.E.C.T. - Engins de levage - Ascenseurs
Installations Electriques

Siège Social & de correspondances: Rue des Bada 7
B-4317 LES WALLETTES
TVA: BE 875 896 346
INCG: 340-0864401-72
Tel : 019/32 63 11
Fax : 019/56 73 38
E-Mail: secretariat@socotel.be

Affaire : E05/0201/20141119/03

Date de visite : 19/11/2014

RAPPORT ☒ D'EXAMEN DE CONFORMITE/ ☐ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET TRES BASSE TENSION

Lieu de visite	Responsable des travaux	Proprietaire/Gestionnaire
Nom,Prénom :	Nom,Prénom : MC ELEC	Nom,Prénom :
Rue : Clos Petit Waide 2	Carte ID :	Rue : Clos Petit Waide 2
B-4360 OREYE	Tva : BE0543915226	B-OREYE 4360

1. Conclusion :

- ☒ L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : 19-11-2039 délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- ☐ L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : -/-/-
- ☐ Par le même organisme de contrôle.
- ☐ Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas ou, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max.1 an des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

2. Type de contrôles Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02-☒ 01 ☐ 02

☒ Art:270	☐ Temporaire	☒ Mise en usage	☐ Modification	☐ Extension	☒ Art:86	☒ Unité d'habitation
☐ Art:271		☐ Périodique	☐ Contrôle		☐ Art:87	☐ Unité de travail domestique
☐ Art:276 Renforcement					☐ Art:271b	☐ Partie commune
☐ Art:276b Transfert de propriété					☐ Art:278	☐ Autre

3. Données générales de l'installation

Données distributeur => Nom du GRD : TECTEQ

☒ EAN : Non Communiqué ☐ Compteur non placé

Protection de branchement : 63 ☒ A/MAX. à placer. Colonne d'alimentation type : EXVB Section : 4x16

Données installation :

Tension nominale : 230V - Courant nominal max : / A - Type de prise de terre ☒ boucle de terre ☐ piquets ☐ non-visible

Cable d'alimentation tableau principal => type : EXVB - section : 4x10 mm² - Nombre de tableau électrique : 1 - Nombre de circuits électrique : 18

Description installation : — 0 si revisite, voir plan suivant rapport : 0

☒ Disp.de Sect. Gén : 63 A / 300 mA -

4. Mesures - Tests - Contrôles visuels - Scelle :

☒ Contact dir. ☒ Contact Indir. ☒ Montage - ☐ Appareils - ☐ Matériels - ☐ I > section - ☐ Schémas - ☐ Contrôle boucle de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre : 5,87 Ω / Isolement général : 1,2 M Ω ☐ Continuité de terre ☐ Test de dispositif diff.

Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé - ☒ a été plombé - ☐ n'a pas été plombé - ☐ n'est pas plombable - ☐ absence de différentiel

5. Infractions :

Infractions: Néant

Remarques: Note: éclairage, sanitaire et cuisine non montés./

inspecteur (Nom et Signature)

Le demandeur (Signature)

Visa du GRD

Pour SoCoBel ASBL
Mr Didier Lavet




Ce rapport comporte 0 annexe(s)

RAP/SCB/E02-01

VERSION D-REV 01 - Date d'application 01/10/2013


En vertu de l'article 14 du titre II, chapitre IV, section III du code BET, le présent document devra être fourni au CPPT lors de la prochaine réunion. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de SoCoBel.
Krachtens art. 14 van titel II, hoofdstuk IV, sectie III van de Codex, moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité van Veiligheid, Gezondheid en Verfraging der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
De reproductie van dit verslag wordt enkel in zijn geheel en met de schriftelijke goedkeuring van SoCoBel toegestaan



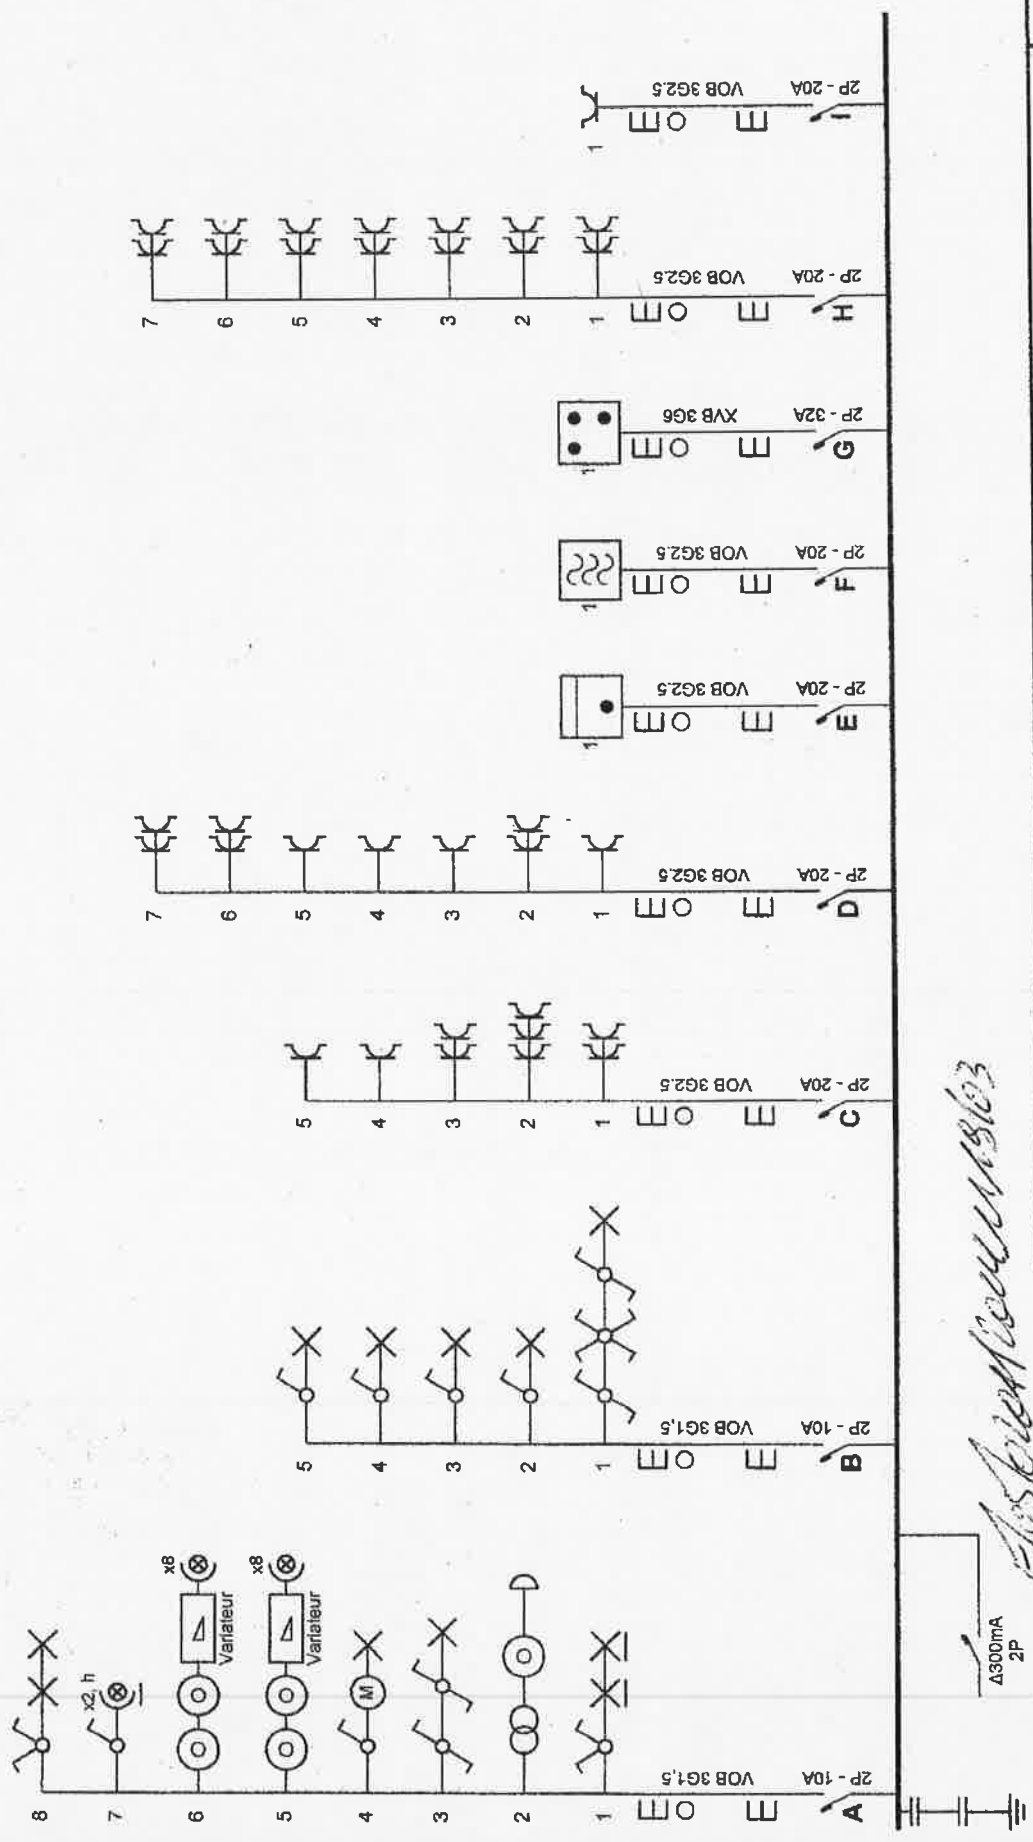

p. A-6 Schéma unifilaire 1 x 400V + N ~ 50Hz	
Adresse de l'installation électrique LAVET DIDIER SOCOBEL ASBL 0475/572963	Installateur Mcelec d'Heure Le Tixhe 5 4452 Whogne Tél.: - GSM: +32479985353 Fax: - e-mail: mceleinfo@gmail.com BE 0543.915.226
Schema dessiné par: <i>Cloesen M</i>	

4300mA 2P

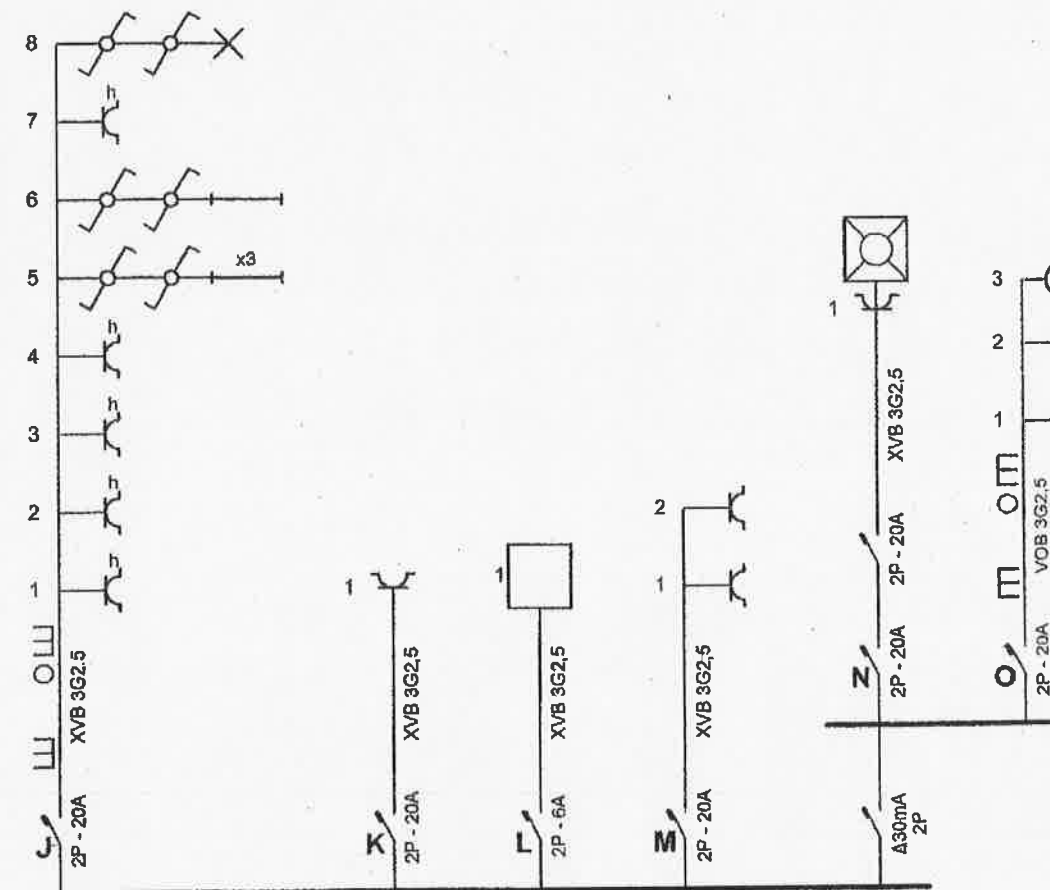

Aspirant

LAVET DIDIER
SOCOBEL ASRI
0475/572963


13/11/2014

Adresse de l'installation électrique

Schéma dessiné par: *Cloesen M*

Schéma dessiné par: Cloesen M

dessiné par: Cloesen M

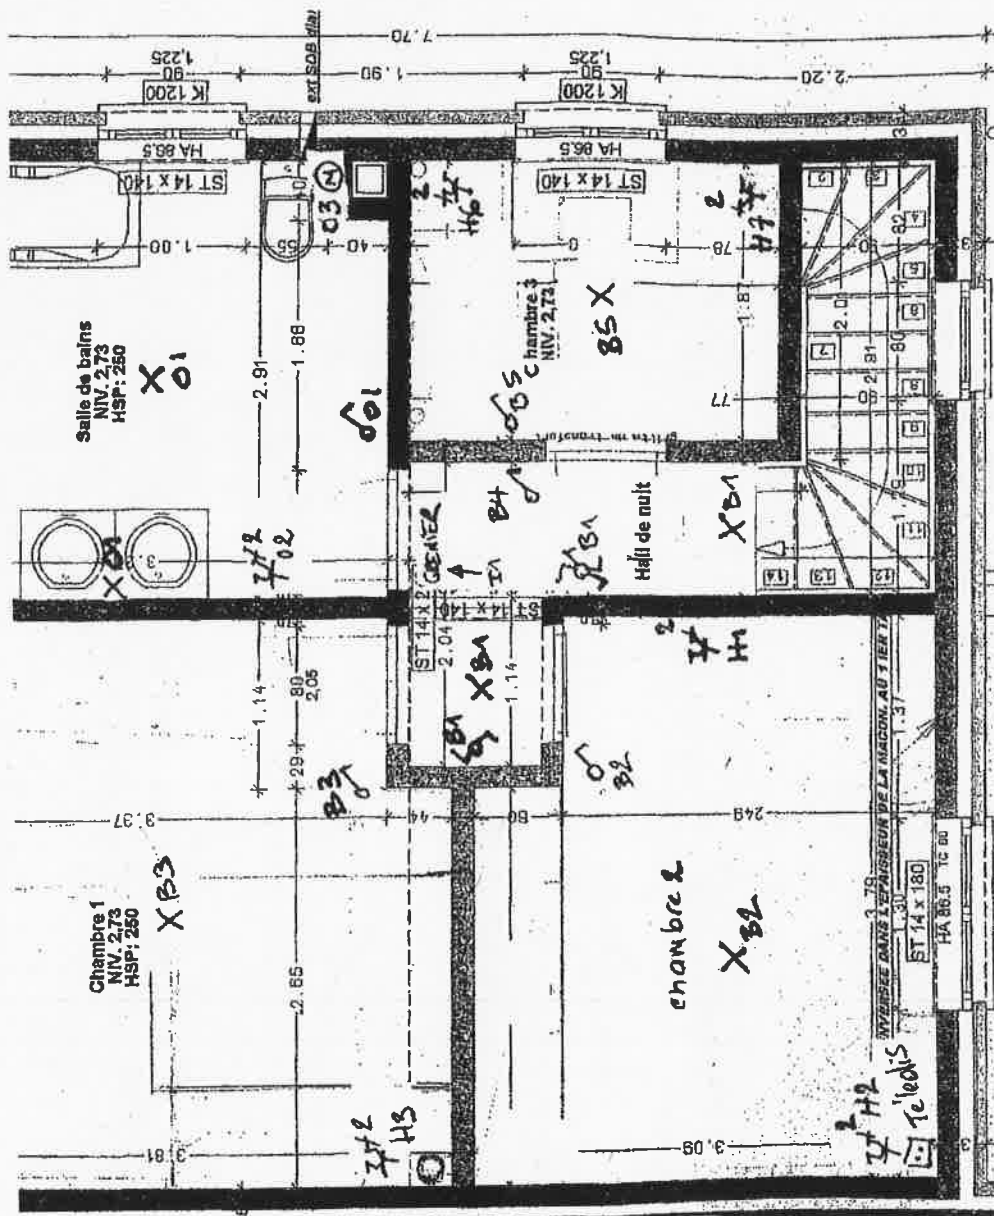

électrique

Installateur

Mcelec

d'Heure Le Tixhe 5

4452 Wihogne

Tél.: - GSM: +32479985353

Fax: -

e-mail: mceleinfo@gmail.com

BE 0543.915.226

p. 5
List

1 x

200507

A: Ecl. rdc + séjour + Hall + cuisine + WC + ^{escalier} Extérieur +

B: Ecl. étage CH1, CH2, CH3 + bureau + hall + grenier

C: Pc séjour

D: Pc cuisine + hotte + écl. meubles

E: Pc Four traditionnel.

F: Pc Four moderne

G: Pc Tague cuisson

H: Pc étage CH1 + CH2 + CH3 + Bureau

I: Pc Grenier

J: Pc + écl. caves + buanderie + escalier

K: Pc Chaudière mazout

L: Alim Alim

M: Pc Extérieur cour +abri Jardin

N: Pc Lave - vaisselle

O: Pc + Ecl Salle de bain

P: Pc LESSIVEUSE

Esplanade pour n°103

500851 4071
14751071863

18/04/2004

Q: Pc SECURITE

R: Pc Pompe hydrophore

GENERAL A B C D E F G H

Δ 03A 63A II	10A II	10A II	20A II	20A II	20A II	20A II	32A II	20A II
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

I J K L M

20A II	20A II	20A II	6A II	20A II	RESERVE			
-----------	-----------	-----------	----------	-----------	---------	--	--	--

N O P Q R

Δ 03A 63A II	20A II	20A II	20A II	20A II	20A II	RESERVE.		
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--	--

Adresse de l'installation électrique

Installateur

Mcslec
d'Haere Le Tixhe 5
4452 Whogne
Tél.: - GSM: +32479985353
Fax: -
e-mail: mcsleinfo@gmail.com
BE 0643.815.226

P. 6-6
Liste des circuits

1 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: CLOESEN M
