



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: 2001994119/111

F 009089

Safety, quality and environmental services

Rési. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 ☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11 ☐ Wallonie : Tél.: 081 432 611

6

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur: *Eut Biaky sprl*

Responsable des travaux: Installation: Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: *Biaky sprl* Nom, Prénom: *Biaky sprl* *garage / Medipen*
N° carte d'identité: *1180* Adresse: *116 av. Geluder* *1180*
N° TVA: BE *417.118.661* CP + Commune: *1180* Tél.: *1180*

Bases de l'examen: ☐ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐

☒ Art 270 ☐ mise en usage ☒ modification ☒ extension ☐ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Unité d'habitation
☐ mobile ☐ temporaire ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Unité de travail domestique
☐ Art 271 ☐ périodique ☐ contrôle ☐ Art 88 ☐ Art ☐ Parties communes
☒ Art 276 ☒ renforcement ☐ transfert de propriété ☐ Art ☐ Art ☐ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur: EAN ☐ EAN non communiqué ☒ Compt.kWh non placé
Compt. kWh n° *43817856* Index jour: *022957.6* nuit: ☐ Compt. kWh exclusif nuit:
Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 125 n°: *1180* Index nuit: *1180*
Données installation: Conçue pour U_n: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type de prise de terre: ☐ boucle de terre ☒ barres / piquets
Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 125
Câble d'alimentation tableau principal: *2* X *10* mm² - Type: *XY 15/6*
Description installation: ☐ Dispositif diff. gén.: *40* A / *30* mA Nombre de tableaux: *2* Nombre de circuits terminaux: *11*
☐ Voir annexe(s)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☒ Montage ☐ Appareils ☒ Matériel ☒ l>/section ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut
☐ Résistance de dispersion de la prise de terre: *1.16* Ω ☐ Isolement général: *150* MΩ ☒ Continuité de terre ☒ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	<i>OSM</i>	Visa GRD:
Nouvelle installation	<i>2509-08</i>	
☒ Néant	<i>D 4281</i>	
Infractions		
Installation existante		
☐ Néant		
Remarques	<i>vale planier g. d'auys, d. s. assure teres / ect</i>	Visa:
☐ Néant	<i>des roltures par la puit a g. à laver.</i>	

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le *10/09/2003*
● par le même organisme de contrôle (**)

(**) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: *VANDERKIECK* Agent n°: *019* Date: *10/09/00*
Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position: *1* ☒ Schéma(s) unifilaire(s): *1*

Pour le Directeur Général: Signature

Le procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.


Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Le délégué de l'organisme agréé,
De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme,

Réceptionné 10 SEP. 2008

vuicotte

-  prise électrique
-  interrupteur
-  plafonnier
-  applique
-  spot

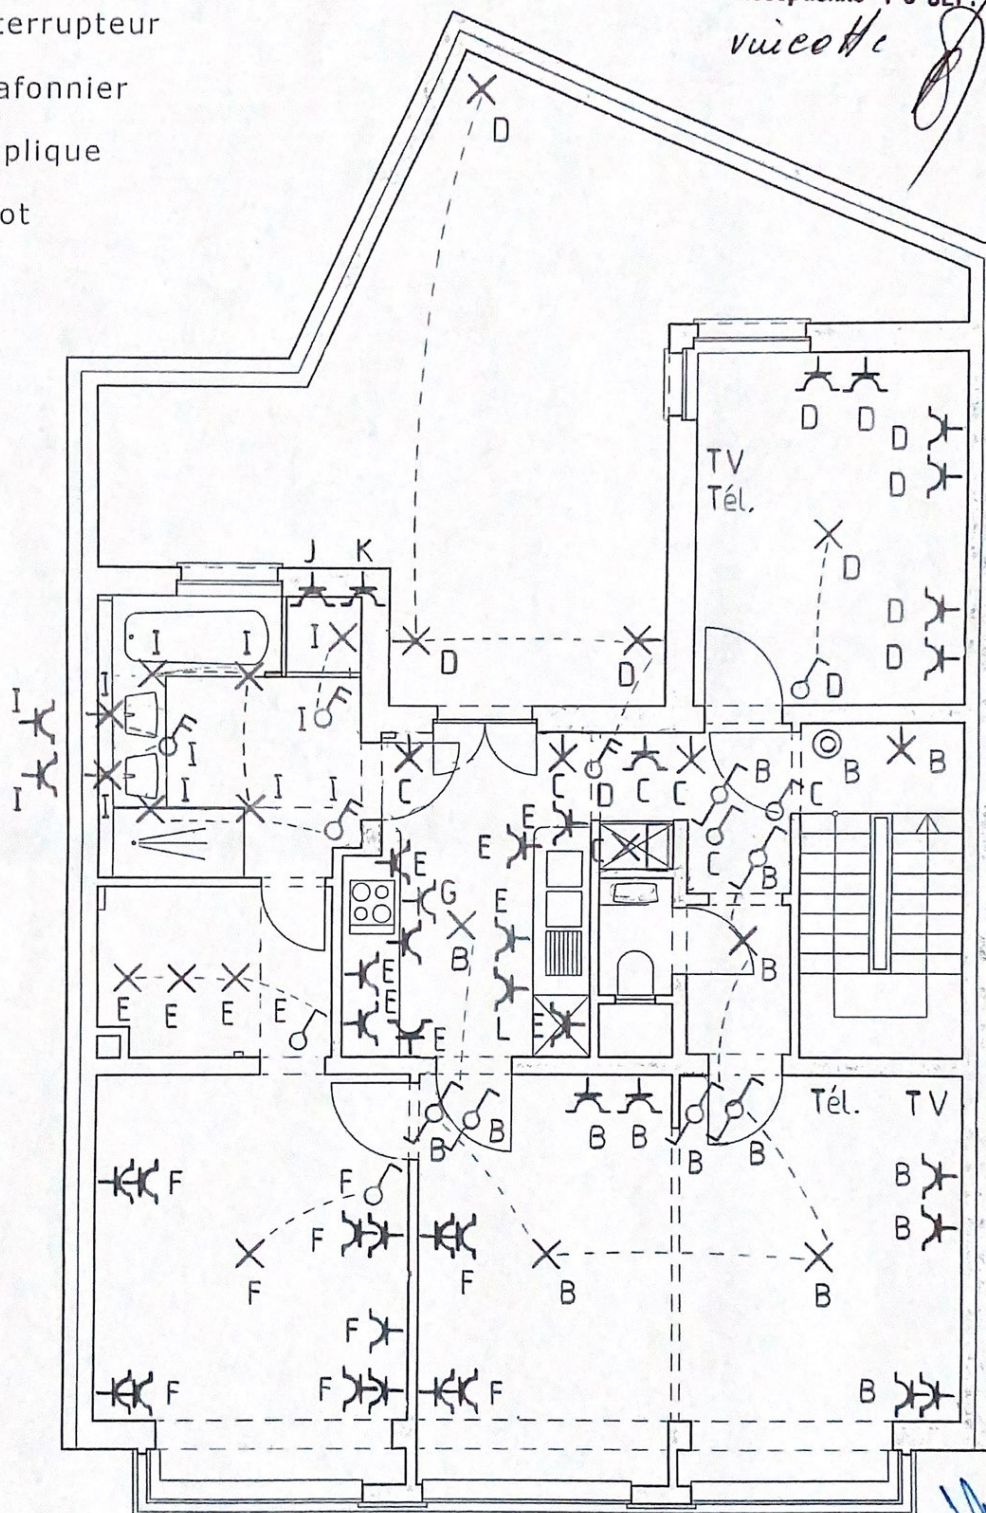

Le responsable de l'exécution du travail,
De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk,
G.B.E. BRAHY SPRL. Rue Edith Cavell, 105-107 à 1180 BXL.
TVA BE 411.118.662. 030091. RCB 297.404. N°Ag. A.21.016/022/0005.


Plan électrique étage 2%

Av de Messidor 176 UCCIF

Avenue de MESSIDOR 176
1180 BRUXELLES

SCHEMA UNIFILAIRE APPARTEMENT DU 1er ETAGE

TOUS LES CIRCUITS SONT EXISTANTS

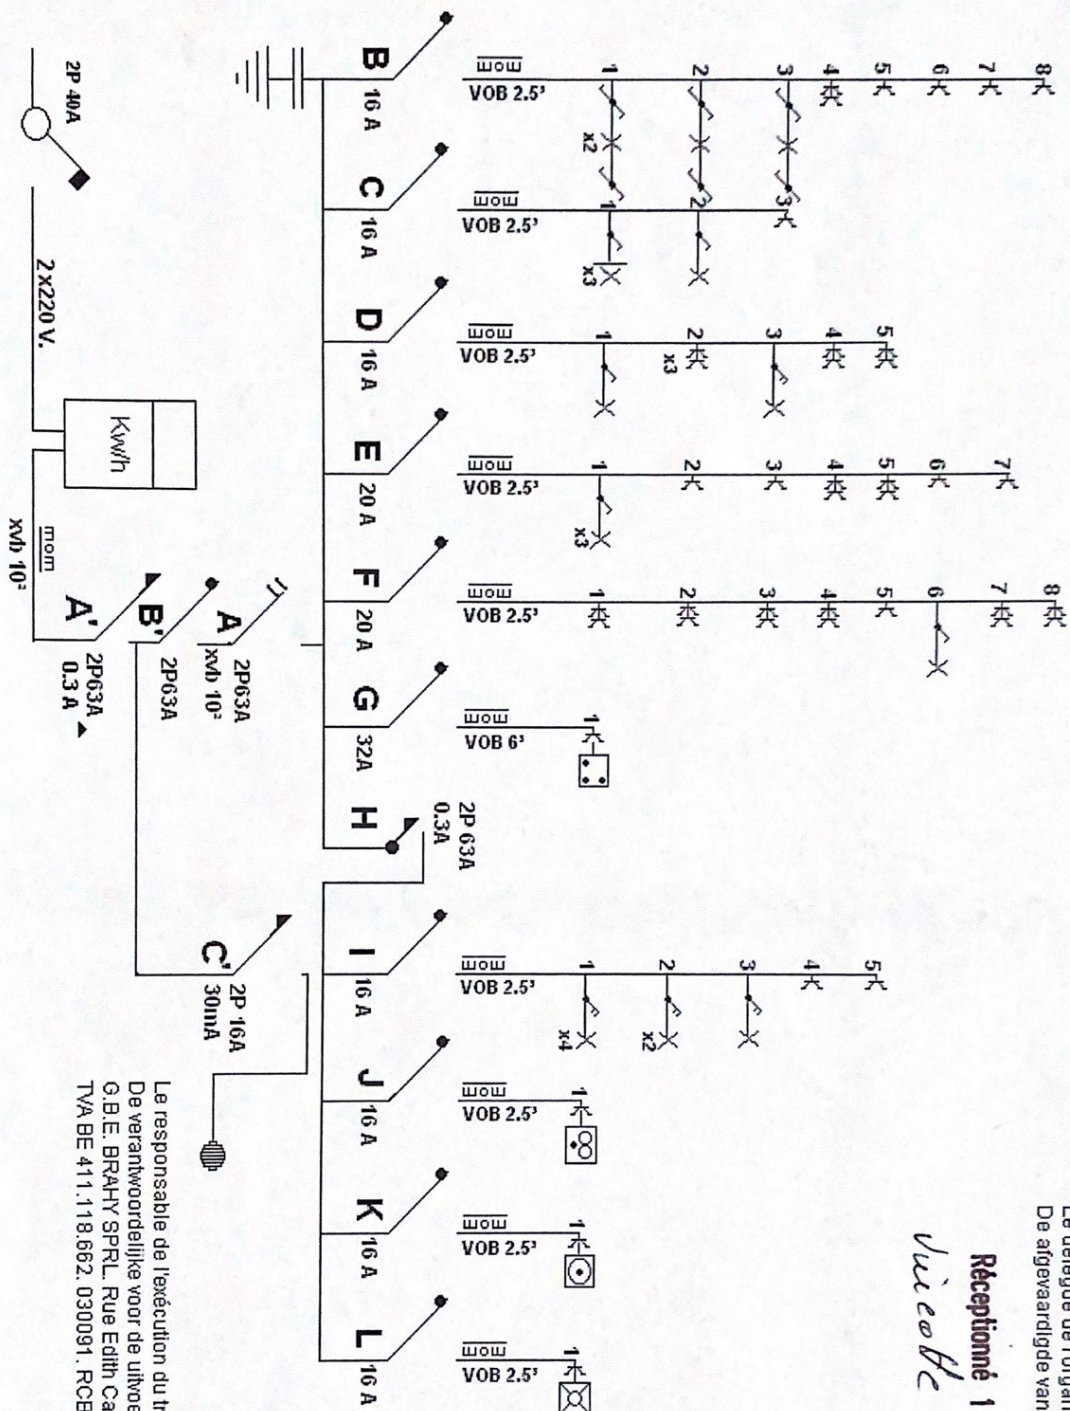

Le délégué de l'organisme agréé,
De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme,

Réceptionné 10 SEP. 2008
Luijckx A.S. 0395

Le responsable de l'exécution du travail,
De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk,
G.B.E. BRAHMY SPRL, Rue Edith Cavell, 107-107 à 1180 BXL.
TVA BE 411.118.662.030091, RCB 297.404, N° Ag A.21.016/022/0005.

Avenue de Messidor, 176
1^{er} étage.
1180 Bruxelles.

Descriptif du tableau électrique :

Circuits :

- A. Interrupteur général 63A 2P.
- B. Circuit éclairage living.
Circuit éclairage petit hall et cuisine.
- C. Circuit éclairage hall, toilette.
Circuit prises hall.
- D. Circuit prises et éclairage chambre arrière.
- E. Circuit prises plan de travail cuisine.
Circuit prise hotte.
Circuit prise frigo.
Circuit éclairage dressing.
- F. Circuit prises chambre avant + éclairage chambre.
- G. Circuit prise taque électrique.
- H. Interrupteur différentiel 30 mA 63A 2P.
- I. Circuit prises et éclairage salle de bain.
- J. Circuit prise séchoir.
- K. Circuit prise lave-linge.
- L. Circuit prise lave-vaisselle.

Avenue de Messidor, 176
1^{er} étage.
1180 Bruxelles.

Descriptif du tableau électrique cave du 1^{er} étage :

Circuits :

- A'. Interrupteur différentiel 300mA 63A 2P.
- B'. Protection colonne 63A 2P.
- C'. Disjoncteur différentiel 16A circuit boiler.
