

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/65192/01:1

DATE DU CONTRÔLE 14/06/2019
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue Grande 33 - 5575 Vencimont

AGENT VISITEUR Olivier Maurcot
TYPE DE CONTRÔLE Visite périodique (Art. 271)



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation	Rue Grande 33 - 5575 Vencimont
Type de locaux	Unité d'habitation (maison)
Propriétaire	Schmit de suray
Responsable des travaux	Schmit
#TVA	BE 0422.033.736
Revisite Certinergie	Revisite Certinergie
Références du PV précédent	05/2019/63042/01

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	ORES ASSETS
Code EAN	non communiqué
Numéro du compteur	61475604
Index jour/nuit	39332,7/48879,6
Type de raccordement	aérien
Câble compteur - tableau	VOB 3X6 mm2
Tension nominale de service	3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement	25A

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	14
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)					
Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test OK		
Prise de terre	Piquets	Dispositif différentiel "sdb"	ID - 40A - 30mA - type A - test OK		
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	8,4	Raccordement	OK		
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK		
Test de continuité	Concluant	Eclairage/machines	OK		
Contrôle boucle de défaut	Concluant	Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK	Résistance minimale d'isolement mesurée (M Ω)	210		

CONCLUSION : CONFORME



A la date du 14/06/2019, l'installation électrique de Rue Grande 33 - 5575 Vencimont est conforme au Règlement Général des Installations Electriques.
Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.
Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le 14/06/2044.

Signature de l'agent

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/65192/01:1

> DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1er octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme ?

1

Lisez
attentivement ce
procès-verbal

2

Lors d'extensions,
de modifications
importantes de
l'installation, faites
la reconstruire

3

Au terme de la
validité du rapport,
faites reconstruire
votre installation

4

Certinergie est à
votre service
0800 82 171


PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 05/2019/65192/01:1

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

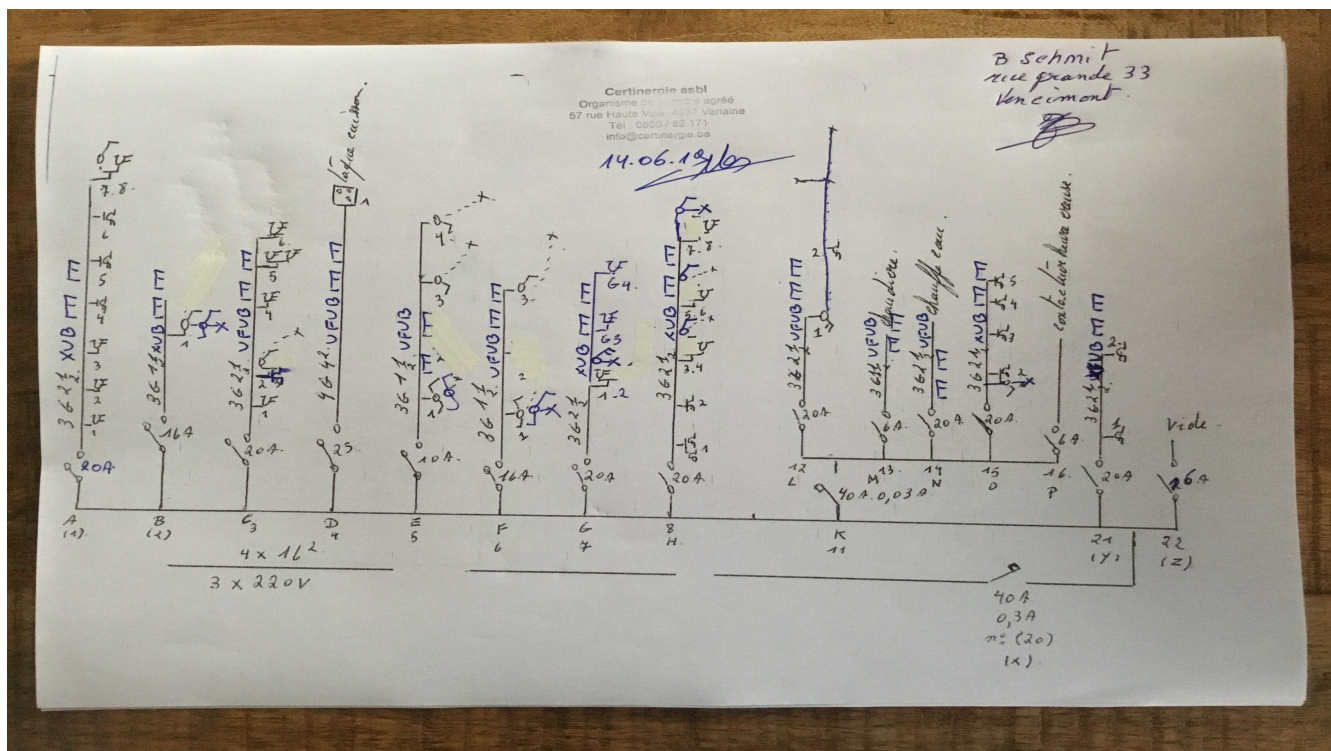

Plan(s) de position de l'installation

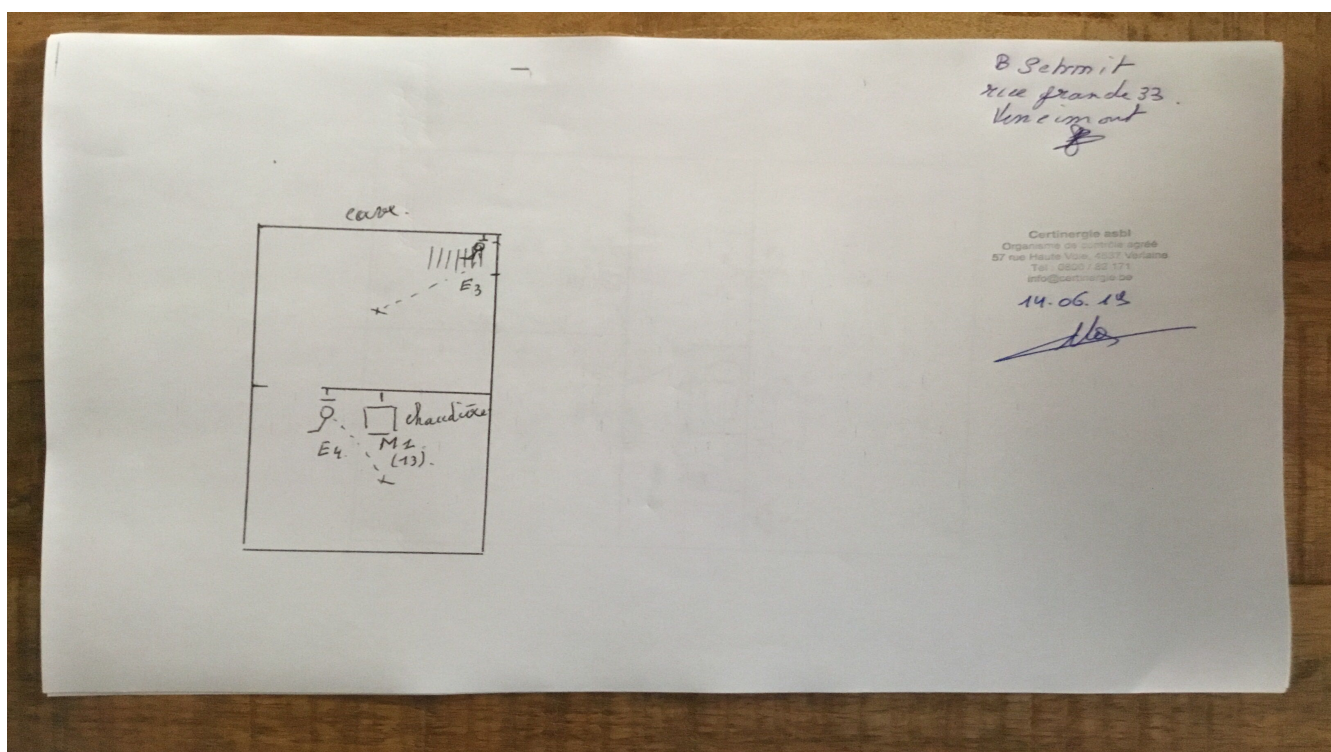



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/65192/01:1

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

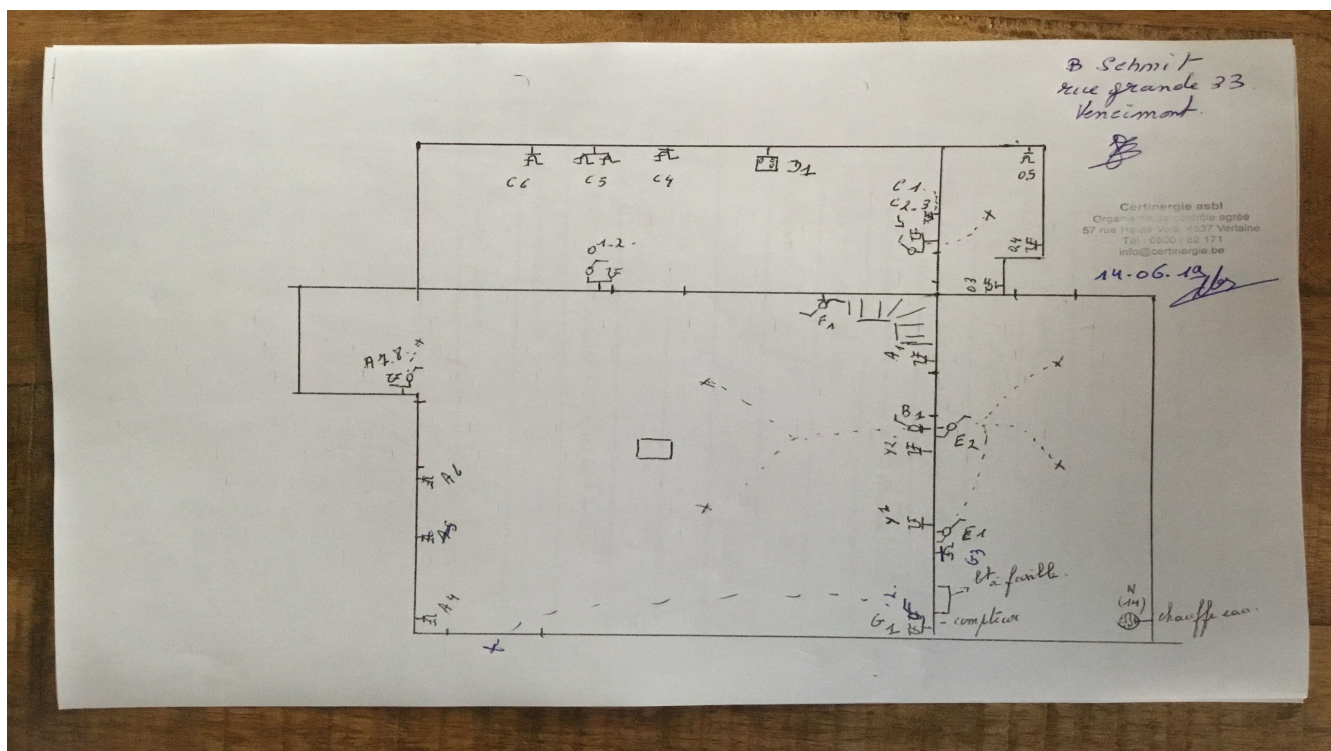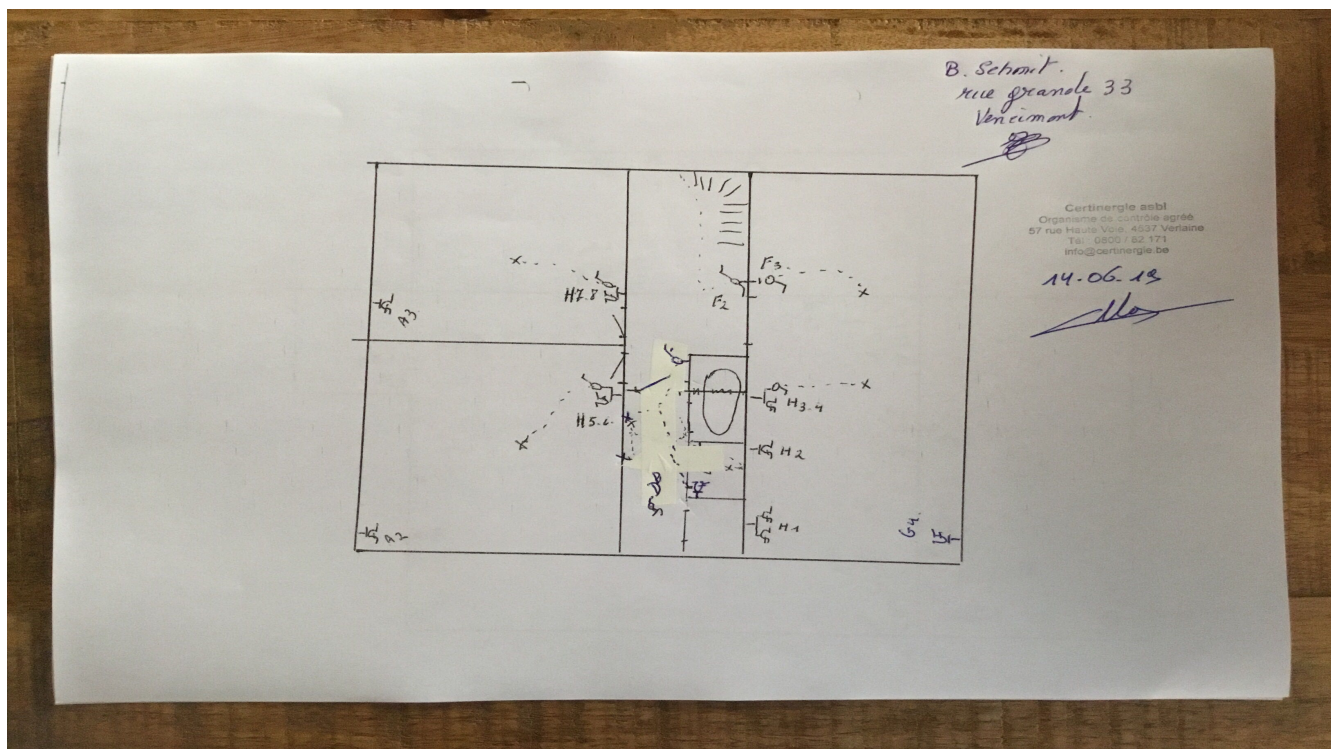

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/65192/01:1

› ANNEXES

Autre(s)

1	A	prise mur cdt. hall couloir + PL vanneur
2	B	PL séjour
3	C	prise pièce entrée + PL salle cuisine
4	D	prise tripart. pièce entr.
5	E	PL garage et cave.
6	F	PL hall de nuit et grande chambre.
7	G	prise prise séjour mur mur du garage PL ext. prise garage "grande chambre"
8	H	prise PL grande chambre + prise PL chambre petits
9	I	contacteur chauffage eau.
10	K	diplo. vid. 100 0,034
11	L	SD 8
12	M	chaudière
13	N	chauffe eau
14	O	PL + prise pièce entrée + 3 prises salle cuisine ext.
15	P	prise contacteur
16	X	diplo. vid. général.
17	Y	2 simple prise séjour aux murs garage.

B. Schmit.
rue grande 33
Hercynand
14.06.18

Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie - 4537 Verlainne
Tél: (02) 88 02 171
info@certinergie.be
