

Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 89/2022/84907/02:1

DATUM VAN CONTROLE 14/11/2022 AGENT Jens Steenhoudt
ADRES VAN CONTROLE Lange Slachterijstraat 18 (verdieping 1L) - 2060 Antwerpen TYPE CONTROLE Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)



> ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie Lange Slachterijstraat 18 (verdieping 1L) - 2060 Antwerpen
Type van lokalen Wooneenheid (appartement)
Eigenaar
Verantwoordelijke voor de werken niet gecommuniceerd

> GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB) IMEA
EAN code Niet gecommuniceerd
Nummer teller Niet gecommuniceerd
Meterstand dag/nacht /
Teller niet geplaatst: de maximaal toegestane grootte van de aansluitbeveiliging voor de hier gekeurde installatie is 40A
Type van de algemene schakelaar Automaat
Voedingskabel hoofdbord XVB 4 x 10 mm²
Nominale spanning 230V - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) 40A

> CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieplan	OK	Aantal verdeelborden	1	Aantal stroombanen	13
Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan					
De funderingen dateren van	Vóór 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting	40A - 300mA - type A - test OK		
Aardverbindingssysteem	Staven	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	40A - 30mA - type A - test OK		
Aardingsweerstand (Ω)	15,1	Bevestiging / Staat / Verslechtering materiaal	OK		
Gelijkvormigheid v/d equipotentiaal en de PE	OK	Visuele controle vaste of mobiele materiaal	OK		
Aardingscontinuïteit	Besluitende	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK		
Foutlus controle	Test onmogelijk - geen spanning	Algemene isolatieweerstand (MΩ)	595		
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Overeenstemming tussen hoofddifferentieel - aarding	OK		
		Overeenstemming beschermingsinrichtingen - doorsneden	OK		

BESLUIT : CONFORM

Op de datum 14/11/2022, elektrische installatie Lange Slachterijstraat 18 (verdieping 1L) - 2060 Antwerpen is conform aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 14/11/2047.

De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Handtekening agent

Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 89/2022/84907/02:1

Herinnering aan de wettelijke voorschriften :

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 89/2022/84907/02:1

BIJLAGEN

Eendraadschema(s) van de installatie

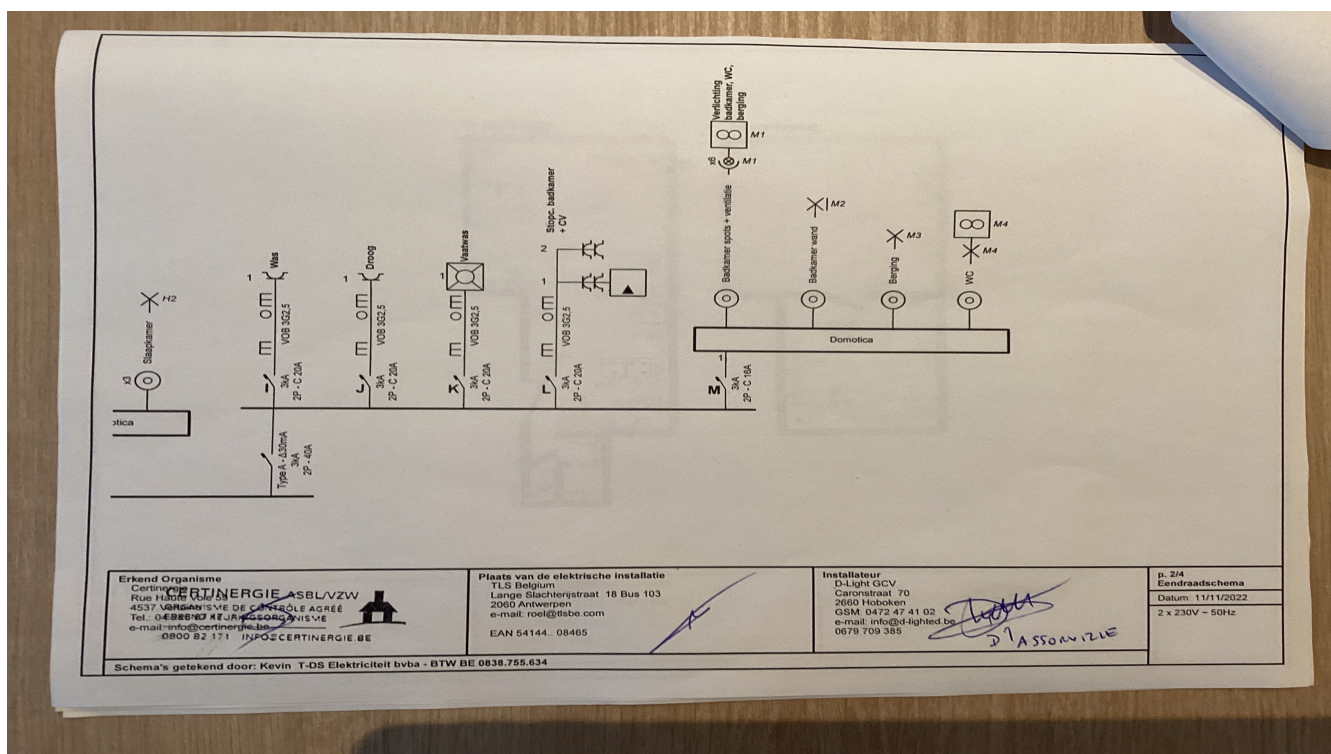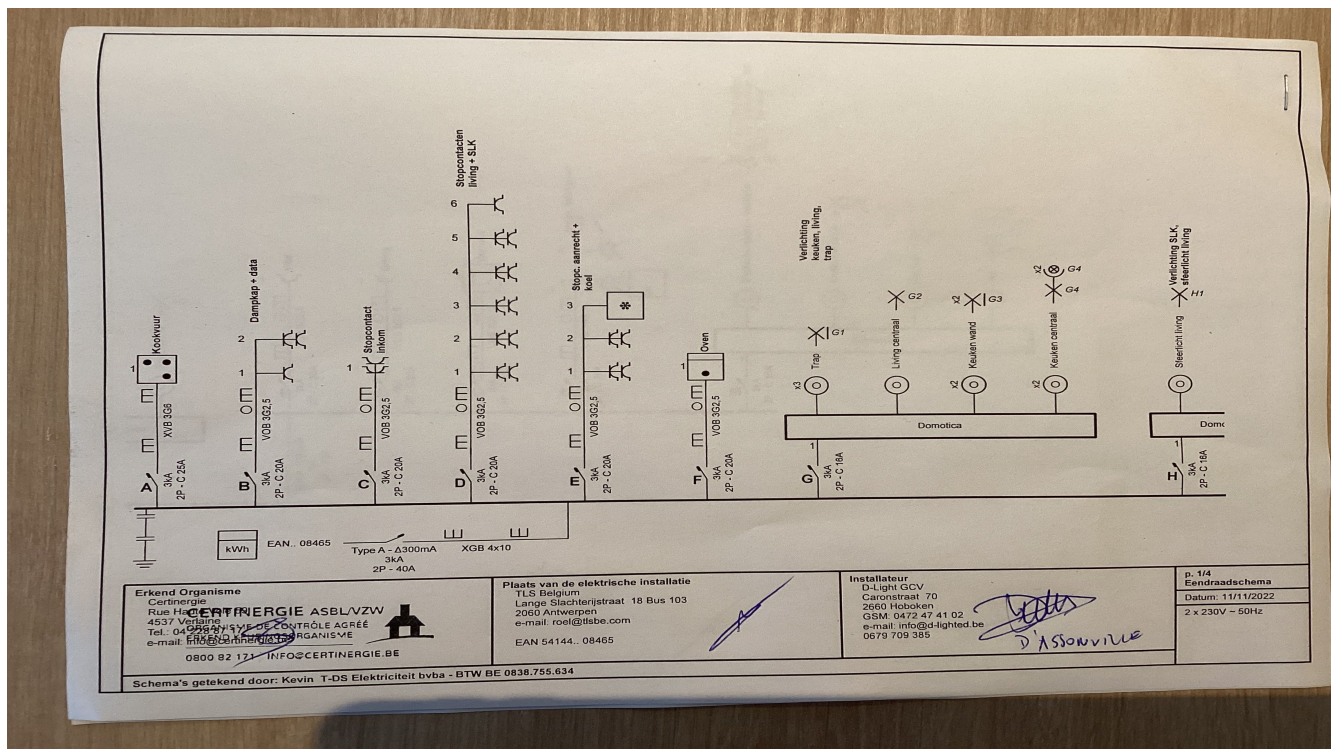

Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 89/2022/84907/02:1

› BIJLAGEN

Situatieplannen van de installatie

