

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 02/05/2024

Inspecteur: Aboubakr El Achouch

Mentor: -

Installateur: Group Limas

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0808 732 847

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481271

Datum verslag: 02/05/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Beekvelden
Huisnummer 1
Busnummer
Postcode 2840
Gemeente Rumst
Land België

Eigenaar

Naam In opdracht van Group Limas
Straatnaam Beekvelden
Huisnummer 1
Busnummer
Postcode 2840
Gemeente Rumst
Land België

Installateur

Naam Group Limas
BTW nr. BE 0808 732 847
Telefoonnummer +32 472 59 35 21
E-mail cedric.labeye@grouplimas.eu

Type : woning

EAN : 541448820048057538

Teller Nr. : 48808476

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 4

Aantal kringen: 24

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 3.14 MΩ

RE: 1.08 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	24	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	25		2	4
9	C	20		2	2,5
10	C	16		2	2,5
2	C	16		2	1,5
1	C	40	Rem	2	10
1	C	25	Pv	2	4

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2/5/2049
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Aboubakr El Achouch

Aboubakr El Achouch
ACEG VZW - #396


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 2/5/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



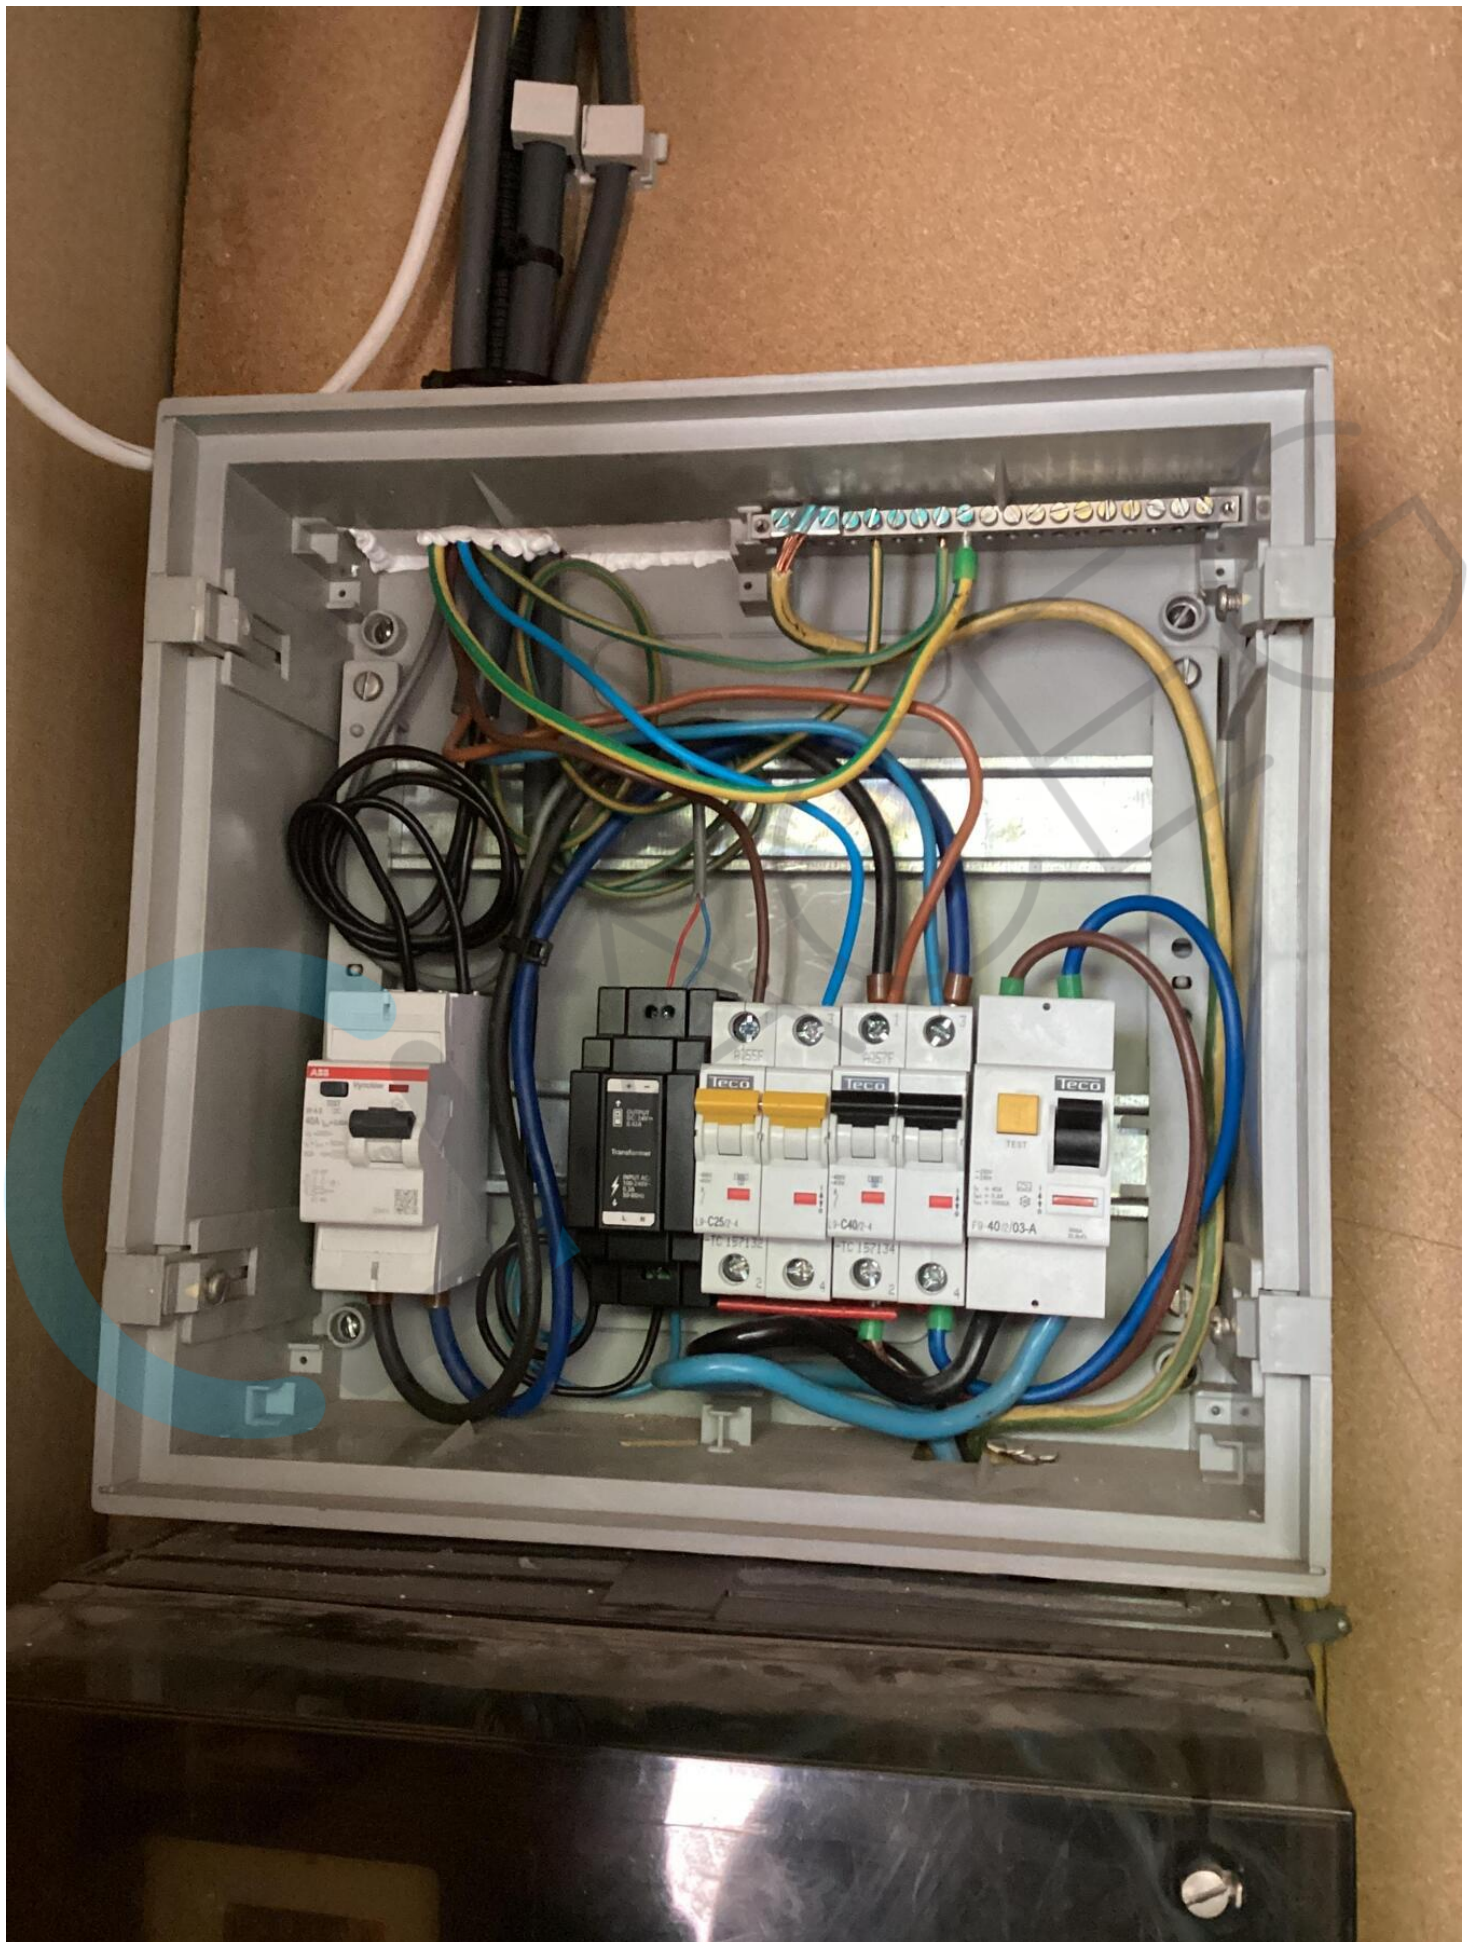



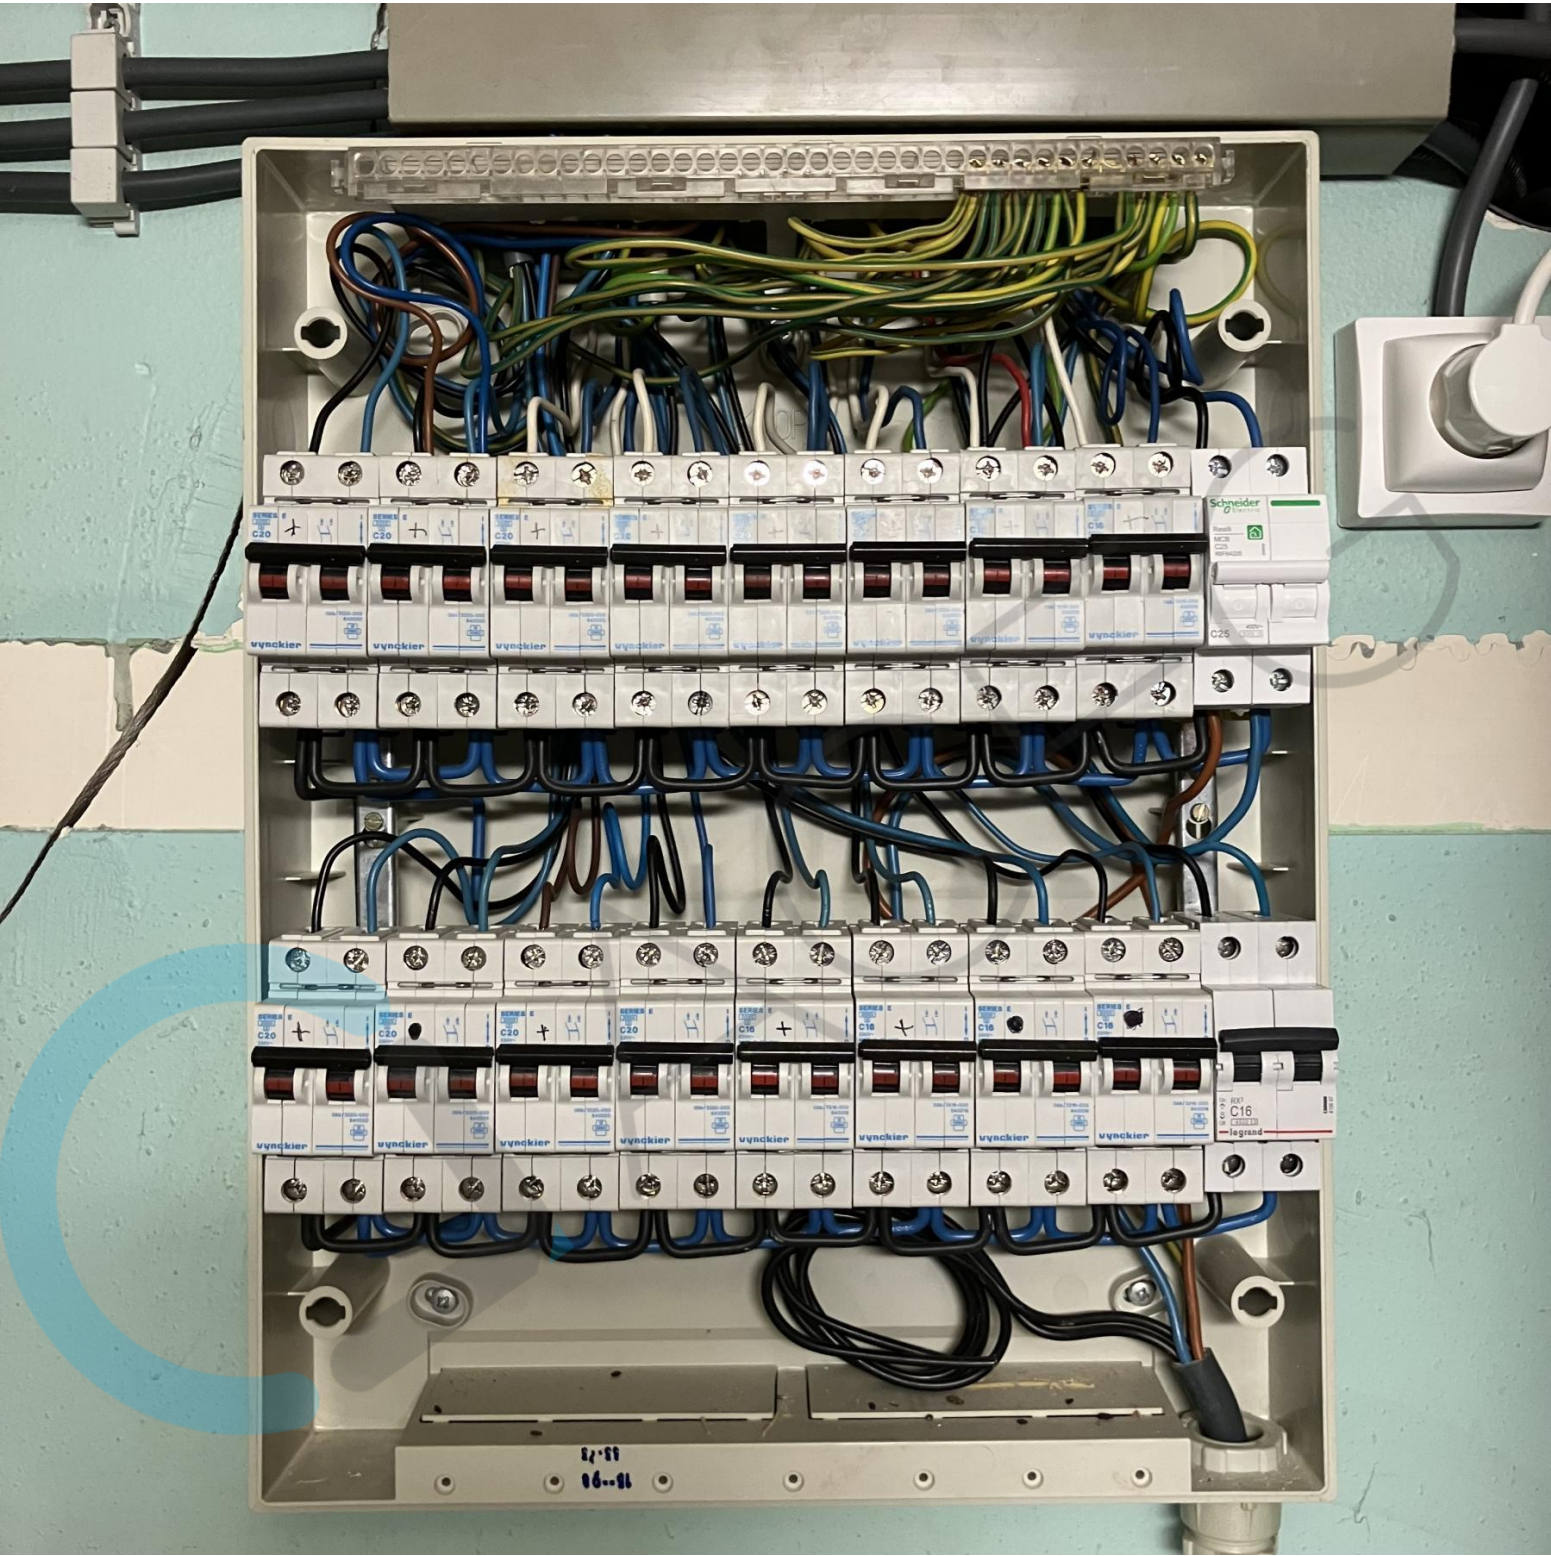


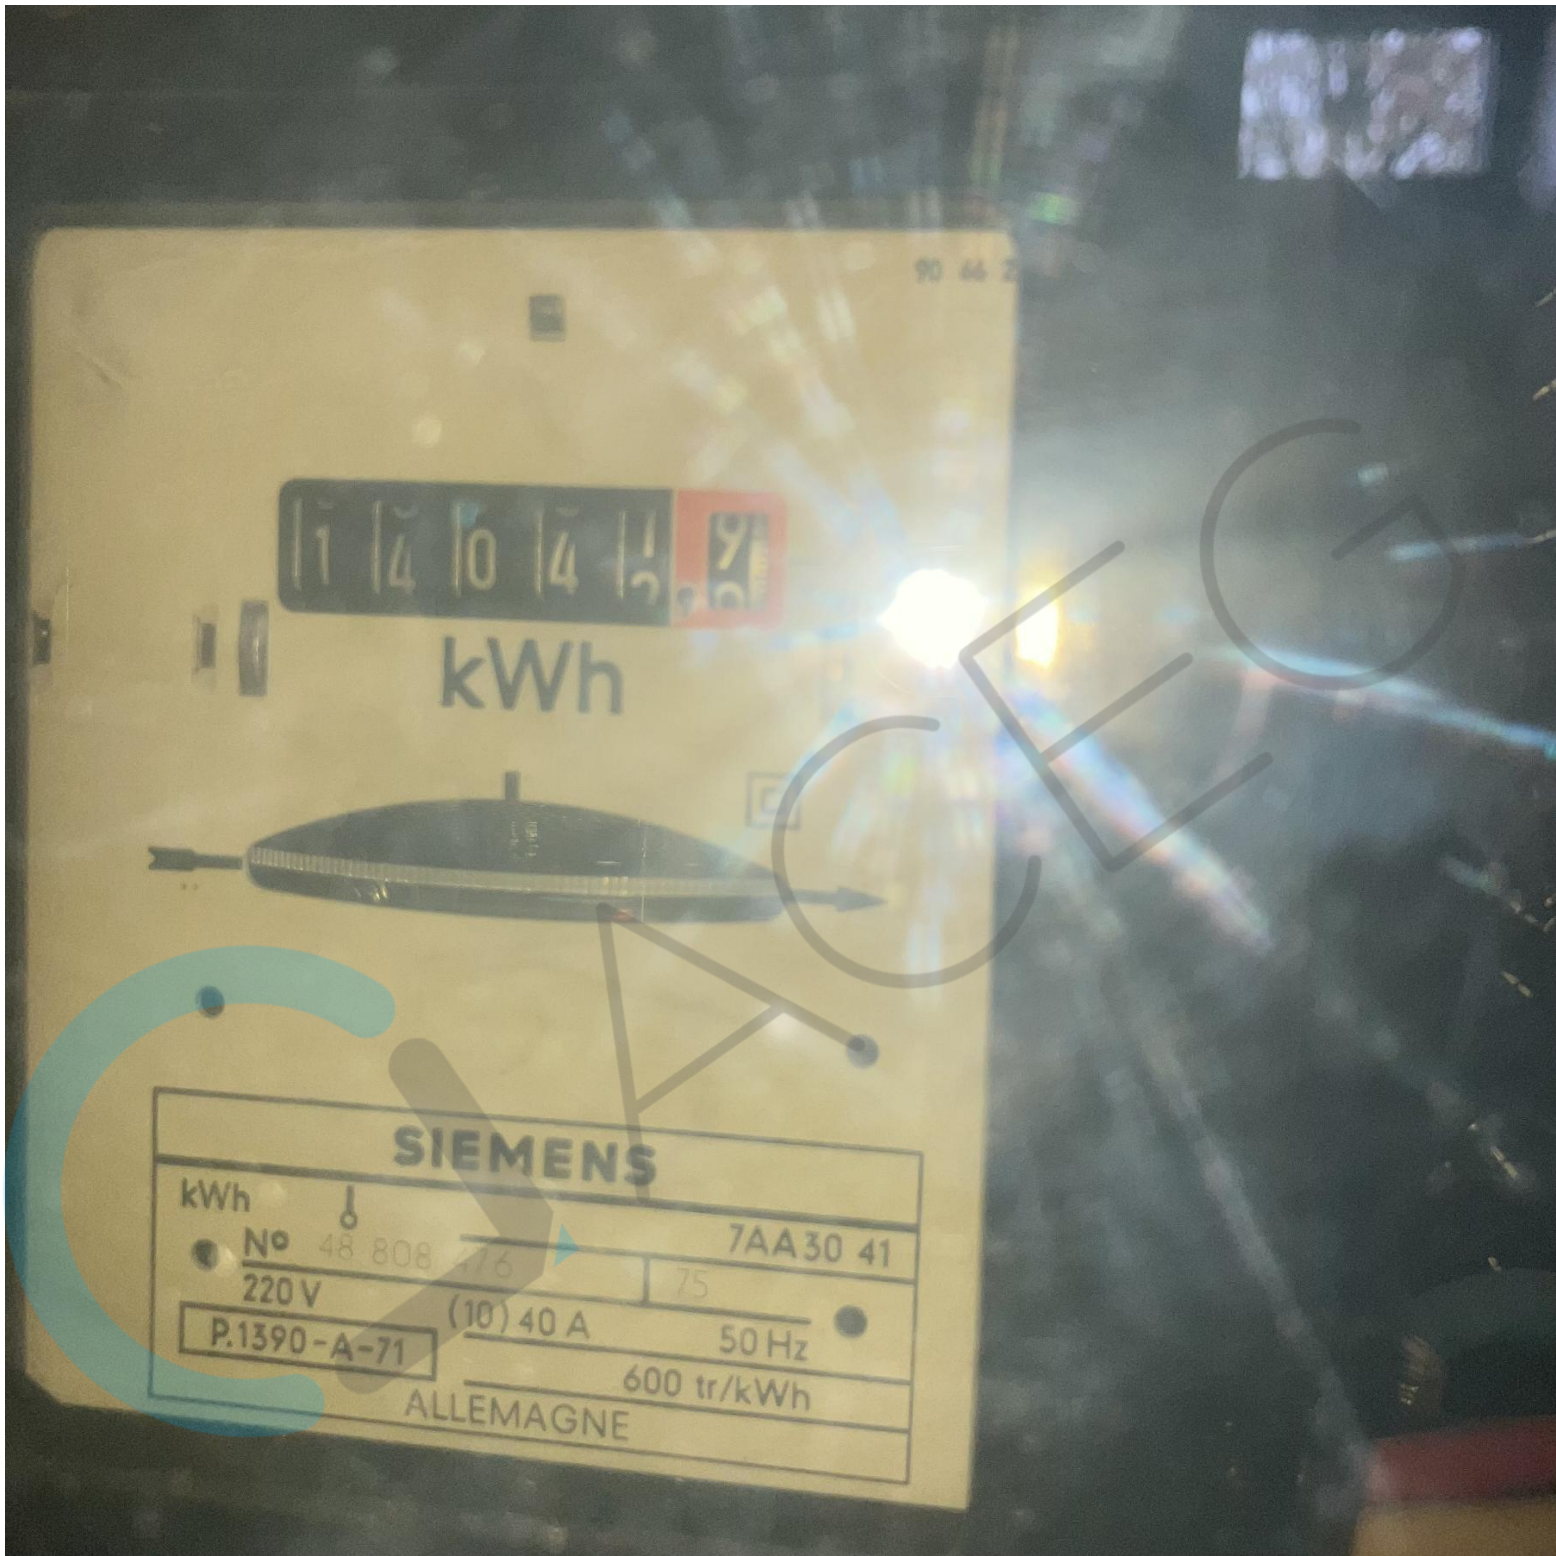








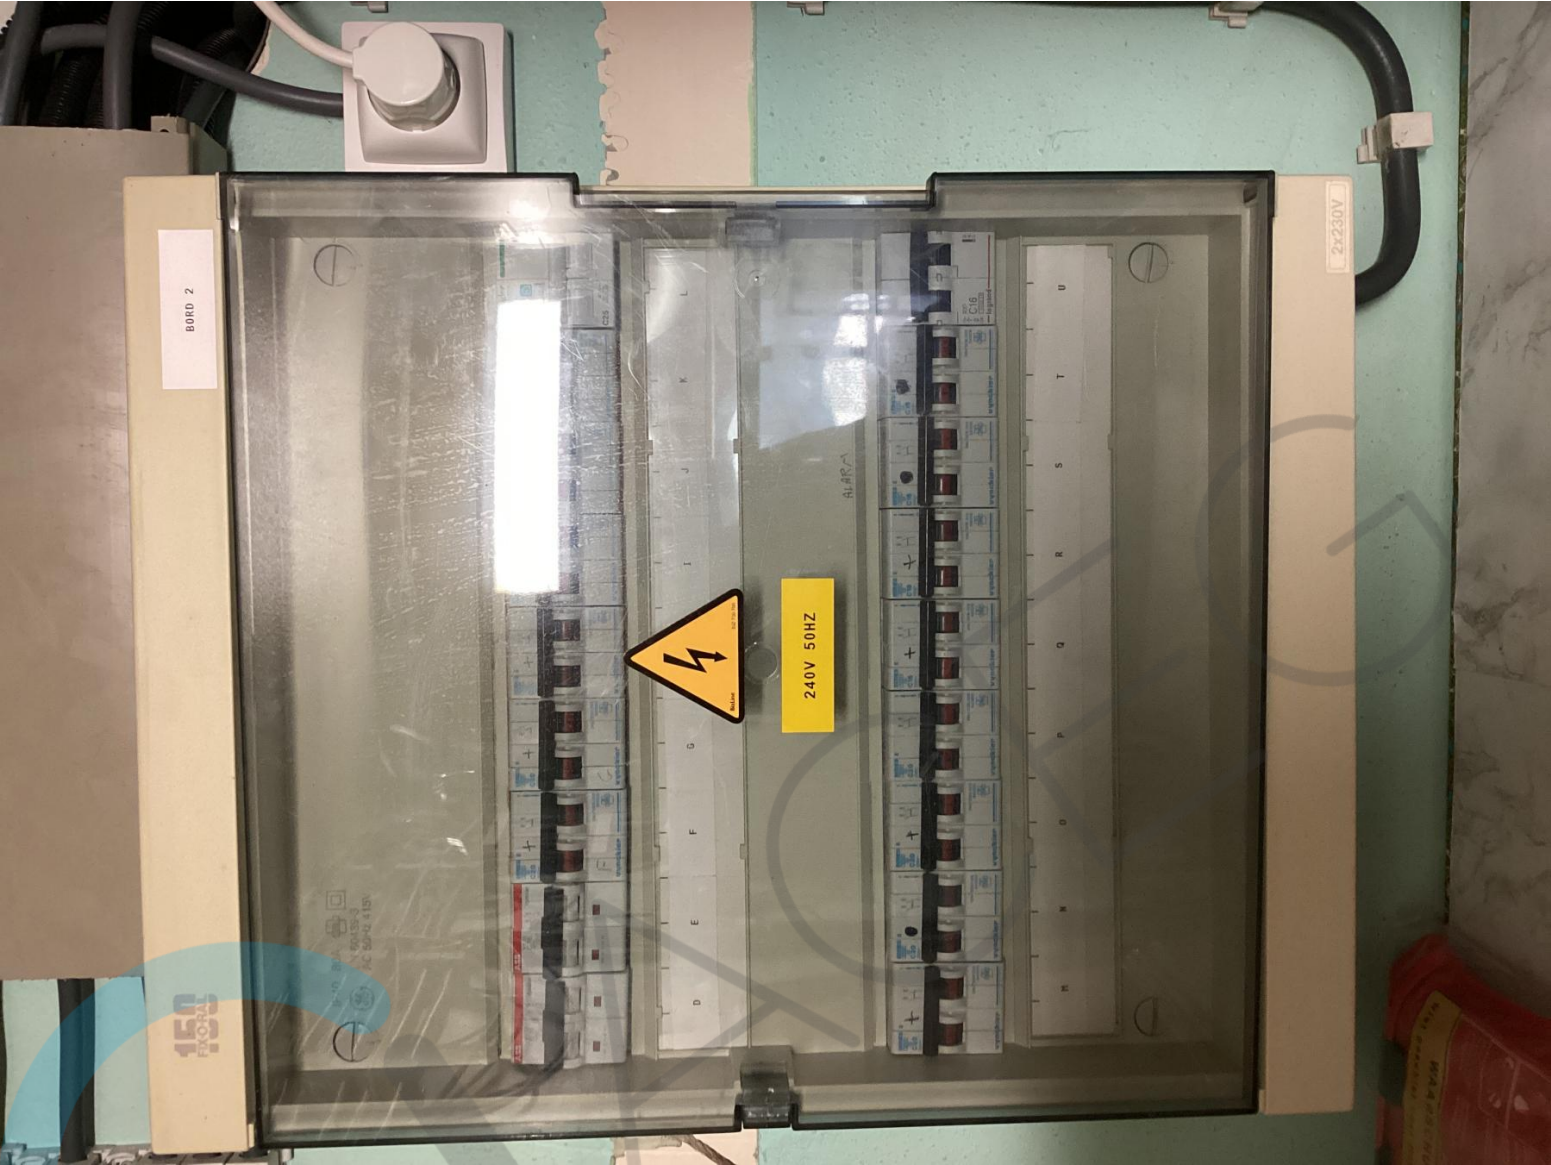




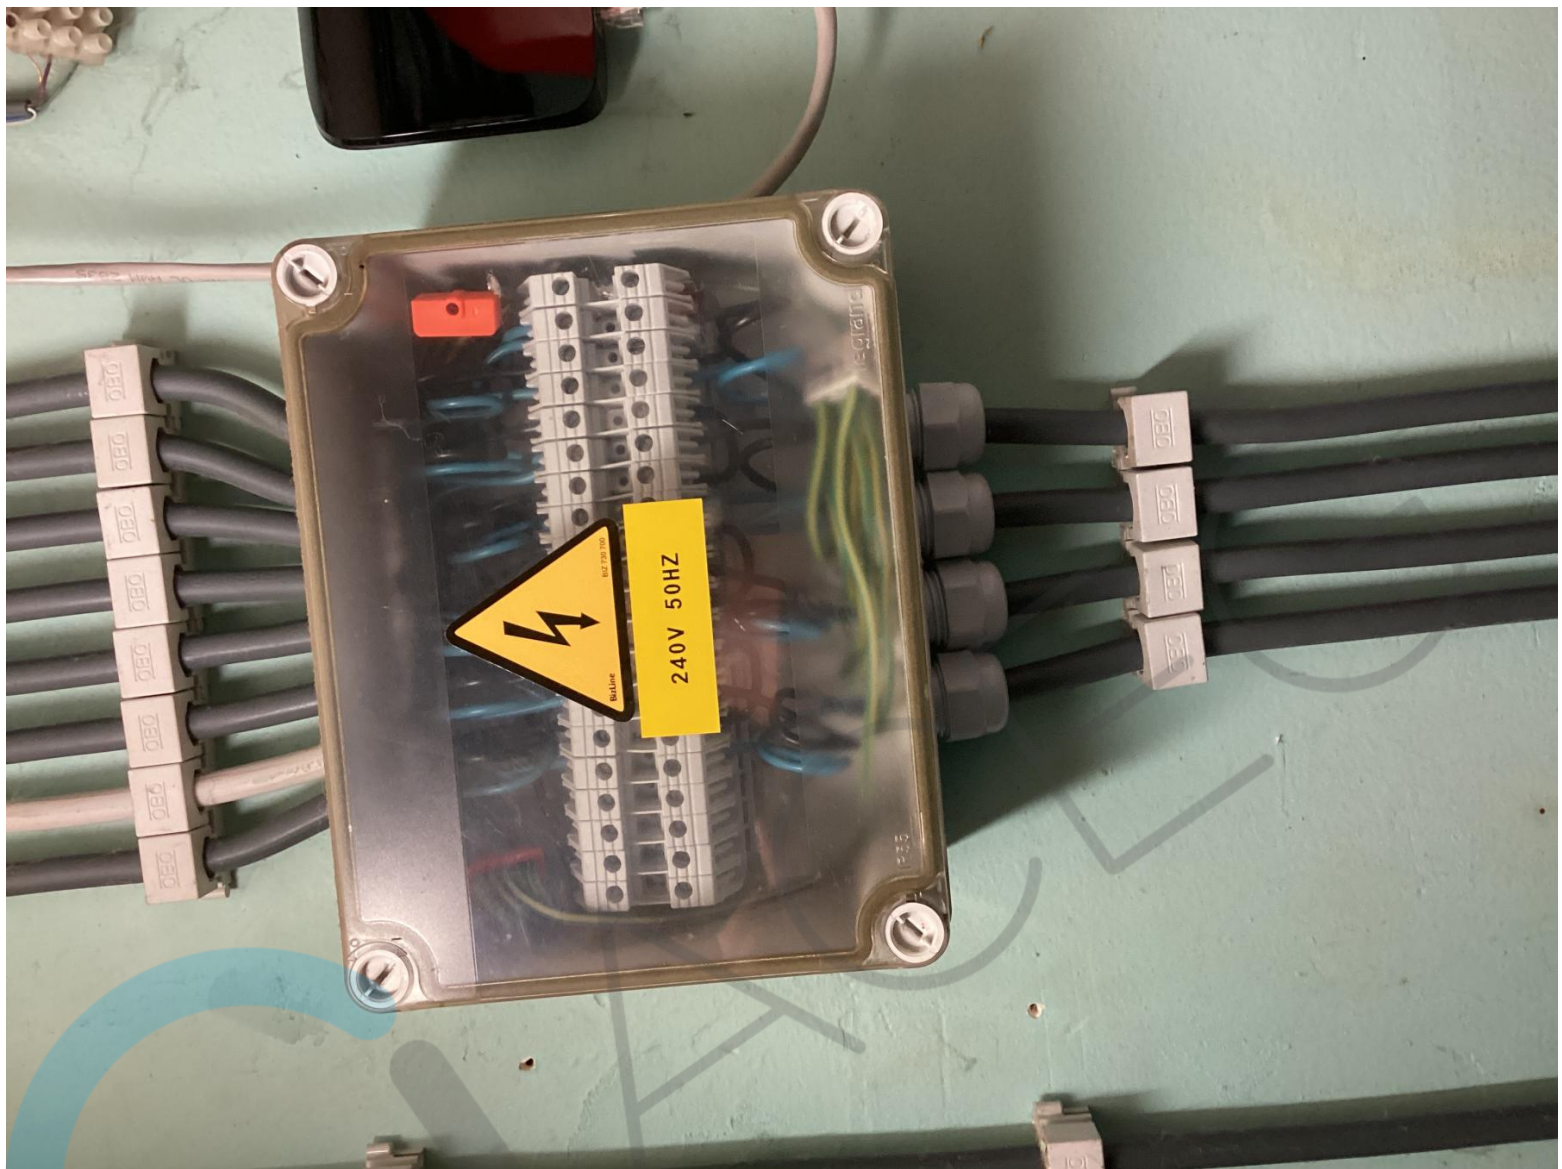













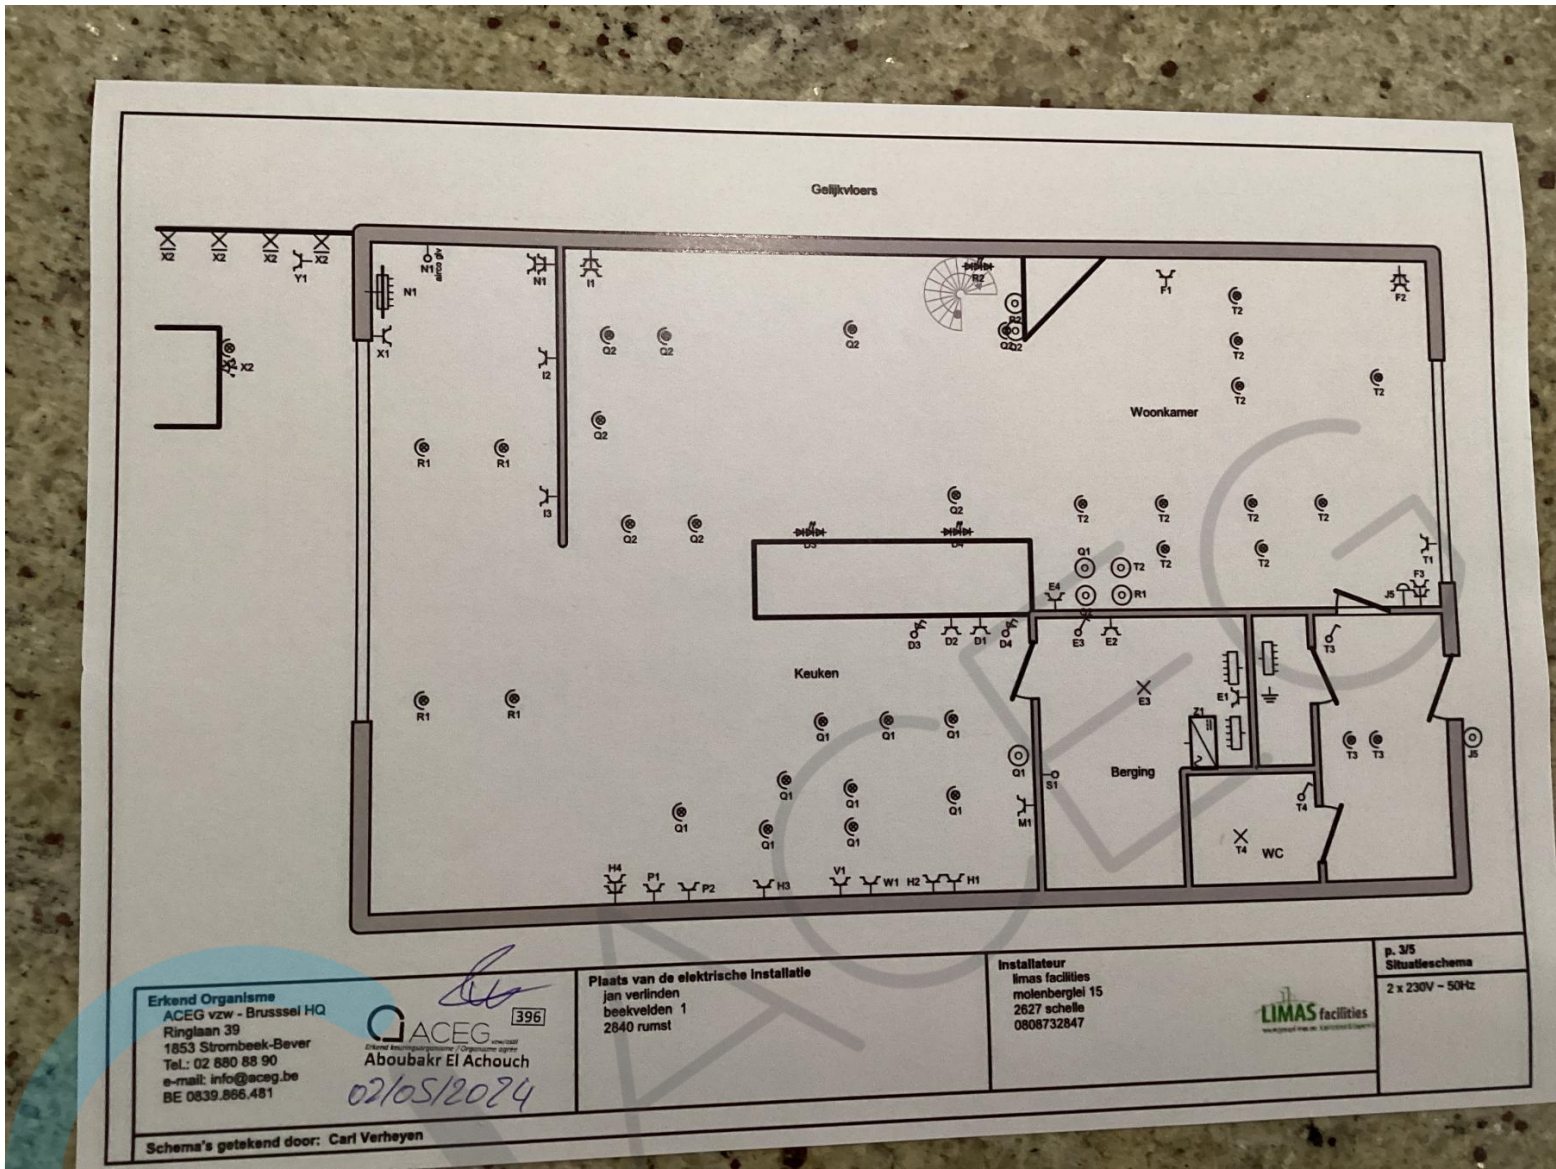

A	300mA bord1	S	alarm
B	rem bord 1	T	verlichting woonkamer+ inkom + zonnewering
C	30mA bord 1	U	verlichting slpk 1+2+3 berging
D	stopcontacten eiland	Z	pv (bord 1)
E	vaatwas stopc berging en living		
F	stopcontacten living +slpk 1+2		
G	cv + wasmachine		
H	dampkap , frigo , fornuis , warmhoudplaat		
I	stopcontacten eetplaats , slpk 3 en vestiaire		
J	verlichting badkamer , slaapk 2 , bel		
K	stopcontact badkamer + radiator		
L	voeding bord 3 (v,w)		
V	stoomoven		
W	oven		
M	stopcontacten keuken		
N	airco glv +voeding bord 4 (x,y)		
X	tuinverlichting + stopcontact		
Y	pomp		
O	airco verdiep 1		
P	espresso , microgolfoven		
Q	verlichting eetkamer		
R	verlichting achter , trap		

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel HQ

Ringlaan 39

1853 Strombeek-Bever

Tel.: 02 880 88 90

e-mail: info@aceg.be

BE 0839.866.481

ACEG

396

Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé

Aboubakr El Achouch

02/05/2024

Plaats van de elektrische installatie

jan verlinden

beekvelden 1

2840 rumst

Installateur

limas facilities

molenberglei 15

2627 schelle

0808732847

p. 5/5

Lijst Kringen

2 x 230V – 50Hz

Schema's getekend door: Carl Verheyen

Pagina 20 van 23 | EK1

