



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 303.53.921



F 071984

○ Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11
○ Brabant tél : 02 674 57 11

○ Oost & West -Vlaanderen tél : 09 244 77 11
○ Wallonie tél : 081 432 611

Rési code :

1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation : Person 3

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>Ed. Elc.</u>	Nom, Prénom : <u>B. S. Construction</u>
N° carte d'identité :	Adresse : <u>100 rue de la port</u>
N° TVA : BE	CP + Commune : <u>4480 Herpelle / Huy</u>
	Tél :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☒ Art 270 ☒ mise en usage ☐ modification ☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
☐ mobile ☐ temporaire	☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☐ Art 271 ☐ périodique ☐ contrôle	☐ Art 88	☐ Art	☒ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art	☐ Art	☒ Unité de travail
☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN :	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : <u>1</u> Index jour : nuit :	☐ Compt. kWh exclusif nuit :	
Données installation	Protection branchement (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☒	n° : Index nuit :	
	Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre : ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets	
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☒ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>EXOS</u>		
	Dispositif diff. gén. : <u>63</u> A / <u>3000</u> mA	Nombre de tableaux : <u>1</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>14</u>
☒ Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ I>/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>2.2</u> Ω		☒ Isolement général : <u>1</u> MΩ		☒ Continuité de terre		☐ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	<u>néant</u>
Infractions Installation existante	<u>néant</u>
Remarques	<u>néant</u>



Conclusion(s) :

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur :


Nom : P. Elc.

Agent n° 3042 Date : 12/08/2014


Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position : 1 ☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1


- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

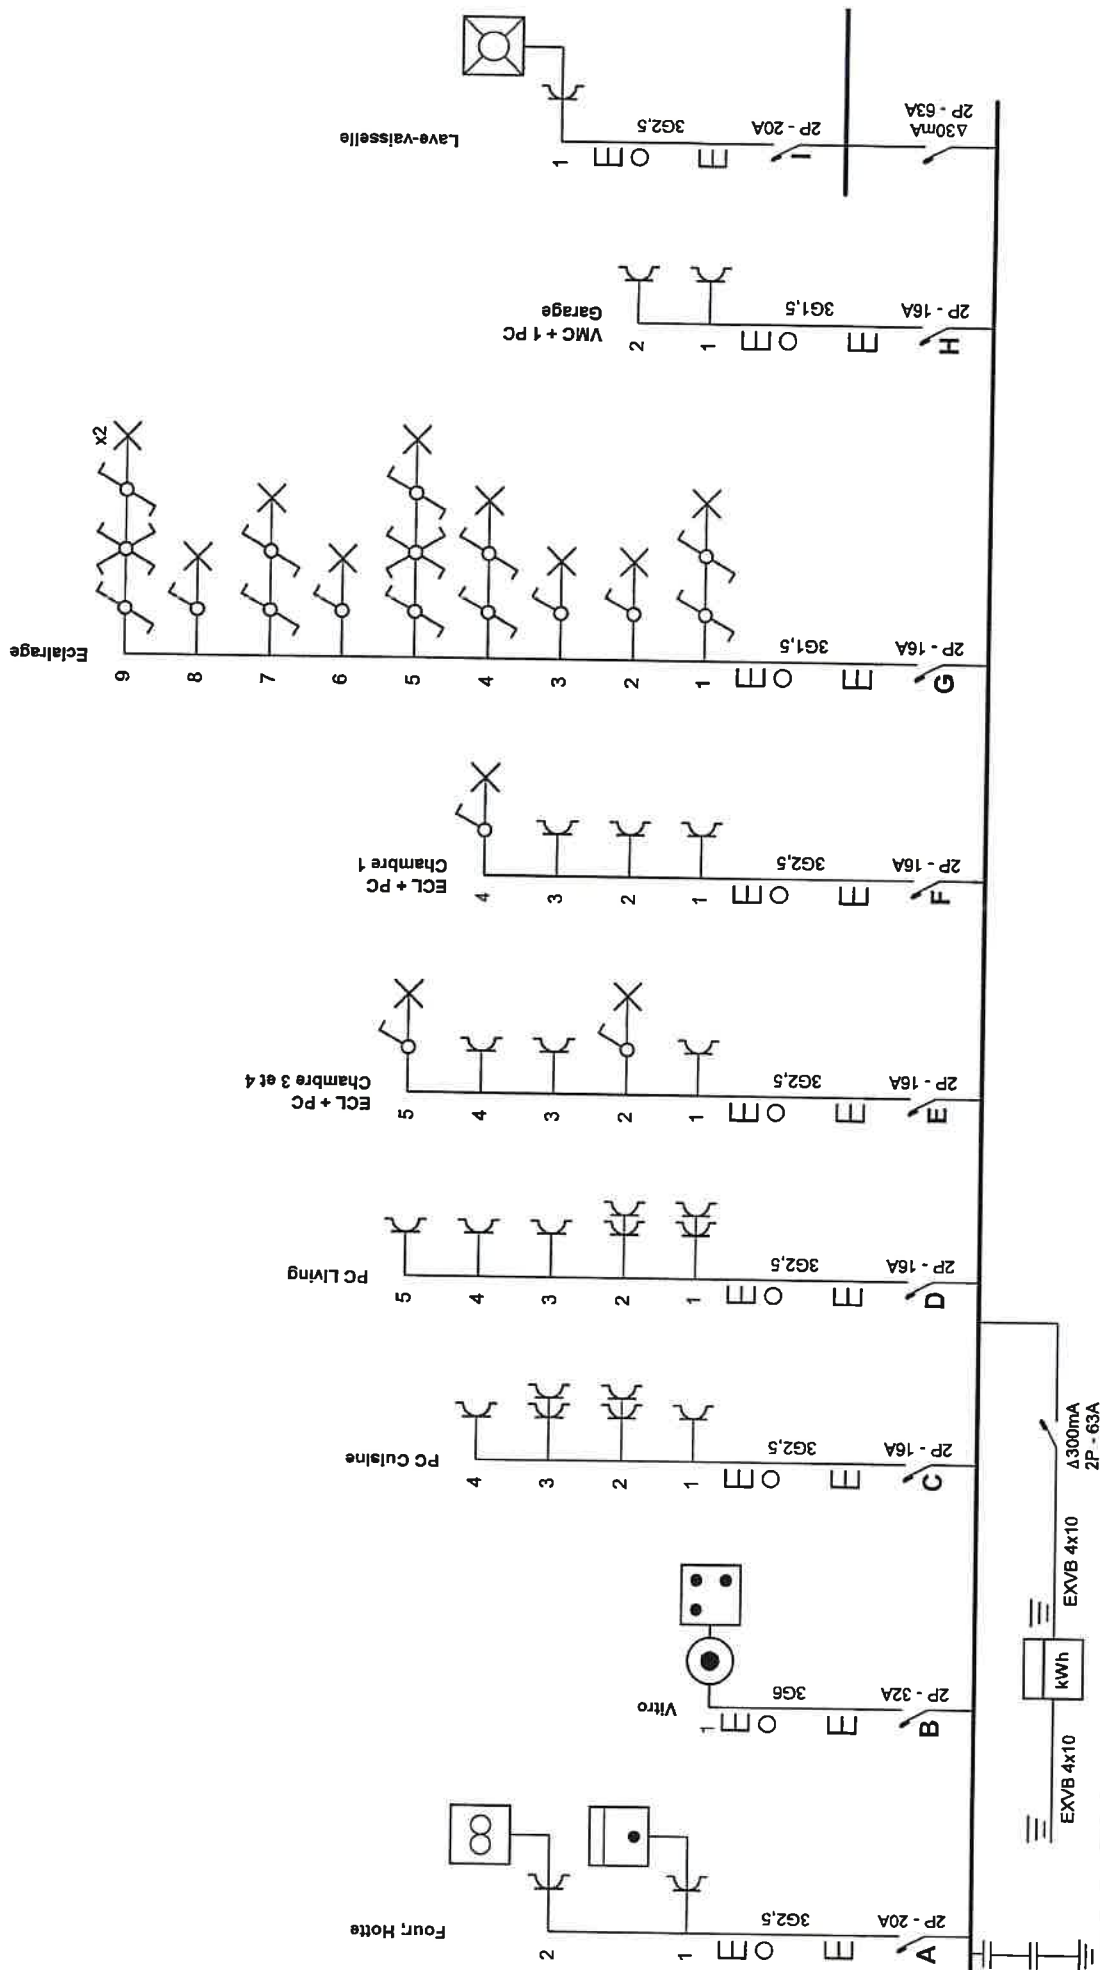

P. 1/6 Schéma unifilaire Date: 5/08/2014 2 x 230V ~ 50Hz Maison 3	F.D.Elec Electricité générale T.V.A. 0898270577	Installateur F.D.ELEC Avenue de la Cité 27 4400 FLEMALLE	Adresse de l'installation électrique BOSCARINO Construction Organisme agréé Daniel PIERRE Agent 0242 Schéma dessiné par: F.D.ELEC
--	---	--	---

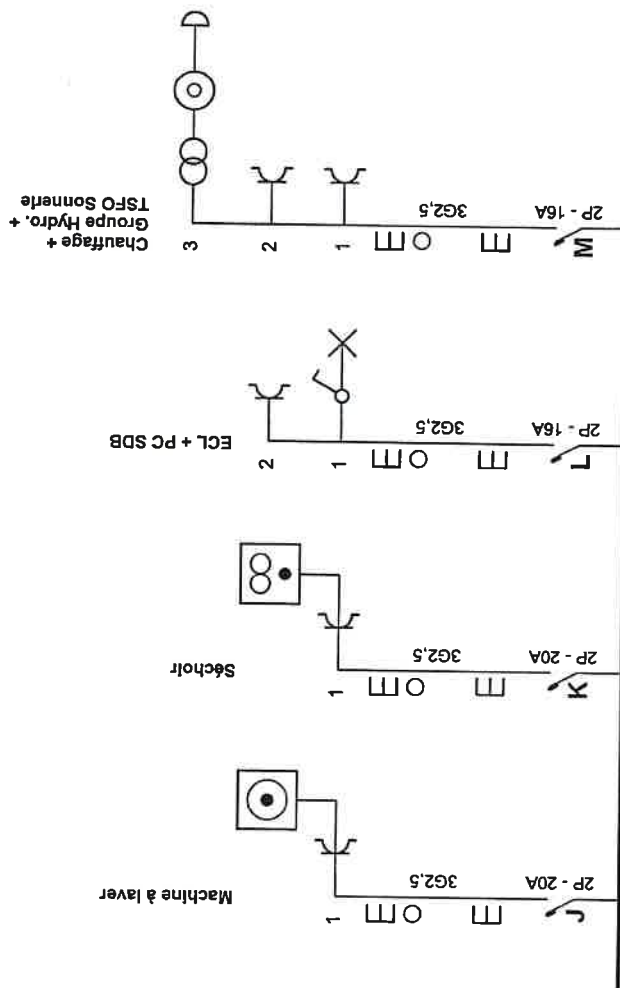

Organisme agréé



Adresse de l'installation électrique
BOSCARINO Construction

Installateur
F.D.ELEC
Avenue de la Cité 27
4400 FLEMALLE

F.D.Elec

Electricité générale
T.V.A. 0898270577

p. 2/6

Schéma unifilaire


Date: 5/08/2014

2 x 230V ~ 50Hz

Maison 3

Schéma dessiné par: F.D.ELEC

REZ-DE-CHAUSSEE

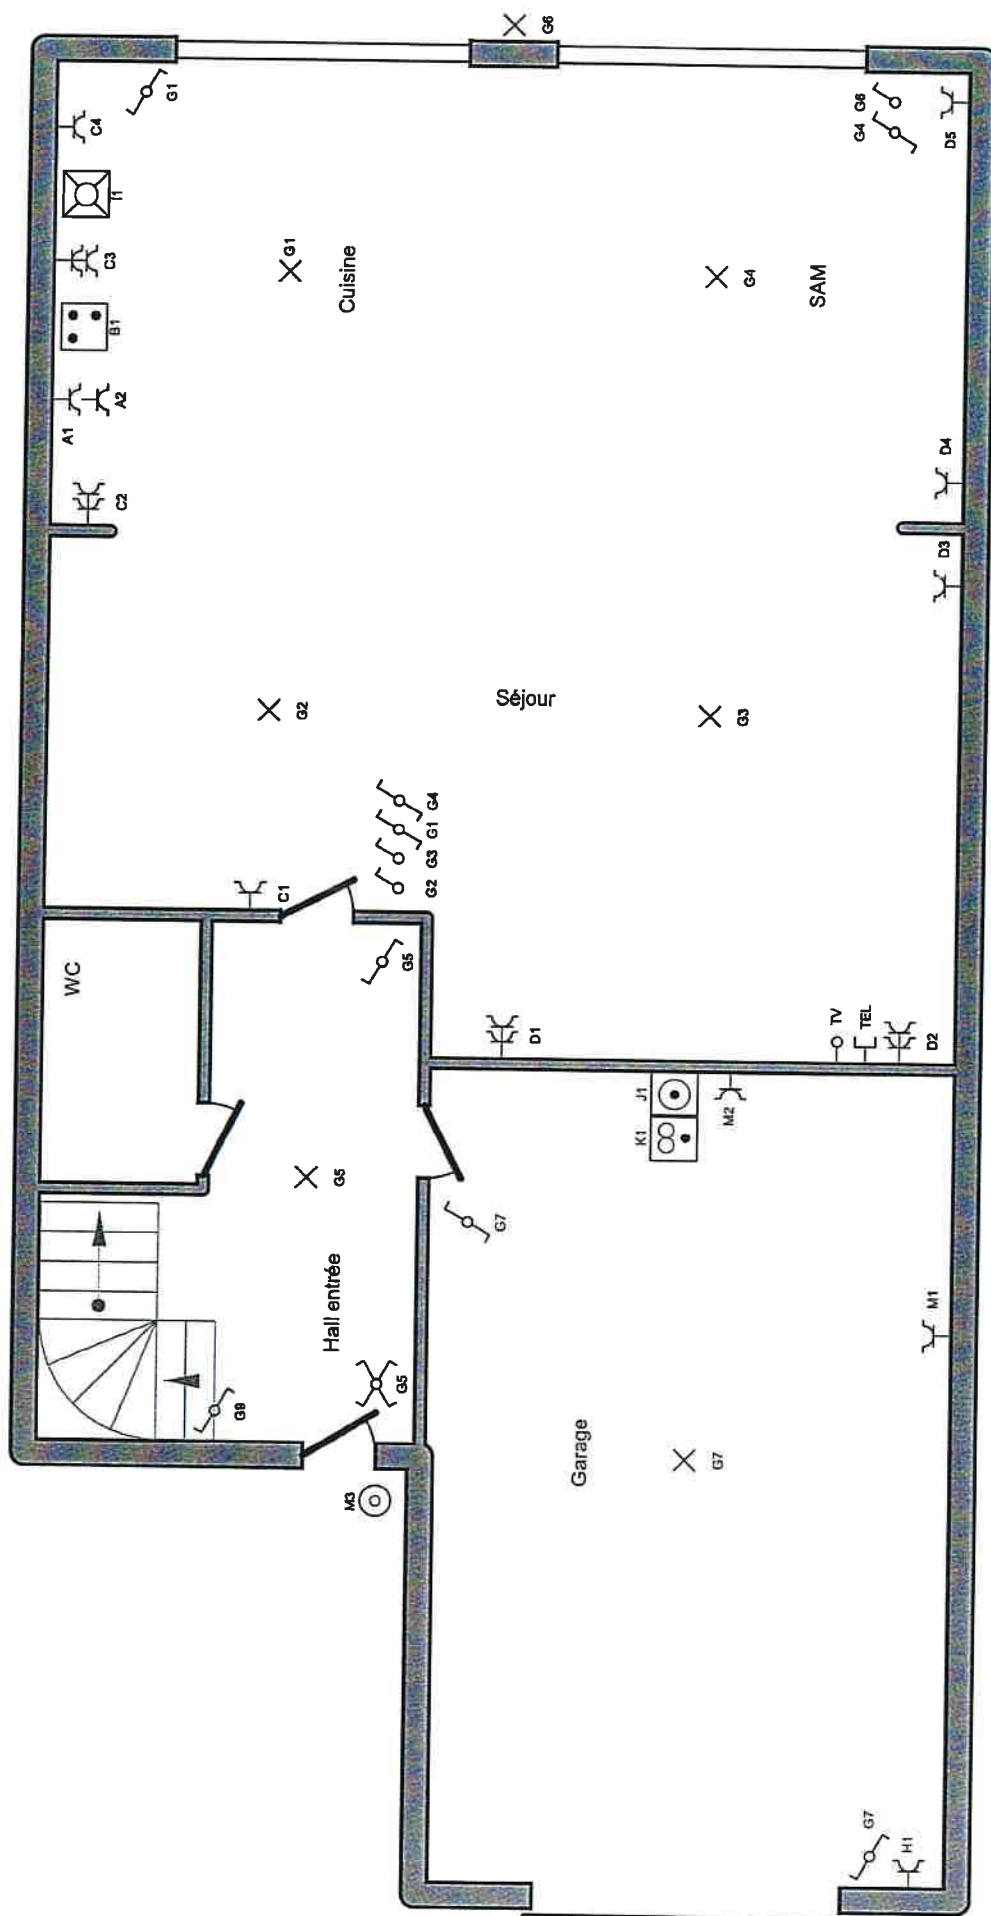

Organisme agréé

Daniel PIERRE
AG 01 2242

Adresse de l'installation électrique
BOSCARINO Construction

Installateur
F.D.ELEC
Avenue de la Cité 27
4400 FLEMALLE

F.D.Elec
Electricité générale
T.V.A. 0898270577

p. 3/6

Schéma de position


Date: 5/08/2014

2 x 230V ~ 50Hz

Maison 3

Schéma dessiné par: F.D.ELEC

ETAGE

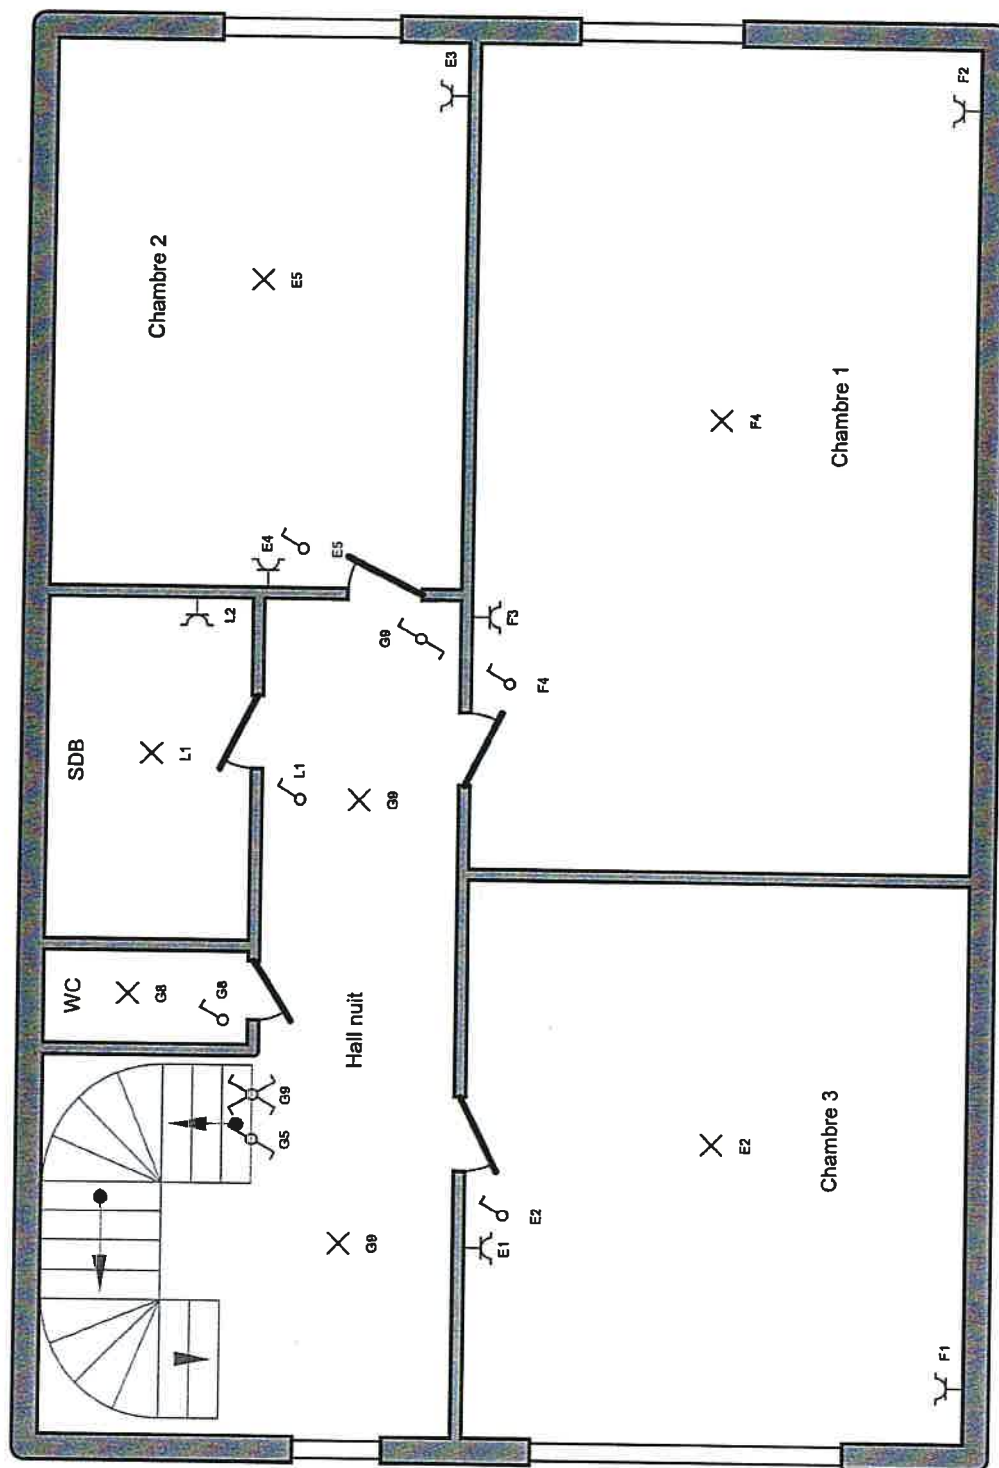

Organisme agréé

Daniel PIERRE
Daniel PIERRE

Adresse de l'installation électrique
BOSCARINO Construction

Installateur
F.D.ELEC
Avenue de la Cité 27
4400 FLEMALLE

F.D.Elec
Electricité générale
T.V.A. 0898270577

p. 4/6

Schéma de position

Date: 5/08/2014

2 x 230V ~ 50Hz

Maison 3

Schéma dessiné par: F.D.ELEC

GRENIER

H2

VMC



Organisme agréé

Daniel PIERRE
Agout 8042

Adresse de l'installation électrique
BOSCARINO Construction

Installateur
F.D.ELEC
Avenue de la Cité 27
4400 FLEMMALLE

F. D. Elec
Electricité générale
T.V.A. 069370577

p. 5/6
Schéma de position

Date: 5/08/2014

2 x 230V ~ 50Hz

Maison 3

Schéma dessiné par: F.D.ELEC

A	Four; Hotte
B	Vitro
C	PC Cuisine
D	PC Living
E	ECL + PC Chambre 3 et 4
F	ECL + PC Chambre 1
G	Eclairage
H	VMC + 1 PC Garage
I	Lave-vaisselle
J	Machine à laver
K	Séchoir
L	ECL + PC SDB
M	Chauffage + Groupe Hydro. + TSFO Sonnerie

Organisme agréé	Adresse de l'installation électrique BOSCARINO Construction	Installateur F.D.ELEC Avenue de la Cité 27 4400 FLEMALLE	P. 6/6 Liste des circuits
			Date: 5/08/2014 2 x 230V ~ 50Hz Maison 3
Schéma dessiné par: F.D.ELEC		F.D.Elec Electricité générale T.V.A. 0898270377	
