

3095331

07/05/2032

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF-OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : ~~AREI art. 36~~ / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / ~~Vernieuwing~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwaren~~ / ~~Splitting meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : Appartement, gelijkvloers

Plaats van onderzoek : Plasstraat 2, Ekeien

Eigendom van : Vandaele, Plasstraat 2, Ekeien

Opdrachtgever :

Installateur : D. os Hevo, Demerstraat 26, Antwerpen

BTW : 450.449.588 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Dams Romy Datum van onderzoek : 26/05/2032

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 1 x 40 A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. machtsch. Schak. : 2p40 A diff.

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : doorsnede : 20 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : ~~aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus/baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 26,4 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : Algemene isolatieweerstand : 12,4 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p40 A / 300 mA - 225 kA bijkomende : 2p40 A / 30 mA - 225 kA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~

controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~

Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~

Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

I) 300 mA (Bord I (A, B, C) + Bord II (D t/m N))
II) 300 mA (K, L, M, N)

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

N

N

BESLUIT

De installatie is conform / ~~22000~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 26/05/2032 zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker


erkend controle organisme
 vereniging zonder winst oogmerk
 gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

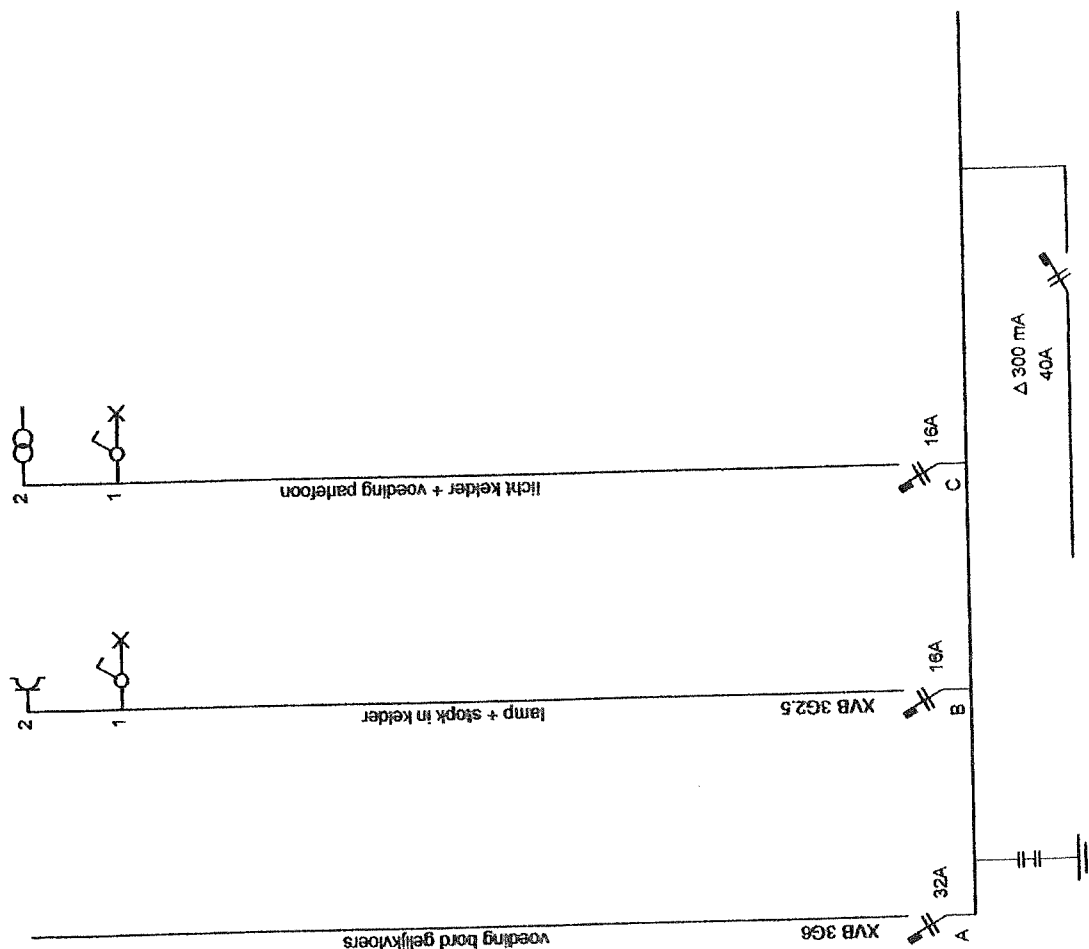

DIOS - HEVO bvba
 TEL 03/225.27.29 GSM 0495/207536
 Demerstraat 26 2060 ANTWERPEN

VANDATTE

Piasstraat 2

2180 Ekeren

Plan nr:

Blad:


Dat. 11/09/07

BORD ALSB

De eigenaar

De afgevaardigde van het
 erkend controle organisme

De verantwoordelijke voor
 de uitvoering van het werk

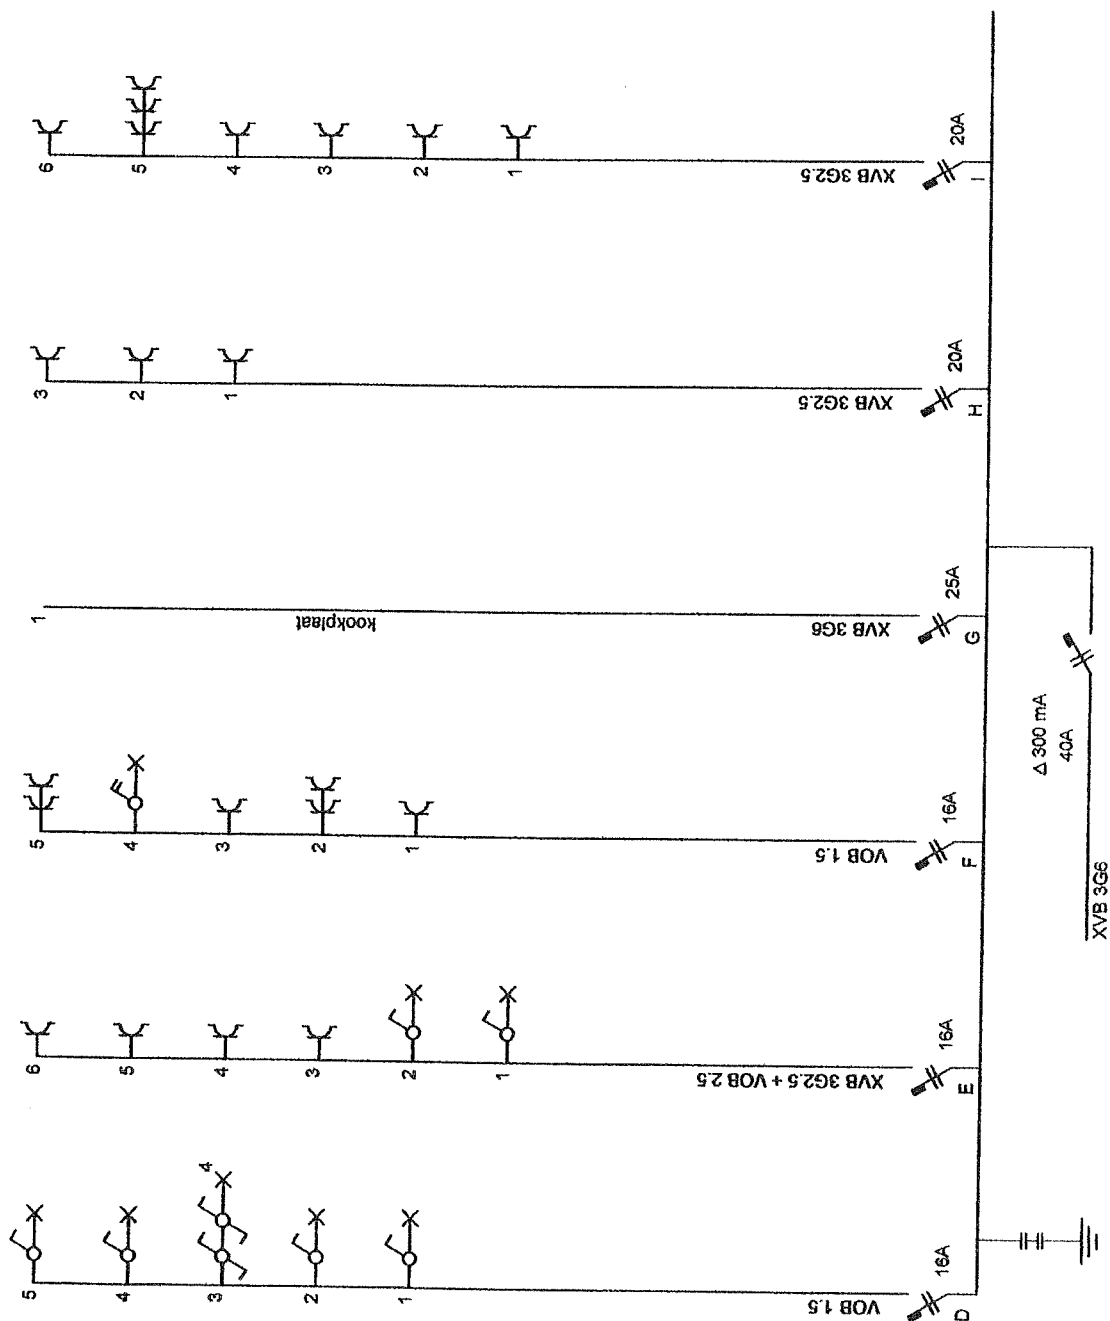

De verantwoordelijke voor
de uitvoering van het werk

De afgevaardigde van het
erkend controle organisme

De eigenaar



DIOS - HEVO bvba
TEL 03/225.27.29 GSM 0495/207536
Demerstraat 26 2060 ANTWERPEN

VANDATTE
Plasstraat 2
2180 Ekeren


Plan nr.

Blad: 1/3

Dat: 11/09/07

BORD ALSS

BTW:BE450.449.588 HRA:298.073 REG.



BORD ALSE
